



Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

" 2007 - Año de la Seguridad Vial "

EXPEDIENTE N° 13.023-L-2006

HOJA N° 2

CLAUSULA SEGUNDA: Todos los documentos mencionados en la cláusula anterior, los Volantes Nros. 1, 2 y 3, y todos los detallados en la Subcláusula 2.3 de la Sección 3, "Condiciones del Contrato", forman parte de este Contrato.-----

CLAUSULA TERCERA: El precio total del Contrato, que se acuerda bajo el sistema de ajuste alzado absoluto, es de PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 88.892.020,35).- El precio convenido esta sujeto a redeterminación bajo las condiciones y con los alcances establecidos en el Pliego.-----

CLAUSULA CUARTA: El Porcentaje (1) aplicable para determinar la parte del precio correspondiente a mantenimiento Pr1 es: Dieciséis con noventa y dos por ciento (16,92%).-----

CLAUSULA QUINTA: Todos los conceptos se usan según la definición dada en el Pliego.-----  
Déjase establecido que a los fines de la redeterminación de precio no se desagregan los gastos generales e indirectos y gastos financieros.-----

CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA ha constituido garantía de estricto cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales mediante la Póliza de Seguro de Caucción de AFIANZADORA S.A. N° 44.604, por un monto de PESOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE (\$ 26.667.607,00), a favor de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, importe que cubre el treinta por ciento ( 30 %) del precio total de este Contrato.-

CLAUSULA SÉPTIMA.- Sin perjuicio de las declaraciones exigidas en los términos del llamado a licitación, la firma de este Contrato por el Contratista implica, sin admitirse prueba en contrario, que EL CONTRATISTA acepta en toda su extensión la responsabilidad por la aptitud del PROYECTO BASICO DEFINITIVO para alcanzar y mantener los resultados establecidos en las bases del llamado a licitación y en las especificaciones que forman parte de EL CONTRATO.-----


CLAUSULA OCTAVA.- Las palabras y expresiones que se utilizan en EL CONTRATO tendrán el mismo significado que se les asigna en las Condiciones del Contrato a que se hace referencia en el presente instrumento, las cuales fueron leídas y forman parte de EL CONTRATO.-----

CLAUSULA NOVENA.- En consideración a los pagos que EL CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA, por el presente Contrato, EL CONTRATISTA conviene en ejecutar y terminar las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento subsanando cualquier defecto de unas y/u otro, en conformidad con todos los aspectos de las disposiciones de EL CONTRATO.-----

CLAUSULA DECIMA.- EL CONTRATANTE conviene en pagar a EL CONTRATISTA, en consideración por la ejecución y terminación de las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento, el Precio de EL CONTRATO fijado en la CLAUSULA TERCERA a la suma que pueda resultar pagadera de conformidad con las disposiciones de EL CONTRATO, en el momento y de la manera estipulados en EL CONTRATO.-----

En prueba de conformidad con lo establecido en las cláusulas del presente Contrato, ambas partes lo firman en tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-----

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

  
GABRIEL GUILLERMO PEROTTI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000507



OBRA: SISTEMA C.RE.Ma. - MALLA 603  
 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS  
 DEL ATLÁNTICO SUR.-  
 RUTA NACIONAL Nº 3  
 TRAMO: SAN SEBASTIAN -TOLHUIN  
 SECCIÓN: Km 2766,83 - Km 2949,84  
 EXPEDIENTE PRINCIPAL: 13023 - L - 2006  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.




En la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 19 (diecinueve) días del mes de Noviembre del 2012, se reúnen el Sr. Jefe del 24º Distrito D.N.V. Ing. Juan José SOSA ZAMARBIDE y el Supervisor de la Obra Ing. Gustavo CONTI, en representación de la Dirección Nacional de Vialidad, y el Ing. Enrique REY MORITO en representación de la Empresa Dos Arroyos S.A., CONTRATISTA de la Obra de Referencia, a los efectos de suscribir la presente ACTA DE CONSTATAción DE FINALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL de la obra de la referencia.-

### ACTA DE CONSTATAción DE FINALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.


**Art.1º :** El día 31/10/2012, operó el vencimiento para la finalización del Contrato de la Obra de Referencia, constatándose a esa fecha la terminación de las tareas de Mantenimiento comprometidas en PR1. Dichos trabajos quedan sujetos a la aprobación definitiva del Control de Calidad.-

**Art.2º :** Se deja constancia que en el día de la fecha se recorrió la presente malla y todas las Secciones cumplen en su totalidad con las Condiciones exigibles, ajustándose a los requerimientos contractuales. No se detectaron vicios aparentes, ni se registraron trabajos pendientes de ejecución, ni observaciones en cuanto al estado de la zona de camino.-


**Art. 3º :** En prueba de conformidad, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

  
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BALBISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

  
 CONTRATISTA  
 E. REY  
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. Enrique Rey Morito  
 Representante Técnico

  
 D.N.V.  
 Ing. Gustavo Cesar Conti  
 J.C. Sección Inspección de Obras  
 24º Distrito D.N.V. - T.D.F.

Por AUTORIZACIÓN del Sr. Jefe Del 24º Distrito

  
 C.P. Facundo S. URRUTIA  
 Jefe Int. Div. Administración  
 24º Distrito D.N.V.

D.N.V.

**MEMORANDO**

REF: OBRA SISTEMA C.RE.MA. - MALLA N°603  
 Ruta Nacional N°3- Provincia de Tierra del Fuego  
 Tramo: San Sebastián- Tolhuin  
 Expediente Principal N° 13023-L-2006  
 Expediente Prodef N° 11536-L-2007  
 Licitación Pública N° 140/06  
 Fecha de Licitación: 31/01/2007  
 Fecha de firma de Contrato: 23/07/2007  
 Fecha de Replanteo: 01/11/2007  
 Plazo de Obra: 60 meses  
 Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.  
 Financiación: Fondos del Tesoro de la Nación  
 Monto del Contrato: \$ 88.892.020,36  
 Fecha Aprobación 1° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 43/08 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 11/09/2008  
 Monto del Contrato a Precios 1° Adecuación Provisoria: \$ 95.329.899,81  
 Fecha Aprobación 2° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 13/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 19/02/2010  
 Monto del Contrato a Precios 2° Adecuación Provisoria: \$ 98.677.037,83  
 Fecha Aprobación 3° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 71/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 09/06/2010  
 Monto del Contrato a Precios 3° Adecuación Provisoria: \$ 101.760.671,81  
 Fecha Aprobación 4° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 204/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 21/12/2010  
 Monto del Contrato a Precios 4° Adecuación Provisoria: \$ 102.579.360,69  
 Fecha Aprobación 5° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 91/11 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 01/07/2011  
 Monto del Contrato a Precios 5° Adecuación Provisoria: \$ 103.249.572,17  
 Fecha Aprobación 6° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 57/12 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 04/04/2012  
 Monto del Contrato a Precios 6° Adecuación Provisoria: \$ 103.702.569,30

**CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012**  
 Importe presente Certificado: \$ 443.445,37

La presente constituye la documentación del Certificado N° 61 6° PROV. y se corresponde con el pago de la última Cuota N° 60 de Mantenimiento de Rutina.-

Cabe mencionar que en el presente certificado surge una diferencia en el Plan de Inversiones entre el Monto vigente del Contrato y Monto ejecutado acumulado total, siendo la diferencia de \$ 443,70, que será subsanado al emitir los certificados definitivos.-

Los trabajos ejecutados por la Contratista durante el mes de **OCTUBRE** de 2012 se adecuan a las consideraciones contempladas en las Especificaciones Generales y Particulares requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Obra.-

Mediante Nota de Pedido N° 246 de fecha 02/11/2012 (cuya copia se adjunta) la Contratista solicita la emisión del presente certificado y adjunta copia del Certificado de Afiliación y Constancia de Contratación de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del Personal de la Empresa. Del mismo modo se adjunta Declaración Jurada de Calidad.-

Se adjunta a la presente copia de la 6° Adecuación Provisoria de Precios, aprobada mediante Disposición N° 57 del 04/04/12 del Señor Jefe del 24° Distrito, tal lo establecido en Resolución A.G. N° 501 de fecha 07/04/2008; y copia del Cuadro Anexo IV - C.Re.Ma. F.T.N. donde surge el mayor gasto a aprobar en concepto de 6° Adecuación Provisoria de Precios de \$ 452.997,13, resultando un nuevo Monto de Contrato de \$103.702.569,30.-

Cabe destacarse que la presente documentación ha sido elaborada en un todo de acuerdo con lo instruido en la NOTA CIRCULAR A.G. N° 01/03 de fecha 21/08/2003.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Cesar Conti  
 Supervisor  
 76°

000509



## DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 24° DISTRITO TIERRA DEL FUEGO OBRAS DE CONTRATO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO



Obra: Mallia N° 603  
Provincia: TIERRA DEL FUEGO  
Ruta: RN. 0003

Expediente Principal: C013023/2006  
Expediente Certificado: 0020230/2012  
Certificada N°: 61 6° PROV.  
Decreto N°: 01295/2002

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA>; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO>; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE>; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.>; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE>; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA>; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)>; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Fecha de Licitación: 31 de enero de 2007  
Fecha de Replanteo: 01 de noviembre de 2007  
Fecha de Finalización de Recuperación: 01 de diciembre de 2010  
Fecha de Medición: 31 de octubre de 2012  
Plazo Vigente: 060 M 00 c  
Fecha de Finalización del Contrato: 01 de noviembre de 2012

Monto de Recuperación: \$ 73.851.490,51  
Monto de Mantenimiento: \$ 15.040.529,84  
Monto del Contrato: \$ 88.892.020,35  
Avance Financiero a Origen: 100,00 %

| Certificado     | Mes de Ejecuc. | PR2 Contrato | L. R.   | PR2 Redeterm. | PR1 Contrato | Descuento PR1 a Contrato | PR1 Contrato c/ Descuento | L. R.   | PR1 Redeterm. | Monto Certificado | Monto Acumulado a Contrato | Monto Acumulado Redeterm. |
|-----------------|----------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1               | 10/2007        | 1.477.029,81 | 1,00000 | 1.477.029,81  | 0,00         | 0,00                     | 0,00                      | 1,00000 | 0,00          | 1.477.029,81      | 1.477.029,81               | 1.477.029,81              |
| 2               | 11/2007        | 3.092.574,53 | 1,00000 | 3.092.574,53  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,00000 | 250.675,50    | 3.945.250,03      | 5.420.279,84               | 5.420.279,84              |
| 3               | 12/2007        | 1.083.461,46 | 1,00000 | 1.063.681,46  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,00000 | 250.675,50    | 1.311.136,96      | 6.731.416,79               | 6.731.416,80              |
| 4               | 01/2008        | 4.283.386,45 | 1,00000 | 4.283.386,45  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,00000 | 250.675,50    | 4.534.061,95      | 11.268.478,74              | 11.268.478,75             |
| 5               | 02/2008        | 5.021.901,35 | 1,00000 | 5.021.901,35  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,00000 | 250.675,50    | 8.472.576,85      | 16.541.055,59              | 16.541.055,60             |
| 6               | 03/2008        | 5.317.307,32 | 1,00000 | 5.317.307,32  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,00000 | 250.675,50    | 5.567.982,62      | 22.109.038,41              | 22.109.038,42             |
| 07 BIS PROV.    | 04/2008        | 5.413.314,25 | 1,09639 | 5.935.197,75  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 6.209.998,37      | 27.773.028,15              | 28.319.026,79             |
| 08 BIS PROV.    | 05/2008        | 3.544.871,56 | 1,09639 | 3.886.597,16  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 4.161.437,78      | 31.568.575,19              | 32.480.174,57             |
| 09 BIS PROV.    | 06/2008        | 169.856,43   | 1,09639 | 186.232,78    | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 461.073,40        | 31.969.109,12              | 32.941.547,97             |
| 10 BIS PROV.    | 07/2008        | 0,00         | 1,09639 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 274.840,62        | 32.239.784,62              | 33.216.388,59             |
| 11 BIS PROV.    | 08/2008        | 0,00         | 1,09639 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 274.840,62        | 32.490.405,11              | 33.491.279,21             |
| 12 1° PROV.     | 09/2008        | 0,00         | 1,09639 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 274.840,62        | 32.741.135,51              | 33.766.069,83             |
| 13 1° PROV.     | 10/2008        | 0,00         | 1,09639 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 274.840,62        | 32.991.811,11              | 34.040.910,45             |
| 14 1° PROV.     | 11/2008        | 1.942.194,20 | 1,09639 | 2.129.931,36  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 2.404.371,98      | 35.184.726,81              | 36.445.282,63             |
| 15 1° PROV.     | 12/2008        | 3.965.845,04 | 1,09639 | 4.348.130,57  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 4.522.971,19      | 39.401.201,34              | 41.068.253,82             |
| 16 1° PROV.     | 01/2009        | 4.251.231,00 | 1,09639 | 4.672.213,67  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 4.946.854,29      | 43.931.187,86              | 46.015.107,91             |
| 17 1° PROV.     | 02/2009        | 4.852.042,93 | 1,09639 | 5.319.779,86  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 5.594.620,48      | 49.015.908,27              | 51.609.728,39             |
| 18 1° PROV.     | 03/2009        | 4.763.421,14 | 1,09639 | 5.222.614,94  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 5.497.465,56      | 54.080.002,91              | 57.107.183,95             |
| 19 1° PROV.     | 04/2009        | 1.516.111,00 | 1,09639 | 1.684.102,10  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09639 | 274.840,62    | 1.959.032,72      | 55.816.789,40              | 59.066.216,67             |
| 20 BIS 2° PROV. | 05/2009        | 1.351.482,28 | 1,09234 | 1.513.532,09  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 1.918.740,50      | 57.416.947,18              | 60.986.957,17             |
| 21 BIS 2° PROV. | 06/2009        | 908.373,33   | 1,09234 | 1.057.865,83  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 1.388.074,24      | 58.577.596,01              | 62.375.031,41             |
| 22 BIS 2° PROV. | 07/2009        | 0,00         | 1,09234 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 300.208,41        | 58.878.671,51              | 62.675.239,82             |
| 23 BIS 2° PROV. | 08/2009        | 0,00         | 1,09234 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 300.208,41        | 59.079.347,50              | 62.975.448,23             |
| 24 BIS 2° PROV. | 09/2009        | 0,00         | 1,09234 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 300.208,41        | 59.330.026,54              | 63.275.656,64             |
| 25 BIS 2° PROV. | 10/2009        | 0,00         | 1,09234 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 300.208,41        | 59.580.698,20              | 63.575.865,05             |
| 26 BIS 2° PROV. | 11/2009        | 1.828.392,93 | 1,09234 | 2.103.679,20  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 2.469.887,61      | 61.659.756,43              | 65.063.752,66             |
| 27 BIS 2° PROV. | 12/2009        | 3.029.489,12 | 1,09234 | 3.628.109,50  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09234 | 300.208,41    | 3.928.317,91      | 64.931.931,34              | 69.992.070,57             |
| 28 TRIS 3° PRC  | 01/2010        | 4.730.593,66 | 1,10746 | 6.274.359,65  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 6.605.840,66      | 69.921.190,50              | 76.598.911,21             |
| 29 BIS 3° PRC   | 02/2010        | 3.620.276,52 | 1,10746 | 4.001.715,65  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 5.134.195,47      | 73.792.142,82              | 81.733.107,70             |
| 30 BIS 3° PROV. | 03/2010        | 3.528.969,93 | 1,10746 | 4.580.612,12  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 5.013.092,93      | 77.571.787,94              | 86.746.200,63             |
| 31 BIS 3° PROV. | 04/2010        | 3.130.176,93 | 1,10746 | 4.351.672,95  | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 4.484.157,90      | 80.959.640,27              | 91.230.358,53             |
| 32 BIS 3° PROV. | 05/2010        | 184.400,75   | 1,10746 | 249.683,85    | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 582.364,16        | 81.391.716,52              | 91.812.722,69             |
| 33 3° PROV.     | 06/2010        | 0,00         | 1,10746 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 332.480,81        | 81.542.392,82              | 92.145.203,50             |
| 34 3° PROV.     | 07/2010        | 0,00         | 1,10746 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 332.480,81        | 81.993.067,52              | 92.477.684,31             |
| 35 3° PROV.     | 08/2010        | 0,00         | 1,10746 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,10746 | 332.480,81    | 332.480,81        | 82.143.743,02              | 92.810.165,12             |
| 36 BIS 4° PROV. | 09/2010        | 0,00         | 1,09144 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09144 | 362.879,73    | 362.879,73        | 82.394.418,52              | 93.173.044,85             |
| 37 BIS 4° PROV. | 10/2010        | 115.357,21   | 1,09144 | 166.991,96    | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09144 | 362.879,73    | 529.879,69        | 82.790.452,23              | 93.702.916,54             |
| 38 BIS 4° PROV. | 11/2010        | 115.357,20   | 1,09144 | 166.991,95    | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09144 | 362.879,73    | 529.879,68        | 83.126.483,93              | 94.232.788,22             |
| 39 4° PROV.     | 12/2010        | 0,00         | 1,09144 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09144 | 362.879,73    | 362.879,73        | 83.377.159,43              | 94.595.667,95             |
| 40 4° PROV.     | 01/2011        | 0,00         | 1,09144 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09144 | 362.879,73    | 362.879,73        | 83.627.834,93              | 94.958.547,68             |
| 41 4° PROV.     | 02/2011        | 0,00         | 1,09144 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09144 | 362.879,73    | 362.879,73        | 83.878.510,43              | 95.321.427,41             |
| 42 4° PROV.     | 03/2011        | 0,00         | 1,09144 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09144 | 362.879,73    | 362.879,73        | 84.129.185,93              | 95.684.307,14             |
| 43 BIS 5° PROV. | 04/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 84.379.861,43              | 96.082.458,78             |
| 44 BIS 5° PROV. | 05/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 84.630.536,93              | 96.480.610,42             |
| 45 BIS 5° PROV. | 06/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 84.881.212,43              | 96.878.762,06             |
| 46 5° PROV.     | 07/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 85.131.887,93              | 97.276.913,70             |
| 47 5° PROV.     | 08/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 85.382.563,43              | 97.675.065,34             |
| 48 5° PROV.     | 09/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 85.633.239,93              | 98.073.216,98             |
| 49 5° PROV.     | 10/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 85.883.914,43              | 98.471.368,62             |
| 50 5° PROV.     | 11/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 86.134.590,93              | 98.869.520,26             |
| 51 5° PROV.     | 12/2011        | 0,00         | 1,09220 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,09220 | 398.151,64    | 398.151,64        | 86.385.266,43              | 99.267.671,90             |
| 52 BIS 6° PROV. | 01/2012        | 0,00         | 1,11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 86.635.940,93              | 99.711.117,27             |
| 53 BIS 6° PROV. | 02/2012        | 0,00         | 1,11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 86.886.616,43              | 100.154.562,64            |
| 54 BIS 6° PROV. | 03/2012        | 0,00         | 1,11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 87.137.291,93              | 100.598.008,01            |
| 55 6° PROV.     | 04/2012        | 0,00         | 1,11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 87.387.967,43              | 101.041.453,38            |
| 56 6° PROV.     | 05/2012        | 0,00         | 1,11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50                | 1,11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 87.638.642,93              | 101.484.898,75            |

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. Enrique Roy Monje  
Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Cesar Conti  
Supervisor de Obra  
24° Distrito D.N.V. - T.U.F.

000510



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 24° DISTRITO TIERRA DEL FUEGO  
 OBRAS DE CONTRATO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

ORIGINAL

113



Obra: Malla N° 603  
 Provincia: TIERRA DEL FUEGO  
 Ruta: RN. 0003

Expediente Principal: 0013023/2006  
 Expediente Certificado: 0020230/2012  
 Certificado N°: 61 5° PROV.  
 Decreto N°: 01295/2002

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA>; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO>; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE>; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.>; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE>; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA>; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)>; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Fecha de Licitación: 31 de enero de 2007      Monto de Recuperación: \$ 73.851.490,51  
 Fecha de Replanteo: 01 de noviembre de 2007      Monto de Mantenimiento: \$ 15.040.529,84  
 Fecha de Finalización de Recuperación: 01 de diciembre de 2010      Monto del Contrato: \$ 88.892.020,35  
 Fecha de Medición: 31 de octubre de 2012      Avance Financiero a Origen: 100,00 %  
 Plazo Vigente: 050 M 00 d  
 Fecha de Finalización del Contrato: 01 de noviembre de 2012

| Certificado | Mes de Ejec. | PR2 Contrato | I. R.   | PR2 Redeterm. | PR1 Contrato | Descuento PR1 a Contrato | PR1 Contrato c/Descuento | I. R.   | PR1 Redeterm. | Monto Certificado | Monto Acumulado a Contrato | Monto Acumulado Redeterm. |
|-------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 57 6° PROV. | 05/2012      | 0,00         | 1.11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50               | 1.11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 87.889.318,43              | 101.928.344,12            |
| 58 6° PROV. | 07/2012      | 0,00         | 1.11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50               | 1.11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 88.139.993,93              | 102.371.789,49            |
| 59 5° PROV. | 08/2012      | 0,00         | 1.11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50               | 1.11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 88.390.669,43              | 102.815.234,86            |
| 60 5° PROV. | 09/2012      | 0,00         | 1.11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50               | 1.11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 88.641.344,93              | 103.258.680,23            |
| 61 5° PROV. | 10/2012      | 0,00         | 1.11376 | 0,00          | 250.675,50   | 0,00                     | 250.675,50               | 1.11376 | 443.445,37    | 443.445,37        | 88.892.020,43              | 103.702.125,60            |
|             | 11/2012      | 0,00         |         |               | 0,00         |                          |                          |         |               |                   |                            |                           |

COPIA NO NEGOCIABLE

Resumen Certificado

Monto Acumulado al presente Certificado: \$ 103.702.125,60  
 Monto Acumulado al Certificado Anterior: \$ 103.258.680,23  
 Monto Total Presente Certificado: \$ 443.445,37  
 A Deduclr Certificado N°: \$ 0,00  
 Importe Presente Certificado 61 6° PROV.: \$ 443.445,37  
 A Deduclr por Anticipo Financiero: \$ 0,00  
 A Deduclr por Penales: \$ 0,00  
 Descuento 5 % según condiciones de Contrato: \$ 22.172,27  
 Suma a Pagar por el presente Certificado: \$ 421.273,10

SON PESOS: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. Enrique Roy Monto  
 Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Conti  
 Supervisor de Obra  
 24° Distrito D.N.V.-T.D.F.

Ing. Eleena Villegas Florza  
 Jefe Int. División Obras  
 24° Dist. D.N.V.-T.D.F.

CONTRATISTA

INGENIERO

JEFE DIVISION OBRAS

Ing. Juan J. SOSA ZAMARSDIE  
 Jefe 24° Distrito D.N.V.  
 Tierra del Fuego

JEFE DE DISTRITO

JEFE SEC. CERTIFICACIONES

JEFE DIV. MARCHA DE CONTRATOS

FECHA DE CONFORMIDAD: 05/11/2012

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000511



# Dirección Nacional de Vialidad

## Plan de Inversiones

**Obra:** Milla N° 603 - Ruta RN. 0003

**Tramo:** <SAN SEBASTIAN-TOLF-JINI>

**Sección:**

<SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA>; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO>; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDES>; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDES - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.>; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDES>; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARJAS>; <PUNTA MARJAS - PUENTE JUSTICIA (RIO EIVAN SUR)>; <PUENTE JUSTICIA (RIO EIVAN SUR)>; <CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS DE OBRAS>

**Contratista:**

**Distributo Principal:** TIERRA DEL FUEGO

**Certificado N°:** 61 6° PROV.

**Mes:** octubre de 2012

**Fecha de Replanteo:** 04/11/2007

**Plazo Original de Obra:** 060 M DI J

**Monto Vigente:** \$ 103.762.569,30

| Periodo | Previsto Mensual Pr2 | Previsto Mensual Pr1 | Previsto Mensual Total | Previsto Acumulado Total | Ejecutado Mensual Pr2 | Ejecutado Mensual Pr1 | Ejecutado Mensual Total | Ejecutado Acumulado Pr2 | Ejecutado Acumulado Pr1 | Ejecutado Acumulado Total | Adelanto o Atraso |           |
|---------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
|         |                      |                      |                        |                          |                       |                       |                         |                         |                         |                           | En el Mes         | Acumulado |
| oct 07  | \$ 1.477.029,81      | \$ 0,00              | \$ 1.477.029,81        | \$ 1.477.029,81          | \$ 1.477.029,81       | \$ 0,00               | \$ 1.477.029,81         | \$ 1.477.029,81         | \$ 0,00                 | \$ 1.477.029,81           | 0,00 %            | 0,00 %    |
| nov 07  | \$ 3.692.574,53      | \$ 250.675,50        | \$ 3.943.250,03        | \$ 5.420.279,84          | \$ 3.692.574,53       | \$ 250.675,50         | \$ 3.943.250,03         | \$ 5.169.604,34         | \$ 250.675,50           | \$ 5.420.279,84           | 0,00 %            | 0,00 %    |
| ene 08  | \$ 1.063.461,46      | \$ 250.675,50        | \$ 1.314.136,96        | \$ 6.734.416,80          | \$ 1.063.461,46       | \$ 250.675,50         | \$ 1.314.136,96         | \$ 6.233.055,80         | \$ 501.351,00           | \$ 6.734.416,80           | 0,00 %            | 0,00 %    |
| feb 08  | \$ 4.283.386,45      | \$ 250.675,50        | \$ 4.534.061,95        | \$ 11.268.478,75         | \$ 4.283.386,45       | \$ 250.675,50         | \$ 4.534.061,95         | \$ 10.516.452,25        | \$ 752.026,50           | \$ 11.268.478,75          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| mar 08  | \$ 5.021.901,35      | \$ 250.675,50        | \$ 5.272.576,85        | \$ 16.541.055,60         | \$ 5.021.901,35       | \$ 250.675,50         | \$ 5.272.576,85         | \$ 15.538.353,60        | \$ 1.002.702,00         | \$ 16.541.055,60          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| abr 08  | \$ 5.317.307,32      | \$ 250.675,50        | \$ 5.567.982,82        | \$ 22.109.038,42         | \$ 5.317.307,32       | \$ 250.675,50         | \$ 5.567.982,82         | \$ 20.855.660,92        | \$ 1.253.377,50         | \$ 22.109.038,42          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| may 08  | \$ 5.935.103,61      | \$ 274.838,11        | \$ 6.209.941,72        | \$ 28.318.980,14         | \$ 5.935.157,75       | \$ 274.840,62         | \$ 6.209.998,37         | \$ 26.790.818,67        | \$ 1.528.218,12         | \$ 28.319.036,79          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| jun 08  | \$ 3.885.561,71      | \$ 274.838,11        | \$ 4.161.399,82        | \$ 32.480.379,96         | \$ 3.886.597,16       | \$ 274.840,62         | \$ 4.161.437,78         | \$ 30.677.415,83        | \$ 1.803.058,74         | \$ 32.480.474,57          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| jul 08  | \$ 186.231,08        | \$ 274.838,11        | \$ 461.069,19          | \$ 32.541.449,15         | \$ 186.232,78         | \$ 274.840,62         | \$ 461.073,40           | \$ 30.863.648,61        | \$ 2.077.899,36         | \$ 32.941.547,97          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| ago 08  | \$ 0,00              | \$ 274.838,11        | \$ 274.838,11          | \$ 33.216.287,26         | \$ 0,00               | \$ 274.840,62         | \$ 274.840,62           | \$ 30.863.648,61        | \$ 2.352.739,98         | \$ 33.216.388,59          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| sep 08  | \$ 0,00              | \$ 274.838,11        | \$ 274.838,11          | \$ 33.491.125,37         | \$ 0,00               | \$ 274.840,62         | \$ 274.840,62           | \$ 30.863.648,61        | \$ 2.627.580,60         | \$ 33.491.229,21          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| oct 08  | \$ 0,00              | \$ 274.838,11        | \$ 274.838,11          | \$ 33.765.963,48         | \$ 0,00               | \$ 274.840,62         | \$ 274.840,62           | \$ 30.863.648,61        | \$ 2.902.421,22         | \$ 33.766.069,83          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| nov 06  | \$ 2.129.511,94      | \$ 274.838,11        | \$ 2.404.350,05        | \$ 34.040.801,59         | \$ 2.129.531,35       | \$ 274.840,62         | \$ 2.404.371,98         | \$ 30.863.648,61        | \$ 3.177.261,84         | \$ 34.040.910,45          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| dic 08  | \$ 4.348.090,92      | \$ 274.838,11        | \$ 4.622.929,03        | \$ 36.445.151,64         | \$ 4.348.130,57       | \$ 274.840,62         | \$ 4.622.971,19         | \$ 32.993.179,97        | \$ 3.452.102,46         | \$ 36.445.282,43          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| ene 09  | \$ 4.671.971,06      | \$ 274.838,11        | \$ 4.946.809,17        | \$ 41.068.080,67         | \$ 4.672.013,67       | \$ 274.840,62         | \$ 4.946.854,29         | \$ 37.341.310,54        | \$ 3.725.943,06         | \$ 41.068.253,62          | 0,00 %            | 0,00 %    |
| feb 09  | \$ 5.319.731,35      | \$ 274.838,11        | \$ 5.594.569,46        | \$ 51.609.459,30         | \$ 5.319.779,86       | \$ 274.840,62         | \$ 5.594.620,48         | \$ 42.013.324,21        | \$ 4.061.783,70         | \$ 46.015.107,91          | 0,00 %            | 0,00 %    |
|         |                      |                      |                        |                          |                       |                       |                         | \$ 47.333.000,07        | \$ 4.276.624,32         | \$ 51.609.728,39          | 0,00 %            | 0,00 %    |

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. Enrique Rey Moric  
Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar J. Jini  
Supervisor de Obra  
24° Distrito D.N.V.-T.O.F.



000512



| Periodo | Previsto Mensual Pr2 | Previsto Mensual Pr1 | Previsto Mensual Total | Previsto Acumulado Total | Ejecutado Mensual Pr2 | Ejecutado Mensual Pr1 | Ejecutado Mensual Total | Ejecutado Acumulado Pr2 | Ejecutado Acumulado Pr1 | Ejecutado Acumulado Total | Adelantado En el Mes | Atraso Acumulado |
|---------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| mar 09  | \$ 5.222.567,30      | \$ 274.838,11        | \$ 5.497.405,41        | \$ 5.106.864,71          | \$ 5.222.614,94       | \$ 274.840,62         | \$ 5.497.455,56         | \$ 52.555.719,01        | \$ 4.551.464,94         | \$ 57.107.183,95          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| abr 09  | \$ 1.684.176,74      | \$ 274.838,11        | \$ 1.959.014,85        | \$ 59.065.879,56         | \$ 1.684.192,10       | \$ 274.840,62         | \$ 1.959.032,72         | \$ 54.239.911,11        | \$ 4.826.305,56         | \$ 59.066.216,67          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| may 09  | \$ 1.618.576,60      | \$ 300.216,66        | \$ 1.918.793,26        | \$ 60.984.672,82         | \$ 1.618.532,09       | \$ 300.208,41         | \$ 1.918.740,50         | \$ 55.858.443,20        | \$ 5.126.513,97         | \$ 60.984.957,17          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| jun 09  | \$ 1.067.895,74      | \$ 300.216,66        | \$ 1.368.112,40        | \$ 62.372.785,22         | \$ 1.067.865,83       | \$ 300.208,41         | \$ 1.368.074,24         | \$ 56.946.309,03        | \$ 5.426.722,38         | \$ 62.373.031,41          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| jul 09  | \$ 0,00              | \$ 300.216,66        | \$ 300.216,66          | \$ 62.673.001,88         | \$ 0,00               | \$ 300.208,41         | \$ 300.208,41           | \$ 56.946.309,03        | \$ 5.726.930,79         | \$ 62.673.239,82          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| ago 09  | \$ 0,00              | \$ 300.216,66        | \$ 300.216,66          | \$ 62.973.218,54         | \$ 0,00               | \$ 300.208,41         | \$ 300.208,41           | \$ 56.946.309,03        | \$ 6.027.139,20         | \$ 62.973.448,23          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| sep 09  | \$ 0,00              | \$ 300.216,66        | \$ 300.216,66          | \$ 63.273.435,20         | \$ 0,00               | \$ 300.208,41         | \$ 300.208,41           | \$ 56.946.309,03        | \$ 6.327.347,61         | \$ 63.273.656,64          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| oct 09  | \$ 0,00              | \$ 300.216,66        | \$ 300.216,66          | \$ 63.573.651,86         | \$ 0,00               | \$ 300.208,41         | \$ 300.208,41           | \$ 56.946.309,03        | \$ 6.627.556,02         | \$ 63.573.865,05          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| nov 09  | \$ 2.189.739,42      | \$ 300.216,66        | \$ 2.489.956,08        | \$ 66.063.607,94         | \$ 2.189.679,20       | \$ 300.208,41         | \$ 2.489.887,61         | \$ 59.135.988,23        | \$ 6.927.764,43         | \$ 66.063.752,66          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| dic 09  | \$ 3.626.209,39      | \$ 300.216,66        | \$ 3.926.426,05        | \$ 69.992.033,99         | \$ 3.628.109,50       | \$ 300.208,41         | \$ 3.928.317,91         | \$ 62.764.097,73        | \$ 7.227.972,84         | \$ 69.992.070,57          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| ene 10  | \$ 6.274.305,77      | \$ 332.477,94        | \$ 6.606.783,71        | \$ 76.598.817,70         | \$ 6.274.359,85       | \$ 332.480,81         | \$ 6.606.840,66         | \$ 69.038.457,58        | \$ 7.560.453,65         | \$ 76.598.911,23          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| feb 10  | \$ 4.801.674,27      | \$ 332.477,94        | \$ 5.134.152,21        | \$ 81.732.969,91         | \$ 4.801.745,66       | \$ 332.480,81         | \$ 5.134.196,47         | \$ 73.840.173,24        | \$ 7.892.934,46         | \$ 81.733.107,70          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| mar 10  | \$ 4.680.571,78      | \$ 332.477,94        | \$ 5.013.049,72        | \$ 86.746.019,63         | \$ 4.680.612,12       | \$ 332.480,81         | \$ 5.013.092,93         | \$ 78.520.765,36        | \$ 8.225.415,27         | \$ 86.746.200,63          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| abr 10  | \$ 4.151.641,31      | \$ 332.477,95        | \$ 4.484.119,26        | \$ 91.230.138,89         | \$ 4.151.677,09       | \$ 332.480,81         | \$ 4.484.157,90         | \$ 82.672.462,45        | \$ 8.557.896,08         | \$ 91.230.358,53          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| may 10  | \$ 249.881,20        | \$ 332.477,95        | \$ 582.359,15          | \$ 91.812.498,04         | \$ 249.883,35         | \$ 332.480,81         | \$ 582.364,15           | \$ 82.922.345,80        | \$ 8.890.376,89         | \$ 91.812.722,69          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| jun 10  | \$ 0,00              | \$ 332.477,95        | \$ 332.477,95          | \$ 92.144.975,99         | \$ 0,00               | \$ 332.480,81         | \$ 332.480,81           | \$ 82.922.345,80        | \$ 9.222.857,70         | \$ 92.145.203,50          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| jul 10  | \$ 0,00              | \$ 332.477,95        | \$ 332.477,95          | \$ 92.477.453,94         | \$ 0,00               | \$ 332.480,81         | \$ 332.480,81           | \$ 82.922.345,80        | \$ 9.555.338,51         | \$ 92.477.694,31          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| ago 10  | \$ 0,00              | \$ 332.477,95        | \$ 332.477,95          | \$ 92.809.931,89         | \$ 0,00               | \$ 332.480,81         | \$ 332.480,81           | \$ 82.922.345,80        | \$ 9.887.819,32         | \$ 92.810.165,12          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| sep 10  | \$ 0,00              | \$ 332.477,95        | \$ 332.477,95          | \$ 93.172.811,62         | \$ 0,00               | \$ 332.480,81         | \$ 332.480,81           | \$ 82.922.345,80        | \$ 10.250.699,05        | \$ 93.173.044,85          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| oct 10  | \$ 166.991,96        | \$ 362.879,73        | \$ 529.871,69          | \$ 93.702.683,31         | \$ 166.991,96         | \$ 362.879,73         | \$ 529.871,69           | \$ 83.089.337,76        | \$ 10.613.578,78        | \$ 93.702.916,54          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| nov 10  | \$ 166.991,95        | \$ 362.879,73        | \$ 529.871,68          | \$ 94.232.554,99         | \$ 166.991,95         | \$ 362.879,73         | \$ 529.871,68           | \$ 83.256.329,71        | \$ 10.976.458,51        | \$ 94.232.788,22          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| dic 10  | \$ 0,00              | \$ 362.879,73        | \$ 362.879,73          | \$ 94.595.434,72         | \$ 0,00               | \$ 362.879,73         | \$ 362.879,73           | \$ 83.256.329,71        | \$ 11.339.338,24        | \$ 94.595.667,95          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| ene 11  | \$ 0,00              | \$ 362.879,73        | \$ 362.879,73          | \$ 94.958.314,45         | \$ 0,00               | \$ 362.879,73         | \$ 362.879,73           | \$ 83.256.329,71        | \$ 11.702.217,97        | \$ 94.958.547,68          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| feb 11  | \$ 0,00              | \$ 362.879,73        | \$ 362.879,73          | \$ 95.321.194,18         | \$ 0,00               | \$ 362.879,73         | \$ 362.879,73           | \$ 83.256.329,71        | \$ 12.065.097,70        | \$ 95.321.427,41          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| mar 11  | \$ 0,00              | \$ 362.879,73        | \$ 362.879,73          | \$ 95.684.073,91         | \$ 0,00               | \$ 362.879,73         | \$ 362.879,73           | \$ 83.256.329,71        | \$ 12.427.977,43        | \$ 95.684.307,14          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| abr 11  | \$ 0,00              | \$ 398.151,64        | \$ 398.151,64          | \$ 95.082.225,55         | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71        | \$ 12.826.129,07        | \$ 95.082.458,78          | 0,00 %               | 0,00 %           |
| may 11  | \$ 0,00              | \$ 398.151,64        | \$ 398.151,64          | \$ 95.480.377,19         | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71        | \$ 13.224.280,71        | \$ 95.480.610,42          | 0,00 %               | 0,00 %           |

Ing. Gustavo Casaró Cant.  
Supervisor de Obra  
24ª Ulastrita D.N.V.-I.D.F.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. Esteban Rey Mendieta  
Representante Técnico



| Periodo | Previsto Mensual Pr-2 | Previsto Mensual Pr-1 | Previsto Mensual Total | Previsto Acumulado Total | Ejecutado Mensual Pr-2 | Ejecutado Mensual Pr-1 | Ejecutado Mensual Total | Ejecutado Acumulado Pr-2 | Ejecutado Acumulado Pr-1 | Ejecutado Acumulado Total | Adelantar En el Mes | Atraso Acumulado |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| Jun 11  | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64          | \$ 96.878.528,83         | \$ 0,00                | \$ 398.151,64          | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71         | \$ 13.622.432,35         | \$ 96.878.762,06          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| Jul 11  | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64          | \$ 97.276.680,47         | \$ 0,00                | \$ 398.151,64          | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71         | \$ 14.020.583,99         | \$ 97.276.913,70          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| ago 11  | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64          | \$ 97.674.832,11         | \$ 0,00                | \$ 398.151,64          | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71         | \$ 14.418.735,63         | \$ 97.675.065,34          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| sep 11  | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64          | \$ 98.072.983,75         | \$ 0,00                | \$ 398.151,64          | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71         | \$ 14.816.887,27         | \$ 98.073.216,98          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| oct 11  | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64          | \$ 98.471.135,39         | \$ 0,00                | \$ 398.151,64          | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71         | \$ 15.215.038,91         | \$ 98.471.368,62          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| nov 11  | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64          | \$ 98.869.287,03         | \$ 0,00                | \$ 398.151,64          | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71         | \$ 15.613.190,55         | \$ 98.869.520,26          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| dic 11  | \$ 0,00               | \$ 398.151,64         | \$ 398.151,64          | \$ 99.267.438,67         | \$ 0,00                | \$ 398.151,64          | \$ 398.151,64           | \$ 83.256.329,71         | \$ 16.011.342,19         | \$ 99.267.571,90          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| ene 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 99.710.884,04         | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 16.454.787,56         | \$ 99.711.117,27          | 0,00 %              | 0,00 %           |
| feb 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 100.154.329,41        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 16.898.232,93         | \$ 100.154.562,64         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| mar 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 100.597.774,78        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 17.341.678,30         | \$ 100.598.008,01         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| abr 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 101.041.220,15        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 17.785.123,67         | \$ 101.041.453,38         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| may 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 101.484.665,52        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 18.228.569,04         | \$ 101.484.898,75         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| Jun 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 101.928.110,89        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 18.672.014,41         | \$ 101.928.344,12         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| Jul 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 102.371.556,26        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 19.115.459,78         | \$ 102.371.789,49         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| ago 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 102.815.001,63        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 19.558.905,15         | \$ 102.815.234,86         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| sep 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 103.258.447,00        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 20.002.350,52         | \$ 103.258.680,23         | 0,00 %              | 0,00 %           |
| oct 12  | \$ 0,00               | \$ 443.445,37         | \$ 443.445,37          | \$ 103.701.892,37        | \$ 0,00                | \$ 443.445,37          | \$ 443.445,37           | \$ 83.256.329,71         | \$ 20.445.795,89         | \$ 103.702.125,60         | 0,00 %              | 0,00 %           |

Ing. Gustavo Casar, Dct.  
Supervisor de Obra  
24º Distrito D.N.V.-I.D.F.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. Enrique Ray, Monto  
Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO






**Dirección Nacional de Vialidad**  
**Curva de Avance a valores de contrato según Resol. / Disp. 01933**

**Obra:** Malla N° 603 - RN. 0003  
**Tramo:** <SAN SEBASTIAN-TOHUIN>

**Distrito Principal:** TIERRA DEL FUEGO  
**Mes:** octubre de 2012.

**Sección:** <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA>; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO>; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE>; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.>; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE>; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIÁ>; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)>; <PUENTE JUSTICIA - CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

**Fecha de Replanteo:** 01/11/2007  
**Plazo de Obra:** 060 M 00 d

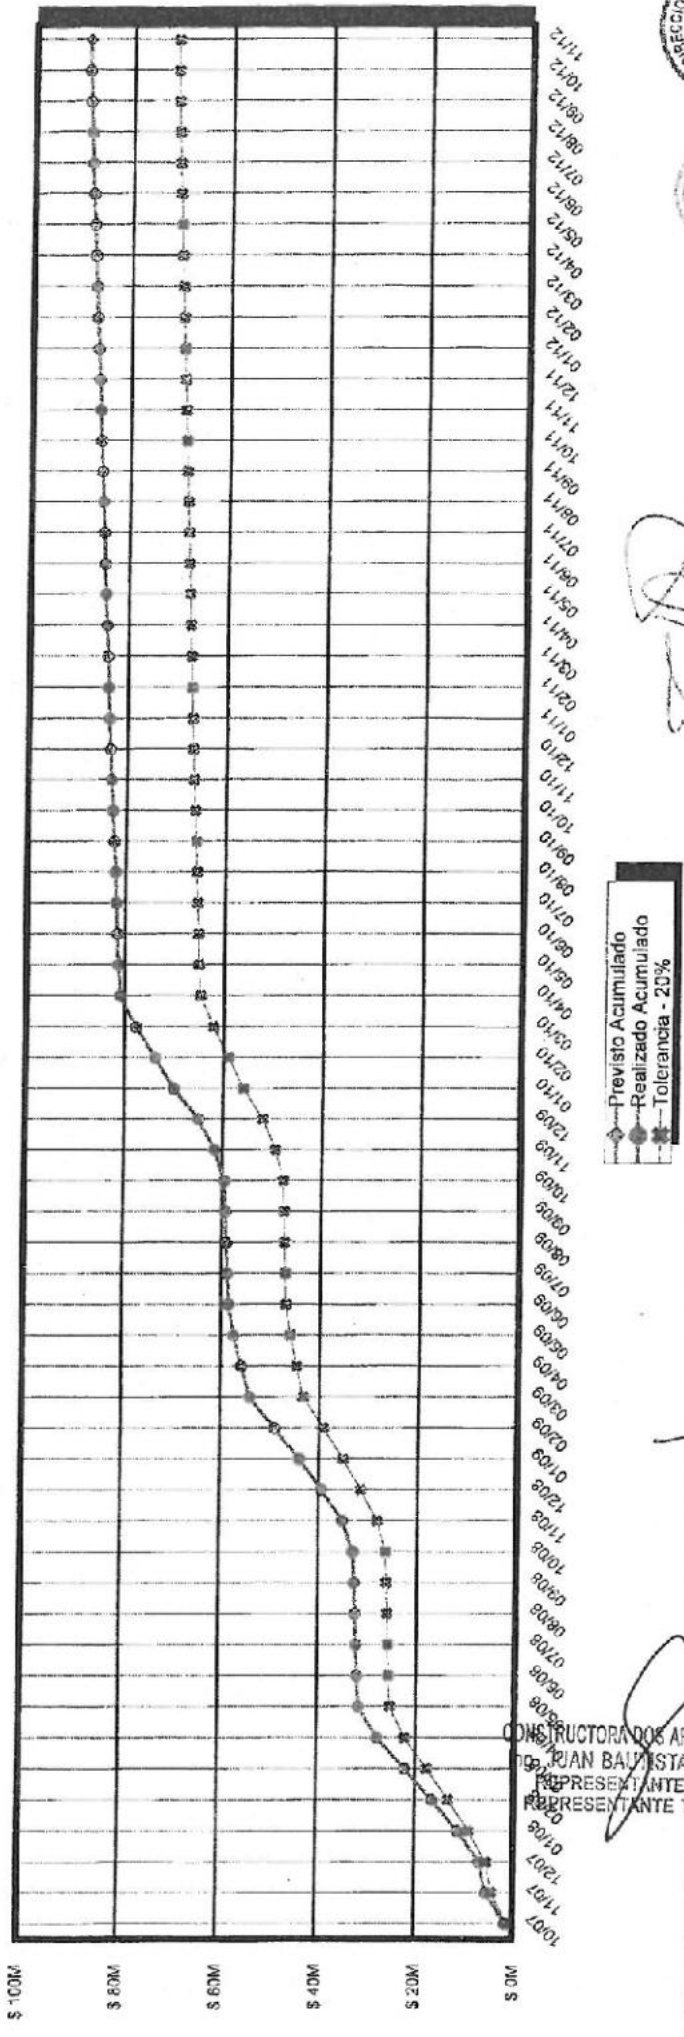


● Previsio Acumulado  
 ○ Realizado Acumulado  
 ■ Tolerancia - 20%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 JUAN BAIJISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. Enrique Rey Morillo  
 Representante Técnico

Ing. Gustavo Caser Conti  
 Supervisor de Obra  
 2ºº Distrito D.N.V.-T.O.F.



02 de noviembre de 2012

000515

ORIGINAL

117




# Dirección Nacional de Vialidad Curva de Inversiones Previstas y Ejecutadas

**Obra:** Malla N° 603 - Ruta RN. 0003  
**Tramo:** <SAN SEBASTIAN-TOLUJIN>

**Sección:** <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO>; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE>; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GRANDE>; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE>; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA>; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)>; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLUJIN>

**Distrito Principal:** TIERRA DEL FUEGO  
**Certificado N°:** 61 6° PROV.  
**Mes:** octubre de 2012  
**Fecha de Replanteo:** 01/11/2007  
**Plazo Original de Obra:** 060 M 00 d

**Contratista:** CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

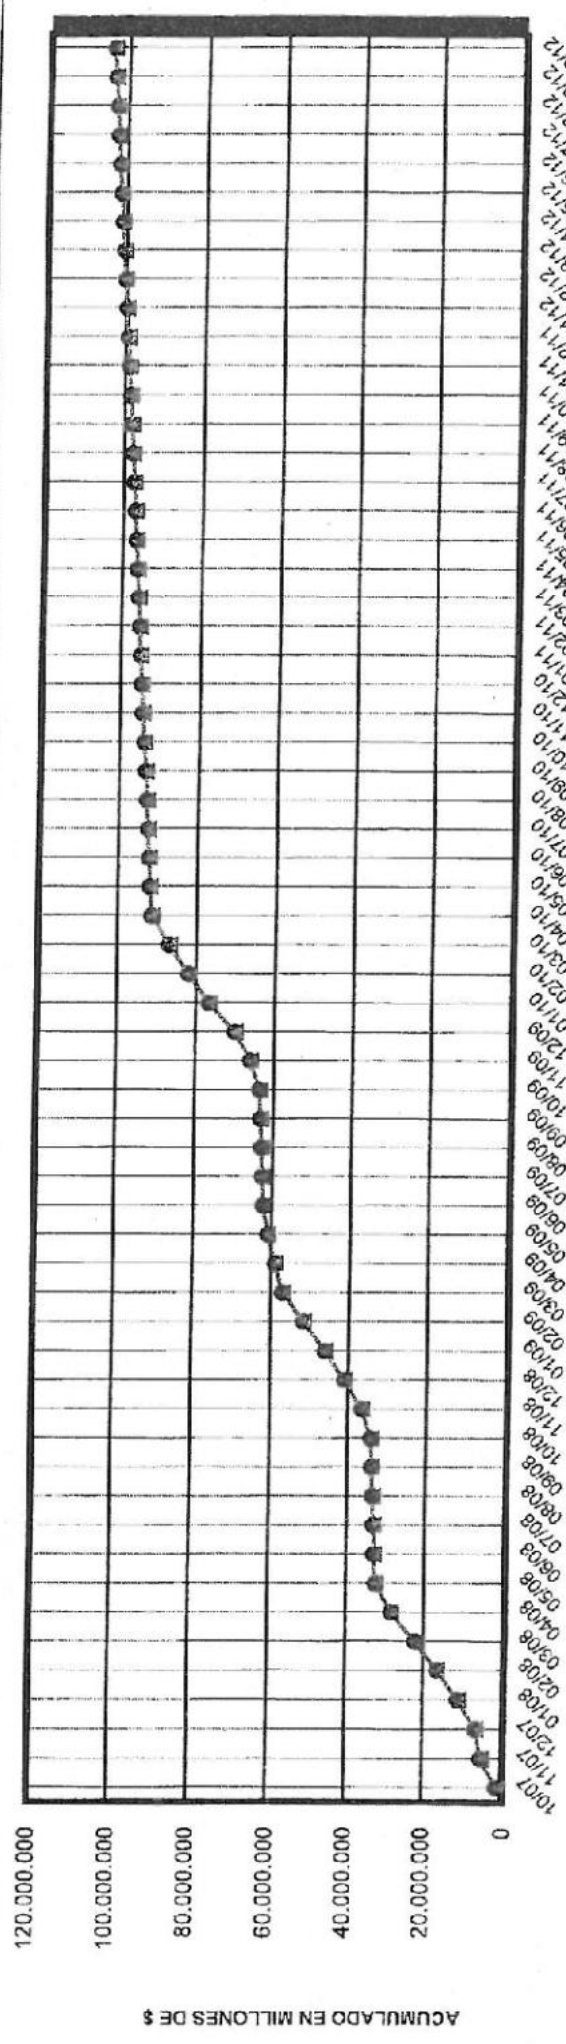

● Realizado Acumulado  
▲ Previsto Acumulado

*[Signature]*

Ing. Gustavo Cesar Sontf  
Supervisor de Obra  
24° Distrito D.N.V.-I.D.F.

*[Signature]*  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. Enrique Ray Mollo  
Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

05 de noviembre de 2012

000516



**INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO**

**OBRA:** Sistema C.Re.Ma - MALLA N° 603  
**Provincia:** Tierra del Fuego  
**Ruta Nacional N° 3**  
**Tramo:** San Sebastián - Tolhuin  
**Sección:** Km. 2766,83 - Km. 2949,94  
**Sección 1:** Km 2766,83 - Km 2790,70  
**2:** Km. 2790,70 - Km. 2829,83  
**3:** Km. 2829,83 - Km. 2836,83  
**4:** Km. 2836,83 - Km. 2849,95  
**5:** Km. 2849,95 - Km. 2854,08  
**6:** Km. 2854,08 - Km. 2881,67  
**7:** Km. 2881,67 - Km. 2916,19  
**8:** Km. 2916,19 - Km. 2949,94

**Expediente Principal N° 13023 - L - 2006**  
**Contratista:** Constructora Dos Arroyos S.A.  
**Licitación Pública N° 140/06**  
**Fecha de Licitación:** 31/01/2007  
**Fecha de Firma de Contrato:** 23/07/2007  
**Fecha de Replanteo:** 01/11/2007

**Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias:** 37 Meses  
**Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2):** 30/11/2010  
**Fecha de Terminación Efectiva de los Trabajos de Recuperación:** 30/11/2010  
**Plazo Total del Contrato incluido trabajos de Mantenimiento:** 60 Meses  
**Fecha de Finalización de Contrato:** 01/10/2012

**Monto de Contrato:** \$ 88.892.020,35 ( PR 1: \$ 15.040.529,84 PR 2: \$ 73.851.490,51 )  
**Monto 1º Adecuación Provisoria:** \$ 95.329.899,81 ( PR 1: \$ 16.369.611,33 PR 2: \$ 78.960.288,48 )  
**Monto 2º Adecuación Provisoria:** \$ 98.677.038,02 ( PR 1: \$ 17.435.058,71 PR 2: \$ 81.241.979,31 )  
**Monto 3º Adecuación Provisoria:** \$ 101.760.671,81 ( PR 1: \$ 18.532.320,25 PR 2: \$ 83.228.351,55 )  
**Monto 4º Adecuación Provisoria:** \$ 102.579.360,69 ( PR 1: \$ 19.322.701,99 PR 2: \$ 83.256.658,70 )  
**Monto 5º Adecuación Provisoria:** \$ 103.249.572,17 ( PR 1: \$ 19.992.823,64 PR 2: \$ 83.256.648,53 )  
**Monto 6º Adecuación Provisoria:** \$ 103.702.569,30 ( PR 1: \$ 20.445.920,77 PR 2: \$ 83.256.648,53 )

**CERTIFICADO N° 61 6º PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012**  
**Importe presente Certificado: \$ 443.445,37**

| Monto Total del Contrato a Valores de 6º Adecuación | Total Certificación Acumulada a Valores 6º Adecuación | Certificación Acumulada a Valores 6º Adecuación |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| \$ 103.702.569,30                                   | \$ 103.702.125,81                                     | 100,00%                                         |

**A) OBRAS DE RECUPERACION E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS**

| PR 2 Total       | Certificado Acumulado | Porcentaje |
|------------------|-----------------------|------------|
| \$ 83.256.648,53 | \$ 83.256.329,72      | 100,00%    |

**B) MANTENIMIENTO DE RUTINA**

| PR 1             | Certificado Acumulado | Porcentaje |
|------------------|-----------------------|------------|
| \$ 20.445.920,77 | \$ 20.445.795,89      | 100,00%    |

**C) PLAZO DEL CONTRATO**

| Plazo Total del Contrato | Plazo Transcurrido | Porcentaje |
|--------------------------|--------------------|------------|
| 60 Meses                 | 60 Meses           | 100,00%    |

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. Enrique Ray Morillo  
 Representante Técnico  
 Contratista

Ing. Gustavo Cesar Conti  
 Supervisor de Obra  
 24º Distrito D.N.V.-T.D.F.  
 Ingeniero

Ing. Juan J. SOSA ZAMARCHE  
 Jefe 24º Distrito D.N.V.  
 Tierra del Fuego  
 Jefe de Distrito

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BALBUENA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

Sub Gerente Obras y Concesiones

Jefe Div. Marcha de Contratos  
 Gerente de Obras y Servicios Viales

**INFORME DEL INGENIERO****OBRA: Sistema C.Re.Ma - MALLA N° 603**

Provincia: Tierra del Fuego

Ruta Nacional N° 3

Tramo: San Sebastián - Tolhuin

Sección: Km. 2766,83 - Km. 2949,94

Expediente Principal N° 13023 - L - 2006

Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.

Licitación Pública N° 140/06

Fecha de Licitación: 31/01/2007

Fecha de Firma de Contrato: 23/07/2007

Fecha de Replanteo: 01/11/2007

Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias: 37 Meses

Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2): 30/11/2010

Plazo Total del Contrato incluido trabajos de Mantenimiento: 60 Meses

Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012

Monto de Contrato: \$ 88.892.020,35 ( PR 1: \$ 15.040.529,84 PR 2: \$ 73.851.490,51 )

Monto 1° Adecuación Provisoria: \$ 95.329.899,81 ( PR 1: \$ 16.369.611,33 PR 2: \$ 78.960.288,48 )

Monto 2° Adecuación Provisoria: \$ 98.677.038,02 ( PR 1: \$ 17.435.058,71 PR 2: \$ 81.241.979,31 )

Monto 3° Adecuación Provisoria: \$ 101.760.671,81 ( PR 1: \$ 18.532.320,26 PR 2: \$ 83.228.351,55 )

Monto 4° Adecuación Provisoria: \$ 102.579.360,69 ( PR 1: \$ 19.322.761,99 PR 2: \$ 83.256.598,70 )

Monto 5° Adecuación Provisoria: \$ 103.249.572,17 ( PR 1: \$ 19.992.923,64 PR 2: \$ 83.256.648,53 )

Monto 6° Adecuación Provisoria: \$ 103.702.569,30 ( PR 1: \$ 20.445.920,77 PR 2: \$ 83.256.648,53 )

**CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012****Importe presente Certificado: \$ 443.445,37**Certificado correspondiente a: Obras de Mantenimiento de Rutina - Conservación: **OCTUBRE 2012**

| ITEMS                                | SECCION                           | PROGRESIVAS |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Bacheo superficial                   | S1; S2; S3; S6; S7 y S8.-         |             |
| Sellado de fisuras                   | S4; S5; S6; S7 y S8.-             |             |
| Reposición Señalamiento vertical     | S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7 y S8.- |             |
| Perfilado de banquetas               | S2; S3; S4; S5; S6; S7 y S8.-     |             |
| Mantenimiento de desagües en general | S1; S2; S4; S6; S6; S7 y S8.-     |             |

Se adjunta a la presente informes semanales, correspondientes a las tareas de Mantenimiento de Rutina.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Cesar Conti  
Supervisor de Obra  
24° Distrito D.N.V.-T.D.F.



ORIGINAL



121

OBRA: Sistema C.R.Ma - MALLAN N° 693  
 Provincia: Tierra del Fuego  
 Ruta Nacional N° 3  
 Tramo: San Sebastián - Tujuelo  
 Sección Km. 2765,83 - Km. 2900,04  
 Sección 1: Km. 2765,83 - Km. 2792,70  
 2: Km. 2792,70 - Km. 2819,57  
 3: Km. 2819,57 - Km. 2846,44  
 4: Km. 2846,44 - Km. 2873,31  
 5: Km. 2873,31 - Km. 2900,18  
 6: Km. 2900,18 - Km. 2927,05  
 7: Km. 2927,05 - Km. 2953,92  
 8: Km. 2953,92 - Km. 2980,79

Expediente Principal N° 15023 - L - 2006  
 Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.  
 Licitación Pública N° 140/06  
 Fecha de Licitación: 01/11/2007  
 Fecha de Firma de Contrato: 23/07/2007  
 Fecha de Replanteo: 01/11/2007

Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias: 37 Meses  
 Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2): 01/11/2010  
 Fecha de Terminación Efectiva de los Trabajos de Recuperación: 30/11/2010  
 Plazo Total del Contrato incluido trabajos de Mantenimiento: 60 Meses  
 Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012

Monto de Contrato: \$ 88.392.020,35 (PR 1: \$ 15.040.529,84 PR 2: \$ 73.851.490,51)  
 Monto 1ª Adjudicación Provisoria: \$ 95.328.099,81 (PR 1: \$ 16.369.811,33 PR 2: \$ 79.958.288,48)  
 Monto 2ª Adjudicación Provisoria: \$ 96.677.038,02 (PR 1: \$ 17.436.098,21 PR 2: \$ 81.241.939,81)  
 Monto 3ª Adjudicación Provisoria: \$ 101.750.871,81 (PR 1: \$ 18.639.390,29 PR 2: \$ 86.128.381,52)  
 Monto 4ª Adjudicación Provisoria: \$ 102.579.350,69 (PR 1: \$ 19.322.764,98 PR 2: \$ 83.256.585,71)  
 Monto 5ª Adjudicación Provisoria: \$ 103.249.572,17 (PR 1: \$ 19.992.923,84 PR 2: \$ 83.256.648,33)  
 Monto 6ª Adjudicación Provisoria: \$ 103.702.509,30 (PR 1: \$ 20.445.920,77 PR 2: \$ 83.256.588,53)

CERTIFICADO N° 61 6º PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012

PLANILLA DE CALCULO DE LA CUOTA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE RUTINA

|                                                      | A VALORES BASICOS | A VALORES DE 1ª ADJUDICACION PROVISORIA | A VALORES DE 2ª ADJUDICACION PROVISORIA | A VALORES DE 3ª ADJUDICACION PROVISORIA | A VALORES DE 4ª ADJUDICACION PROVISORIA | A VALORES DE 5ª ADJUDICACION PROVISORIA | A VALORES DE 6ª ADJUDICACION PROVISORIA |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| MONTO DEL CONTRATO                                   | \$ 88.392.020,35  | \$ 95.328.099,81                        | \$ 96.677.037,80                        | \$ 101.760.871,81                       | \$ 102.579.360,69                       | \$ 103.249.872,17                       | \$ 103.709.509,30                       |
| PRECIO CERTIFICABLE DE MANTENIMIENTO DE RUTINA (PR1) | \$ 16.040.529,84  | \$ 16.369.511,33                        | \$ 17.435.058,93                        | \$ 16.602.320,25                        | \$ 19.322.761,99                        | \$ 19.982.923,84                        | \$ 20.445.920,77                        |
| MONTO DE CERTIFICACION MENSUAL DE MANT. DE RUTINA    | \$ 250.375,50     | \$ 274.838,11                           | \$ 300.216,66                           | \$ 332.477,95                           | \$ 352.875,73                           | \$ 389.161,84                           | \$ 443.445,37                           |
| LONGITUD DE LA MALLA (KM)                            | 176,98            |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |

| RUTA                                                 | SECCION   | LONG. | VALORES CONSTANTES                       |                                 | PRESENTE CERTIFICADO           |              |              |              | IMPORTE TOTAL POR SECCION |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                                                      |           |       | PROPORCIONAL MENSUAL DE 2010 POR SECCION | IMPORTE SEMANA. PRI POR SECCION | IMPORTE SEMANALES A CERTIFICAR |              |              |              |                           |
|                                                      |           |       |                                          |                                 | SEMANA 1                       | SEMANA 2     | SEMANA 3     | SEMANA 4     |                           |
| 3                                                    | SECCION 1 | 23,87 | \$ 55.140,92                             | \$ 11.765,26                    | \$ 14.789,29                   | \$ 14.789,29 | \$ 14.789,29 | \$ 14.789,29 | \$ 59.140,92              |
|                                                      | SECCION 2 | 39,12 | \$ 95.849,46                             | \$ 20.237,37                    | \$ 24.237,37                   | \$ 24.237,37 | \$ 24.237,37 | \$ 24.237,37 | \$ 95.849,46              |
|                                                      | SECCION 3 | 7,00  | \$ 17.343,20                             | \$ 4.335,84                     | \$ 4.335,84                    | \$ 4.335,84  | \$ 4.335,84  | \$ 4.335,84  | \$ 17.343,20              |
|                                                      | SECCION 4 | 8,99  | \$ 22.273,95                             | \$ 5.568,40                     | \$ 5.568,40                    | \$ 5.568,40  | \$ 5.568,40  | \$ 5.568,40  | \$ 22.273,95              |
|                                                      | SECCION 5 | 4,13  | \$ 10.232,58                             | \$ 2.558,13                     | \$ 2.558,13                    | \$ 2.558,13  | \$ 2.558,13  | \$ 2.558,13  | \$ 10.232,58              |
|                                                      | SECCION 6 | 27,80 | \$ 68.257,88                             | \$ 17.089,42                    | \$ 17.089,42                   | \$ 17.089,42 | \$ 17.089,42 | \$ 17.089,42 | \$ 68.257,88              |
|                                                      | SECCION 7 | 34,52 | \$ 85.707,02                             | \$ 21.381,51                    | \$ 21.381,51                   | \$ 21.381,51 | \$ 21.381,51 | \$ 21.381,51 | \$ 85.707,02              |
|                                                      | SECCION 8 | 38,75 | \$ 93.519,35                             | \$ 20.394,36                    | \$ 20.394,36                   | \$ 20.394,36 | \$ 20.394,36 | \$ 20.394,36 | \$ 93.519,35              |
| TOTAL A CERTIFICAR MANTENIMIENTO DE RUTINA, PRESENTE |           |       |                                          |                                 |                                |              |              |              | \$ 443.445,37             |

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. Enrique Ray Monto  
 Representante Técnico

CONTRATISTA (FIRMA Y FECHA)

Ing. Gustavo Cesar Conti  
 Supervisor de Obra  
 24º Distrito D.N.V.-T.D.F.

SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

000519



ORIGINAL

### CERTIFICADO DE OBRAS EJECUTADAS

El funcionario que suscribe Certifica que la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio en la calle 3 de Febrero 2750, Piso 4º, se encuentre ejecutando para esta Dirección Nacional de Vialidad la obra: Expediente 13023-L-2006. Obra: Sistema C.RE.MA: - Malla 603. Ruta Nacional Nº 3. Tramo: San Sebastián – Tolhuin. Sección: Km. 2.766,83 – Km. 2.949,94. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tipo de obra: Recuperación y Mantenimiento. Pavimentación en concreto asfáltico, alcantarillas y puentes con iluminación en zona de casilla de pesaje: longitud total: 178,98 km; Obras de recuperación: Sellado de fisuras tipo puente: 108.157,50 m; Bacheo con mezcla asfáltica: 2.672,15 m3; Base asfáltica en 0,10 m de esp. 80.089,74 m2; Carpeta asfáltica en 0,05 m de esp: 538.289,00; Carpeta asfáltica en 0,06 m de esp: 311.632,70; Riego de Imprimación: 81.943,38; Riego de liga: 928.592,20 m2; Excavación para zanjas de desagüe: 350,00 m3; Terraplenes con compactación especial: 86.400,00 m3; Terraplenes con compactación común: 300 m3; Construcción de subbase drenante: 35.466,29 m3; Construcción de base anticongelante: 17.156,34 m3. Provisión y colocación de baranda metálica de defensa: 20.550,00 m; Construcción de banquetas enripiadas: 89.142,48 m3; Construcción de alcantarillas de chapa D= 1,00 m: 150,00 m; Construcción de gaviones: 600,00 m3; Hormigón H-17: 98,50 m3; Hormigón H-21 incluido armadura: 200,00 m3; Construcción de alcantarillas laterales: 178,00 m3; Reacondicionamiento de obras de arte: 95 m3; Señalamiento horizontal: 49.400 m2; Reposición y mantenimiento de señales verticales: 140 m2. Construcción de dársena, balanza y oficina para puesto fijo de control de cargas. Reparaciones varias en Puentes. Obras de Mantenimiento: Sellado de fisuras tipo puente: 423.360 m; Bacheo con mezcla asfáltica: 2.556,00 m3.

Fecha de Inicio: 01/11/2007

Avance de obra: Recuperación 100% - Mantenimiento: 95,00%. Certificación: 99,44%.

Monto del Contrato: \$ 73.855.112,16 (Recuperación) + \$ 15.036908,19 (Mantenimiento).

Total: \$ 88.892.020,35 (Base Ene-2007)

Monto Total Certificado al 31/08/2012: \$ 102.815.234,86 (S/6º Adecuación provisoria Abr-11)

- Conceptos de la Empresa: muy bueno
- Equipos y rodados: muy bueno.
- Cumplimiento de plazo: en término
- Capacidad Técnica: muy buena

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 10 días del mes de Octubre de 2012 se extiende el presente certificado a efectos de ser presentado ante quién corresponda.

  
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE TECNICO

  
 Ing. CIVIL RICARDO O. GARRONE  
 AG. SUBCERENIA DE  
 ESTUDIOS Y PROYECTOR



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas  
Dirección Nacional de Vialidad

DIRECCION NACIONAL DE RENTAS

LA PLATA, 12 de Noviembre de 2005

COMUNIQUE CON ESTE DOCUMENTO DE SELLOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS

EXPEDIENTE N° 12-33714-04

SALTA, 28/11/2006

FIRMA: SILVIA T. DE SAGANIAS  
SUPERV. TEC. LIQUIDADOR  
SUBPROB. CAP. FED.  
D.G.P. - SALTA



123  
ORIGINAL

2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni

EXPEDIENTE N° 1210-L-04

Entre el señor ADMINISTRADOR GENERAL de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ing. Nelson Guillermo PERIOTTI, por una parte y la Firma: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., con domicilio legal en calle Amenabar 1247, 1° Piso, Buenos Aires, por la otra, a quien en adelante se designará con la palabra "Contratista" y representada en este Acto por el Ing. Juan Bautista PACHELLA, en virtud del Poder General Amplio, conferido a su favor, pasado al folio 233 del Registro 1286 a cargo de la Escribana Silvia CASCO, se ha convenido celebrar el presente:

CONTRATO

ARTICULO 1°.- El Contratista se compromete a ejecutar las obras en dieciocho (18) meses, en un todo de acuerdo con las Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales, Addendas N° 1, N° 2 y N° 3, y demás Documentos de la Licitación, que ha estudiado y aceptado al presentar su Oferta a la Licitación Pública N° 75/04, Obra: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.) CORREDOR EJE CAPRICORNIO en la PROVINCIA DE SALTA - RUTA NACIONAL N° 81, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 - LIMITE CON FORMOSA, SECCION VI: LOS BLANCOS - LIMITE CON FORMOSA, efectuada el día 12 de Noviembre de 2004.

ARTICULO 2°.- Todos los documentos mencionados en el artículo 1° forman parte integrante del presente contrato, a cuyos efectos y en prueba de conformidad los firman ambas partes.

ARTICULO 3°.- Las obras objeto de este contrato, aplicando los precios unitarios cotizados en el Formulario de Presupuesto de la Oferta, importan la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ( \$ 27.776.885,41), de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM N°                 | DESIGNACIÓN                                  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO EN LETRAS                                                                                             | UNITARIO (\$) | PARCIAL (\$) |
|-------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>OBRAS A EJECUTAR</b> |                                              |        |          |                                                                                                              |               |              |
| 1                       | Desbosque, destronque y limpieza del terreno | Ha     | 75,00    | Dos mil seiscientos veintiocho pesos con ochenta y siete ctvos                                               | 2.628,87      | 197.165,25   |
| 2                       | Terraplenes                                  |        |          | CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.<br>Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>REPRESENTANTE TECNICO | A fs. 2.....  | 197.165,25   |

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000521



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas  
Dirección Nacional de Vialidad



124  
ORIGINAL

"2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni"

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04  
HOJA Nº 2

| ITEM Nº | DESIGNACION                                                                              | UNIDAD         | CANTIDAD   | PRECIO EN LETRAS                                  | UNITARIO (\$) | PARCIAL (\$)  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                          |                |            |                                                   | De fs. 1...   | 197.165,25    |
| a)      | Con compactación especial                                                                | m <sup>3</sup> | 462.625,00 | Quince pesos con cincuenta ctvos.                 | 15,50         | 7.170.687,50  |
| b)      | Sin compactación especial                                                                | m <sup>3</sup> | 1.549,00   | Diez pesos con setenta y seis ctvos.              | 10,76         | 16.667,24     |
| c)      | Sin compactación especial para recubrimiento de taludes                                  | m <sup>3</sup> | 22.568,00  | Doce pesos con treinta ctvos                      | 12,30         | 277.586,40    |
| 3       | Recubrimiento con suelo seleccionado                                                     | m <sup>3</sup> | 51.851,18  | Veintisiete pesos con cincuenta y tres ctvos.     | 27,53         | 1.427.462,99  |
| 4       | Construcción de base granular                                                            | m <sup>3</sup> | 34.678,58  | Doscientos nueve pesos con treinta y cinco ctvos. | 209,35        | 7.259.960,72  |
| 5       | Materiales bituminosos para riego                                                        |                |            |                                                   |               |               |
| a)      | De imprimación con E.M-1                                                                 | m <sup>2</sup> | 231.190,51 | Dos pesos con setenta y nueve ctvos.              | 2,79          | 645.021,52    |
| b)      | De liga con E.R.-1                                                                       | m <sup>2</sup> | 218.165,69 | Un peso con veintinueve ctvos.                    | 1,29          | 281.433,74    |
| 6       | Ejecución de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05 m. de espesor | m <sup>2</sup> | 218.165,69 | Treinta y un pesos con treinta y dos ctvos.       | 31,32         | 6.832.949,41  |
| 7       | Excavación no clasificada para badenes                                                   | m <sup>3</sup> | 2.520,00   | Trece pesos con sesenta y cuatro ctvos.           | 13,64         | 34.372,80     |
| 8       | Excavación para fundaciones de alcantarillas                                             | m <sup>3</sup> | 316,00     | Treinta y cinco pesos con setenta y siete ctvos.  | 35,77         | 11.303,32     |
|         |                                                                                          |                |            |                                                   | A fs.3.....   | 24.154.610,89 |

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA FACELLA  
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000522





Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas  
Dirección Nacional de Vialidad



125

ORIGINAL

"2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni"

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04  
HOJA Nº3

| ITEM Nº | DESIGNACION                                                                                                   | UNI-DAD        | CANTI-DAD | PRECIO EN LETRAS                                                      | UNITARIO (\$) | PARCIAL (\$)  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                               |                |           |                                                                       | De fs. 2...   | 24.154.610,89 |
| 9       | Hormigón de piedra armado, clase "H-21", excluida la armadura                                                 | m <sup>3</sup> | 127,90    | Novcientos cincuenta y siete pesos con sesenta y dos ctvos.           | 957,62        | 122.479,60    |
| 10      | Hormigón de piedra clase "H-13"                                                                               | m <sup>3</sup> | 527,80    | Quinientos diecinueve pesos con veintinueve ctvos.                    | 519,29        | 274.081,26    |
| 11      | Acero especial en barras ADN-420, colocado                                                                    | Tn             | 6,10      | Cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos con ochenta y seis ctvos | 4.389,86      | 26.778,15     |
| 12      | Acero laminado, colocado                                                                                      | Tn             | 4,90      | Ocho mil setecientos ocho pesos con veintinueve ctvos.                | 8.708,29      | 42.670,62     |
| 13      | Provisión y colocación de caños de chapa ondulada de hierro galvanizado, tipo helicoidal, según plano H-10209 |                |           |                                                                       |               |               |
| a)      | DeØ=1,00m.,e=1,6mm                                                                                            | m              | 144,00    | Cuatrocientos nueve pesos                                             | 409,00        | 58.896,00     |
| b)      | DeØ=0,90m.,e=1,6mm                                                                                            | m              | 128,00    | Trescientos setenta y nueve pesos con cuarenta y cuatro ctvos.        | 379,44        | 48.568,32     |
| c)      | DeØ=0,80m.,e=1,6mm                                                                                            | m              | 209,00    | Trescientos veinte pesos con setenta y un ctvos.                      | 320,71        | 67.028,39     |
|         |                                                                                                               |                |           |                                                                       | A fs. 4.....  | 24.795.113,23 |

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000523



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas  
Dirección Nacional de Vialidad



126

ORIGINAL

"2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni"

EXPEDIENTE N° 1210-L-04  
HOJA N°4

| ITEM N° | DESIGNACION                                                                                                                                                | UNI-DAD | CANTI-DAD  | PRECIO EN LETRAS                                                     | UNITARIO (\$) | PARCIAL (\$)  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                            |         |            |                                                                      | De fs. 3...   | 24.795.113,23 |
| 14      | Baranda metálica cincada para defensa, según plano H-10237, tipo "A", con postes metálicos pesados conformados en frío y alas terminales comunes, colocada | m       | 1.935,48   | Ciento sesenta pesos con cuarenta y dos ctvos.                       | 160,42        | 310.489,70    |
| 15      | Construcción de alambrados según plano H-2840-I tipo "D", incluido materiales, colocado                                                                    | m       | 62.022,00  | Quince pesos con veintiséis ctvos.                                   | 15,26         | 946.455,72    |
| 16      | Tranqueras según plano J-5084, tipo "B", colocadas                                                                                                         | N°      | 7,00       | Un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con setenta y ocho ctvos.  | 1.498,78      | 10.491,46     |
| 17      | Retiro de alambrados                                                                                                                                       | m       | 25.072,00  | Tres pesos con cincuenta y dos ctvos.                                | 3,52          | 88.253,44     |
| 18      | Cordón de hormigón de piedra clase "H-13" de 0,15mx 0,30m para protección del borde del pavimento                                                          | m       | 368,00     | Treinta y un pesos con cincuenta y nueve ctvos.                      | 31,59         | 11.625,12     |
| 19      | Movilidad para el personal de Supervisión                                                                                                                  |         |            |                                                                      |               |               |
| a)      | Cuota mensual                                                                                                                                              | mes     | 36,00      | Cinco mil doscientos setenta y siete pesos con treinta y ocho ctvos. | 5.277,38      | 189.985,68    |
| b)      | Adicional por Km.                                                                                                                                          | Km      | 108.000,00 | Ochenta y tres ctvos.                                                | 0,83          | 89.640,00     |

A fs. 5..... 26.442.054,35


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO  
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA  
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PEROTTI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000524



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas  
Dirección Nacional de Vialidad



127  
ORIGINAL

" 2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni "

EXPEDIENTE N° 1210-L-04  
HOJA N° 5


| ITEM N° | DESIGNACION                                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO EN LETRAS                                     | UNITARIO (\$) | PARCIAL (\$)  |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|         |                                                       |        |          |                                                      | De fs. 4...   | 26.442.054,35 |
| 20      | Provisión de vivienda para el personal de Supervisión | mes    | 18,00    | Tres mil cuarenta y seis pesos con diecisiete ctvos. | 3.046,17      | 54.831,06     |
| 21      | Movilización de obra                                  | Gl     | 1,00     | Un millón doscientos ochenta mil pesos               | 1.280.000,00  | 1.280.000,00  |

TOTAL: 27.776.885,41

ARTICULO 4°.- Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el Contratista ha entregado la Póliza de Seguro de Caucción N° 18.708 otorgada por "FIANZAS Y CREDITO S.A.", por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 1.388.444,27), importe que cubre el cinco por ciento (5 %) del monto de este contrato.-----

ARTICULO 5°.- En prueba de conformidad con lo establecido en los artículos del presente contrato, ambas partes lo firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los ~~veintinueve~~ (29) días del mes de Junio de dos mil cinco.-----

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
PRESIDENTE

  
Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI  
ADMINISTRADOR GENERAL  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

  
CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000525



ORIGINAL

5° Distrito - Salta

LICITACION PUBLICA N° 75/04  
EXPEDIENTE N° 1210-L-2004

OBRA: RUTA NACIONAL N° 81 - PROVINCIA DE SALTA  
TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 - LTE. C/FORMOSA  
SECCION VI: LOS BLANCOS - LTE. C/FORMOSA S.A.

**ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL**

----- En la sede del 5° Distrito, en la ciudad de Salta, a los Dos (2) días del mes de Junio del año Dos Mil Ocho (2008), reunidos el Ingeniero Elías Joaquín Cerezo, en su carácter de Jefe del 5° Distrito, el Jefe de La División Obras Ing. Humberto Edgar Morales y el Ing. Nolberto Lesser, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD; el Sr. Juan Bautista Pacella en representación de la Contratista DOS ARROYOS y habiéndose comprobado que los trabajos de la Obra indicada en el título han sido realizados en un todo de acuerdo a las condiciones del Contrato y Pliego que rige la obra, se procedió a efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de los mismos, Ad-Referendum del SR. ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, habiéndose cumplido con los siguientes recaudos:

- 1) El Representante Técnico presentó el Informe final de cumplimiento de Contrato, conforme al Artículo 50 del Pliego de Condiciones y Especificaciones, cuyo formato original forma parte de la presente Acta.
- 2) Se comprobó que los trabajos han sido ejecutados conforme al Contrato respectivo y a las órdenes impartidas por la Supervisión de Obras, habiendo finalizado en fecha Treinta de Setiembre del Dos Mil Siete (30/09/2007).
- 3) El Control de Calidad de los trabajos estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, habiéndose cumplido satisfactoriamente con lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Pliego General de Bases y Condiciones.
- 4) Habiendo solicitado la Contratista la "Recepción Provisional de la Obra" y no existiendo razones que objetar, en un todo de acuerdo a lo establecido en Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares de la obra, se establece que el plazo de garantía de Seis Meses corre a partir de la fecha de finalización de la obra.

----- Para Constancia y Prueba de conformidad, los intervinientes firman un original y cuatro copias de la presente Acta, que pasará a formar parte de la documentación del Certificado N° 28 R.P. de RECEPCION PROVISIONAL.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN B. PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

Jefe División Obras  
Ing. HUMBERTO E. MORALES  
Jefe División Obras (Int.)  
5to. Distrito - Salta

Supervisión de Obras  
Ing. NOLBERTO R. LESSER  
JEFE SECCION PROYECTOS (INT.)  
5to. DISTRITO SALTA

Jefe de Distrito

Ing. ELIAS J. CEREZO  
Jefe 5to Distrito - Salta (Int)

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.  
Ing. JUAN B. PACELLA  
REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE TECNICO

000526
