



OBRA: "E.P.E.T. Nº 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. - NEUQUEN" - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

	Nº	ITEM	TAREAS	MONTO	%	MES 1		MES 2	
						%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL
A- EDIFICIO	1	ALBAÑILERIA Y AFINES	TRABAJOS PRELIMINARES - DOCUMENTACION TECNICA	81.667,00	0,9952%	20%	0,1990%		0,0000%
			TRABAJOS PRELIMINARES - DEMOLICION	45.035,00	0,5489%	100%	0,5489%		0,0000%
			MOVIMIENTO DE SUELOS	401.775,00	4,8962%	100%	4,8962%		0,0000%
			HORMIGON ARMADO	1.465.779,00	17,8625%	25%	4,4656%	25%	4,4656%
			CAPAS AISLADORAS	77.158,00	0,9403%		0,0000%	50%	0,4701%
			MAMPOSTERIA	1.032.104,00	12,5776%	10%	1,2578%	25%	3,1444%
			CUBIERTA DE TECHOS	567.367,00	6,9142%		0,0000%		0,0000%
			CONTRAPISOS	337.132,00	4,1084%		0,0000%		0,0000%
			PISOS - ZOCALOS	484.611,00	5,9057%		0,0000%		0,0000%
			UMBRALES - ANTEPECHOS	13.814,00	0,1684%		0,0000%		0,0000%
	2	INSTALACION SANITARIA	REVOQUES	261.884,00	3,1914%		0,0000%	10%	0,3191%
			CIELORRASOS	182.687,50	2,2263%		0,0000%		0,0000%
			CARPINTERIA - AFINES	523.356,00	6,3778%		0,0000%		0,0000%
			VIDRIOS Y ESPEJOS	112.151,50	1,3667%		0,0000%		0,0000%
			PINTURAS	300.739,00	3,6650%		0,0000%		0,0000%
			REVESTIMIENTOS	223.599,00	2,7249%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	145.150,00	1,7688%		0,0000%		0,0000%
			RECEPTACULOS DE ALBAÑILERIA - AFINES	31.865,00	0,3884%		0,0000%	50%	0,1942%
			ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	127.999,00	1,5598%		0,0000%		0,0000%
			GRIFERIA - BRONCERIA	108.538,00	1,3226%		0,0000%		0,0000%
	3	INSTALACION ELECTRICA	DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES	51.243,00	0,6245%	50%	0,3122%	50%	0,3122%
			DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	106.690,00	1,3000%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	106.945,00	1,3033%		0,0000%		0,0000%
			BOCAS	110.332,00	1,3446%		0,0000%		0,0000%
			ARTEFACTOS	106.177,00	1,2939%		0,0000%		0,0000%
	4	INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION	TABLEROS - VARIOS	43.471,00	0,5298%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	45.020,00	0,5486%		0,0000%		0,0000%
			CONDUCTOS DE CALEFACCION	126.417,00	1,5406%		0,0000%		0,0000%
			REJAS, DIFUSORES Y TOMA DE AIRE EXTERIOR	13.052,00	0,1591%		0,0000%		0,0000%
			EQUIPOS Y ARTEFACTOS	160.356,00	1,9542%		0,0000%		0,0000%
B-TRABAJOS EXTERIORES	5	INSTALACION SEGURIDAD	CAÑERIA	20.400,00	0,2485%		0,0000%		0,0000%
			VARIOS	19.069,00	0,2324%		0,0000%		0,0000%
			SISTEMA DE SEGURIDAD	80.933,00	0,9862%		0,0000%		0,0000%
			EXTINTORES	40.869,00	0,4980%		0,0000%		0,0000%
	1	ALBAÑILERIA Y AFINES	VARIOS	650.498,00	7,9272%	25%	1,9818%	25%	1,9818%

TOTAL
PORCENTAJE MENSUAL
PORCENTAJE ACUMULADO
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO


8.205.883,00 100,0000%

13,6615% 10,8874%
13,6615% 24,5489%
1.121.046,71 893.407,31
1.121.046,71 2.014.454,01

MES 3								
MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		
%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL
0,2986%		0,0000%		0,0000%	30%	0,2986%	20%	0,1990%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
4,4656%	25%	4,4656%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,4701%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
3,7733%	35%	4,4022%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
3,4571%	35%	2,4200%	15%	1,0371%		0,0000%		0,0000%
2,0542%	50%	2,0542%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	50%	2,9528%	50%	2,9528%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	50%	0,0842%	50%	0,0842%		0,0000%		0,0000%
0,6383%	50%	1,5957%	20%	0,6383%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	50%	1,1131%	50%	1,1131%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%	50%	3,1889%	50%	3,1889%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	80%	1,0934%	20%	0,2733%
0,0000%		0,0000%	25%	0,9163%	50%	1,8325%	25%	0,9163%
0,0000%	50%	1,3624%	50%	1,3624%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%	30%	0,5306%	10%	0,1769%	60%	1,0613%
0,1942%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%	35%	0,5459%	35%	0,5459%	30%	0,4680%
0,6613%		0,0000%	25%	0,3307%	25%	0,3307%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,6500%	50%	0,6500%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%	30%	0,3910%		0,0000%	70%	0,9123%
0,0000%	50%	0,6723%		0,0000%	50%	0,6723%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	100%	1,2939%		0,0000%
0,2649%	50%	0,2649%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	25%	0,1372%	25%	0,1372%	25%	0,1372%	25%	0,1372%
0,0000%	100%	1,5406%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	50%	0,0795%	50%	0,0795%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	50%	0,9771%	50%	0,9771%
0,0000%	50%	0,1243%	50%	0,1243%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	50%	0,1162%	50%	0,1162%
0,0000%	25%	0,2466%	25%	0,2466%	25%	0,2466%	25%	0,2466%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	25%	0,1245%	75%	0,3735%
1,9818%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	25%	1,9818%

18,9094%	24,1656%	13,6789%	11,0347%	7,6626%
43,4583%	67,6239%	81,3028%	92,3375%	100,0000%
1.551.683,00	1.983.000,86	1.122.472,99	905.494,57	628.777,56
3.566.137,01	5.549.137,87	6.671.610,87	7.577.105,44	8.205.883,00

CURVA DE AVANCE E.P.E.T.

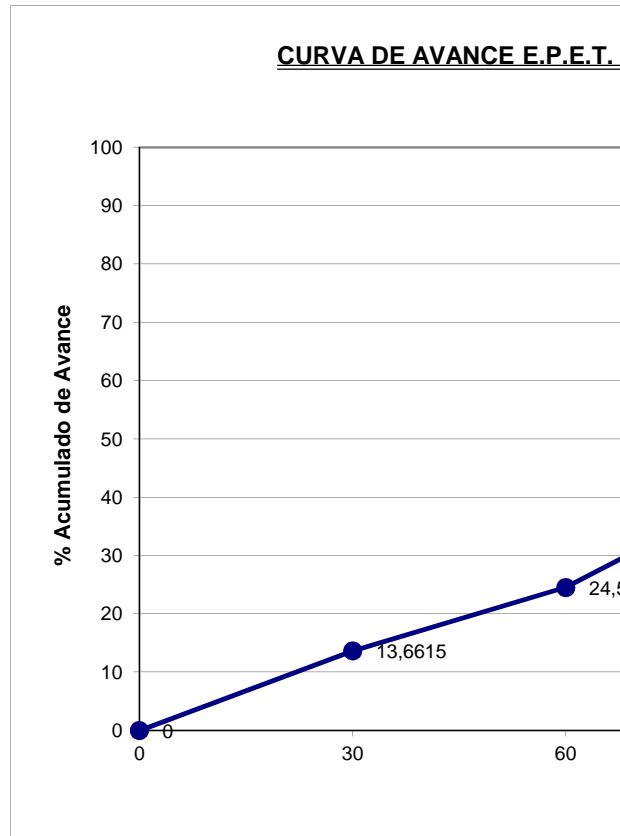

Nº 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. - NEUQUEN

