



OBRA: "ESCUELA PRIMARIA S-Nº - NUEVO EDIFICIO - I ETAPA - RINCON DE LOS SAUCES" - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSES

	Nº	ITEM	TAREAS	MONTO	%	MES 1		
						%ITEM	%TOTAL	%ITEM
A- EDIFICIO	1	ALBANILERIA Y AFINES	TRABAJOS PRELIMINARES - DOCUMENTACION TECNICA	214.784,00	0,9870%	80%	0,7894%	
			MOVIMIENTO DE SUELOS	4.127.070,00	18,9648%	20%	3,7930%	40%
			HORMIGON ARMADO	2.845.351,90	13,0750%		0,0000%	20%
			CAPAS AISLADORAS	103.550,00	0,4758%		0,0000%	5%
			MAMPOSTERIA	856.951,00	3,9379%		0,0000%	
			CUBIERTA DE TECHOS	1.451.493,00	6,6699%		0,0000%	
			CONTRAPISOS	179.655,00	0,8256%		0,0000%	
			PISOS - ZOCALOS	849.561,00	3,9039%		0,0000%	
			UMBRALES - ANTEPECHOS	25.568,00	0,1175%		0,0000%	
			REVOQUES	423.574,00	1,9465%		0,0000%	
			REVESTIMIENTOS	118.368,00	0,5439%		0,0000%	
			CIELORRASOS	435.145,00	1,9996%		0,0000%	
			CARPINTERIA - AFINES	957.394,00	4,3997%		0,0000%	
			VIDRIOS Y ESPEJOS	385.717,00	1,7725%		0,0000%	
			VARIOS	257.657,00	1,1840%		0,0000%	
			PINTURAS	741.665,00	3,4082%		0,0000%	
	2	INSTALACION SANITARIA	RECEPTACULOS DE ALBAÑILERIA - AFINES	24.417,00	0,1122%		0,0000%	20%
			DESAGÜES CLOACALES	117.802,00	0,5413%		0,0000%	
			DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE	84.921,00	0,3902%		0,0000%	
			ARTEFACTOS	144.220,00	0,6627%		0,0000%	
			GRIFERIA - BRONCERIA	126.616,00	0,5818%		0,0000%	
			VARIOS	91.426,00	0,4202%		0,0000%	
	3	INSTALACION ELECTRICA	CENTROS	214.049,00	0,9836%		0,0000%	
			ARTEFACTOS	282.042,00	1,2961%		0,0000%	
			TABLEROS . VARIOS	215.411,00	0,9899%		0,0000%	
	4	INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION	EQUIPOS Y ARTEFACTOS	439.466,00	2,0194%		0,0000%	
			CONDUCTOS DE CALEFACCION	484.884,00	2,2282%		0,0000%	
			CAÑERÍAS PARA DISTRIBUCION DE GAS NATURAL	20.430,00	0,0939%		0,0000%	
			VARIOS	55.757,00	0,2561%		0,0000%	
	5	INSTALACION DE SEGURIDAD	BOCAS	54.498,00	0,2505%		0,0000%	
			VARIOS	73.410,00	0,3373%		0,0000%	
B. TRABAJOS EXTERIORES	1	ALBAÑILERIA Y AFINES	VARIOS	4.441.622,60	20,4104%		0,0000%	20%
	2	INSTALACION SANITARIA	VARIOS	612.560,00	2,8148%	10%	0,2815%	10%
	3	INSTALACION ELECTRICA	VARIOS	201.534,00	0,9260%	10%	0,0926%	10%
	4	INSTALACION GAS	VARIOS	103.067,00	0,4736%	10%	0,0474%	10%

TOTAL

21.761.636,50 100,0000%

PORCENTAJE MENSUAL

5,0039%

PORCENTAJE ACUMULADO

5,0039%

TOTAL MENSUAL

1.088.930,53

TOTAL ACUMULADO

1.088.930,53


IONES

MES 2	MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9	
%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL	%ITEM	%TOTAL
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
7,5859%	40%	7,5859%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
2,6150%	30%	3,9225%	30%	3,9225%	20%	2,6150%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0238%	35%	0,1665%	40%	0,1903%	10%	0,0476%	10%	0,0476%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	30%	1,1814%	30%	1,1814%	20%	0,7876%	20%	0,7876%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%	20%	1,3340%	20%	1,3340%	30%	2,0010%	30%	2,0010%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	10%	0,0826%	30%	0,2477%	40%	0,3302%	10%	0,0826%	10%	0,0826%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,7808%	30%	1,1712%	30%	1,1712%	20%	0,7808%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	40%	0,0470%	30%	0,0353%	30%	0,0353%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,3893%	30%	0,5840%	30%	0,5840%	20%	0,3893%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,1088%	20%	0,1088%	20%	0,1088%	20%	0,1088%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,3999%	20%	0,3999%	20%	0,3999%	20%	0,3999%	20%	0,3999%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,8799%	30%	1,3199%	30%	1,3199%	20%	0,8799%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,3545%	40%	0,7090%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,2368%	20%	0,2368%	40%	0,4736%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,6816%	20%	0,6816%	20%	0,6816%
0,0224%	20%	0,0224%	20%	0,0224%	20%	0,0224%	20%	0,0224%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	20%	0,1083%	20%	0,1083%	20%	0,1083%	20%	0,1083%	20%	0,1083%		0,0000%		0,0000%
0,0000%	10%	0,0390%	20%	0,0780%	30%	0,1171%	20%	0,0780%	20%	0,0780%		0,0000%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,1325%	20%	0,1325%	20%	0,1325%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,1164%	20%	0,1164%	20%	0,1164%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,0840%	30%	0,1261%	30%	0,1261%	20%	0,0840%
0,0000%		0,0000%	20%	0,1967%	20%	0,1967%	20%	0,1967%	20%	0,1967%	20%	0,1967%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	30%	0,3888%	30%	0,3888%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,1980%	20%	0,1980%	20%	0,1980%	20%	0,1980%
0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,4039%	30%	0,6058%	30%	0,6058%
0,0000%	10%	0,2228%	20%	0,4456%	20%	0,4456%	20%	0,4456%	20%	0,4456%	10%	0,2228%		0,0000%
0,0000%	10%	0,0094%	20%	0,0188%	20%	0,0188%	20%	0,0188%	20%	0,0188%	10%	0,0094%		0,0000%
0,0000%		0,0000%		0,0000%	20%	0,0512%	20%	0,0512%	20%	0,0512%	20%	0,0512%	20%	0,0512%
0,0000%	10%	0,0251%	20%	0,0501%	20%	0,0501%	20%	0,0501%	20%	0,0501%	10%	0,0251%		0,0000%
0,0000%		0,0000%	10%	0,0337%	30%	0,1012%	20%	0,0675%	20%	0,0675%	10%	0,0337%	10%	0,0337%
4,0821%	20%	4,0821%	20%	4,0821%	20%	4,0821%	10%	2,0410%	10%	2,0410%		0,0000%		0,0000%
0,2815%	20%	0,5630%	20%	0,5630%	20%	0,5630%	20%	0,5630%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0926%	20%	0,1852%	20%	0,1852%	20%	0,1852%	20%	0,1852%		0,0000%		0,0000%		0,0000%
0,0474%	20%	0,0947%	20%	0,0947%	20%	0,0947%	20%	0,0947%		0,0000%		0,0000%		0,0000%

14,7507%	18,2909%	12,7545%	11,9400%	9,8767%	10,6669%	6,8038%	5,6793%
19,7546%	38,0455%	50,8000%	62,7400%	72,6167%	83,2836%	90,0874%	95,7667%
3.209.993,72	3.980.399,17	2.775.587,93	2.598.339,40	2.149.331,55	2.321.292,00	1.480.618,22	1.235.908,62
4.298.924,25	8.279.323,42	11.054.911,35	13.653.250,75	15.802.582,30	18.123.874,30	19.604.492,52	20.840.401,14

[illegible]

4,2333%
100,0000%
921.235,36
21.761.636,50

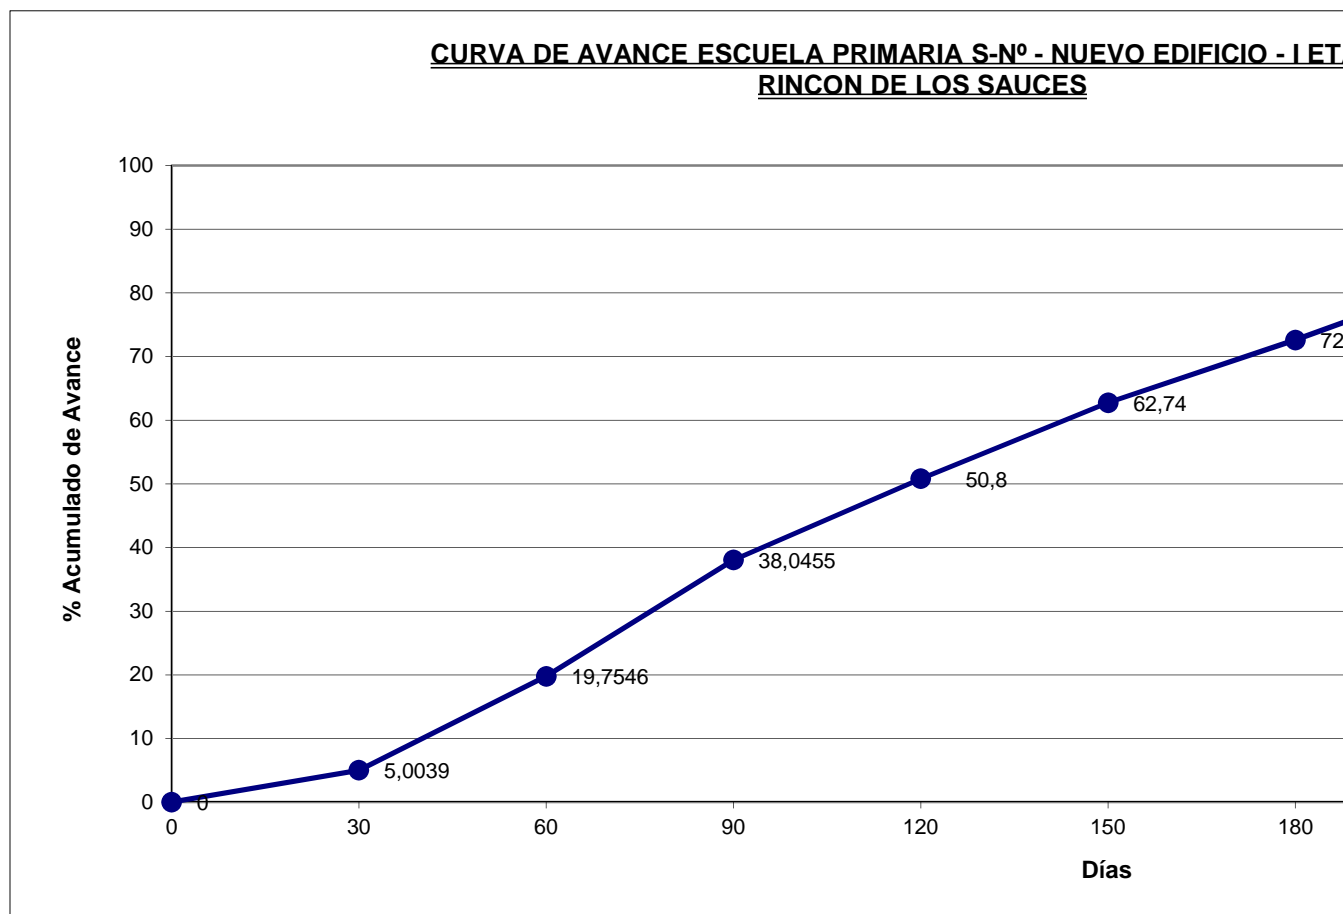

APA -

