ORIGINAL

109

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

" 2007 - Año de la Seguridad Vial "

EXPEDIENTE N° 13.023-L-2006
HOJA N° 2

CLAUSULA SEGUNDA: Todos los documentos mencionados en la cláusula anterior, los Volantes Nros. 1, 2 y 3, y todos los detallados en la Subcláusula 2.3 de la Sección 3, "Condiciones del Contrato", forman parte de este Contrato.----------

CLAUSULA TERCERA: El precio total del Contrato, que se acuerda bajo el sistema de ajuste alzado absoluto, es de PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 88.892.020,35).- El precio convenido esta sujeto a redeterminación bajo las condiciones y con los alcances establecidos en el Pliego.----------

CLAUSULA CUARTA: El Porcentaje (1) aplicable para determinar la parte del precio correspondiente a mantenimiento Pr1 es: Dieciséis con noventa y dos por ciento (16,92%).----------

CLAUSULA QUINTA: Todos los conceptos se usan según la definición dada en el Pliego.--------
Déjase establecido que a los fines de la redeterminación de precio no se desagregan los gastos generales e indirectos y gastos financieros.----------

CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA ha constituido garantía de estricto cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales mediante la Póliza de Seguro de Caución de AFIANZADORA S.A. N° 44.604, por un monto de PESOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE ($ 26.667.607,00), a favor de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, importe que cubre el treinta por ciento (30 %) del precio total de este Contrato.-

CLAUSULA SÉPTIMA.- Sin perjuicio de las declaraciones exigidas en los términos del llamado a licitación , la firma de este Contrato por el Contratista implica, sin admitirse prueba en contrario, que EL CONTRATISTA acepta en toda su extensión la responsabilidad por la aptitud del PROYECTO BASICO DEFINITIVO para alcanzar y mantener los resultados establecidos en las bases del llamado a licitación y en las especificaciones que forman parte de EL CONTRATO.-------

CLAUSULA OCTAVA.- Las palabras y expresiones que se utilizan en EL CONTRATO tendrán el mismo significado que se les asigna en las Condiciones del Contrato a que se hace referencia en el presente instrumento, las cuales fueron leídas y forman parte de EL CONTRATO.----------

CLAUSULA NOVENA.- En consideración a los pagos que EL CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA, por el presente Contrato, EL CONTRATISTA conviene en ejecutar y terminar las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento subsanando cualquier defecto de unas y/u otro, en conformidad con todos los aspectos de las disposiciones de EL CONTRATO.----------

CLAUSULA DECIMA.- EL CONTRATANTE conviene en pagar a EL CONTRATISTA, en consideración por la ejecución y terminación de las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento, el Precio de EL CONTRATO fijado en la CLAUSULA TERCERA a la suma que pueda resultar pagadera de conformidad con las disposiciones de EL CONTRATO, en el momento y de la manera estipulados en EL CONTRATO.----------

En prueba de conformidad con lo establecido en las cláusulas del presente Contrato, ambas partes lo firman en tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.----------

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. CELSO GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

00507

ORIGINAL

110

OBRA: SISTEMA C.RE.Ma. – MALLA 603
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.-
RUTA NACIONAL Nº 3
TRAMO: SAN SEBASTIAN -TOLHUIN
SECCIÓN: Km 2766,83 – Km 2949,94
EXPEDIENTE PRINCIPAL: 13023 – L - 2006
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

En la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 19 (diecinueve) días del mes de Noviembre del 2012, se reúnen el Sr. Jefe del 24° Distrito D.N.V. Ing. Juan José SOSA ZAMARBIDE y el Supervisor de la Obra Ing. Gustavo CONTI, en representación de la Dirección Nacional de Vialidad, y el Ing. Enrique REY MORITO en representación de la Empresa Dos Arroyos S.A., CONTRATISTA de la Obra de Referencia, a los efectos de suscribir la presente ACTA DE CONSTATACION DE FINALIZACION DEL PLAZO CONTRATUAL de la obra de la referencia.-

ACTA DE CONSTATACIÓN DE FINALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.

Art.1° : El día 31/10/2012, operó el vencimiento para la finalización del Contrato de la Obra de Referencia, constatándose a esa fecha la terminación de las tareas de Mantenimiento comprometidas en PR1. Dichos trabajos quedan sujetos a la aprobación definitiva del Control de Calidad.-

Art.2° : Se deja constancia que en el día de la fecha se recorrió la presente malla y todas las Secciones cumplen en su totalidad con las Condiciones exigibles, ajustándose a los requerimientos contractuales. No se detectaron vicios aparentes, ni se registraron trabajos pendientes de ejecución, ni observaciones en cuanto al estado de la zona de camino.-

Art. 3° : En prueba de conformidad, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Por AUTORIZACIÓN del Sr. Jefe Del 24° Distrito

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Morito
Representante Técnico

D.N.V.
Ing. Gustavo Cesar Conti
J/C. Sección Inspección de Obras
24° Distrito D.N.V.- T.D.F.

C.P. Facundo SOLAS
Jefe Int. Dto. Administrativo
24° Dto. D.N.V.
D.N.V.

000508

P/ CONTRATISTAS

ORIGINAL

"2012-Año de Homenaje al Doctor D. MANUEL BELGRANO"

Vialidad Nacional

MEMORANDO

REF: OBRA SISTEMA C.RE.MA. - MALLA N°603
Ruta Nacional N°3- Provincia de Tierra del Fuego
Tramo: San Sebastián- Tolhuin
Expediente Principal Nº 13023-L-2006
Expediente Prodef N° 11536-L-2007
Licitación Pública Nº 140/06
Fecha de Licitación: 31/01/2007
Fecha de firma de Contrato: 23/07/2007
Fecha de Replanteo: 01/11/2007
Plazo de Obra: 60 meses
Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.
Financiación: Fondos del Tesoro de la Nación
Monto del Contrato: $ 88.892.020,36
Fecha Aprobación 1° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 43/08 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 11/09/2008
Monto del Contrato a Precios 1° Adecuación Provisoria: $ 95.329.899,81
Fecha Aprobación 2° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 13/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 19/02/2010
Monto del Contrato a Precios 2° Adecuación Provisoria: $ 98.677.037,83
Fecha Aprobación 3° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 71/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 09/06/2010
Monto del Contrato a Precios 3° Adecuación Provisoria: $ 101.760.671,81
Fecha Aprobación 4° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 204/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 21/12/2010
Monto del Contrato a Precios 4° Adecuación Provisoria: $ 102.579.360,69
Fecha Aprobación 5° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 91/11 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 01/07/2011
Monto del Contrato a Precios 5° Adecuación Provisoria: $ 103.249.572,17
Fecha Aprobación 6° Adecuación Provisoria (S/Disp. Nº 57/12 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 04/04/2012
Monto del Contrato a Precios 6° Adecuación Provisoria: $ 103.702.569,30

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012
Importe presente Certificado: $ 443.445,37

La presente constituye la documentación del **Certificado N° 61 6° PROV.** y se corresponde con el pago de la última **Cuota N° 60** de Mantenimiento de Rutina.-

Cabe mencionar que en el presente certificado surge una diferencia el el Plan de Inversiones entre el Monto vigente del Contrato y Monto ejecutado acumulado total, siendo la diferencia de $ 443,70, que será subsanado al emitir los certificados definitivos.-

Los trabajos ejecutados por la Contratista durante el mes de **OCTUBRE** de **2012** se adecuan a las consideraciones contempladas en las Especificaciones Generales y Particulares requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Obra.-

Mediante Nota de Pedido Nº 246 de fecha 02/11/2012 (cuya copia se adjunta) la Contratista solicita la emisión del presente certificado y adjunta copia del Certificado de Afiliación y Constancia de Contratación de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del Personal de la Empresa. Del mismo modo se adjunta Declaracion Jurada de Calidad.-

Se adjunta a la presente copia de la 6° Adecuación Provisoria de Precios, aprobada mediante Disposición Nº 57 del 04/04/12 del Señor Jefe del 24° Distrito, tal lo establecido en Resolución A.G. Nº 501 de fecha 07/04/2008; y copia del Cuadro Anexo IV - C.Re.Ma. F.T.N. donde surje el mayor gasto a aprobar en concepto de 6° Adecuación Provisoria de Precios de $ 452.997,13, resultando un nuevo Monto de Contrato de $103.702.569,30.-

Cabe destacarse que la presente documentación ha sido elaborada en un todo de acuerdo con lo instruido en la NOTA CIRCULAR A.G. N° 01/03 de fecha 21/08/2003.-

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor
76° -

00509

ORIGINAL

FOLIO 2

112

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 24° DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
OBRAS DE CONTRATO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Obra: Malla N° 603
Provincia: TIERRA DEL FUEGO
Ruta: RN. 0003

Expediente Principal: 0013023/2006
Expediente Certificado: 0020230/2012
Certificado N°: 61 6° PROV.
Decreto N°: 01295/2002

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Fecha de Licitación: 31 de enero de 2007
Fecha de Replanteo: 01 de noviembre de 2007
Fecha de Finalización de Recuperación: 01 de diciembre de 2010
Fecha de Medición: 31 de octubre de 2012
Plazo Vigente: 060 M 00 d
Fecha de Finalización del Contrato: 01 de noviembre de 2012

Monto de Recuperación: $ 73.851.490,51
Monto de Mantenimiento: $ 15.040.529,84
Monto del Contrato: $ 88.892.020,35
Avance Financiero a Origen: 100,00 %

Certificado	Mes de Ejecuc.	PR2 Contrato	I. R.	PR2 Redeterm.	PR1 Contrato	Descuento PR1 a Contrato	PR1 Contrato c/Descuento	I. R.	PR1 Redeterm.	Monto Certificado	Monto Acumulado a Contrato	Monto Acumulado Redeterm.
1	10/2007	1.477.029,81	1,00000	1.477.029,81	0,00	0,00	0,00	1,00000	0,00	1.477.029,81	1.477.029,81	1.477.029,81
2	11/2007	3.692.574,53	1,00000	3.692.574,53	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	3.943.250,03	5.420.279,84	5.420.279,84
3	12/2007	1.063.461,46	1,00000	1.063.461,46	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	1.314.136,96	6.734.416,80	6.734.416,80
4	01/2008	4.283.386,45	1,00000	4.283.386,45	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	4.534.061,95	11.268.478,74	11.268.478,75
5	02/2008	5.021.901,35	1,00000	5.021.901,35	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	5.272.576,85	16.541.055,59	16.541.055,60
6	03/2008	5.317.307,32	1,00000	5.317.307,32	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	5.567.982,82	22.109.038,41	22.109.038,42
07 BIS PROV.	04/2008	5.413.314,25	1,09639	5.935.157,75	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	6.209.998,37	27.773.028,15	28.319.036,79
08 BIS PROV.	05/2008	3.544.671,56	1,09639	3.886.597,15	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	4.161.437,78	31.588.575,19	32.480.474,57
09 BIS PROV.	06/2008	169.856,43	1,09639	186.232,78	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	461.073,40	31.989.109,12	32.941.547,97
10 BIS PROV.	07/2008	0,00	1,09639	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	274.840,62	32.239.784,62	33.216.388,59
11 BIS PROV.	08/2008	0,00	1,09639	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	274.840,62	32.490.460,11	33.491.229,21
12 1° PROV	09/2008	0,00	1,09639	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	274.840,62	32.741.135,61	33.766.069,83
13 1° PROV.	10/2008	0,00	1,09639	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	274.840,62	32.991.811,11	34.040.910,45
14 1° PROV.	11/2008	1.942.394,20	1,09639	2.129.931,36	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	2.404.871,98	35.184.780,81	36.445.282,43
15 1° PROV.	12/2008	3.965.825,04	1,09639	4.348.130,57	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	4.522.971,19	39.401.281,34	41.068.253,62
16 1° PROV.	01/2009	4.251.231,00	1,09639	4.672.013,67	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	4.946.854,29	43.913.187,84	46.015.107,91
17 1° PROV.	02/2009	4.852.042,93	1,09639	5.319.779,86	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	5.594.620,48	49.015.906,27	51.609.728,39
18 1° PROV.	03/2009	4.763.421,14	1,09639	5.222.614,94	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	5.497.455,56	54.080.002,91	57.107.183,95
19 1° PROV.	04/2009	1.536.111,00	1,09639	1.684.192,10	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09639	274.840,62	1.959.032,72	55.816.789,40	59.066.216,67
20 BIS 2° PROV	05/2009	1.351.482,28	1,09234	1.476.332,09	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	1.918.740,50	57.418.947,18	60.984.957,17
21 BIS 2° PROV	06/2009	908.373,33	1,09234	1.057.865,83	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	1.388.074,24	58.577.996,01	62.373.031,41
22 BIS 2° PROV	07/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	58.828.671,51	62.673.239,82
23 BIS 2° PROV	08/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	59.079.347,00	62.973.448,23
24 BIS 2° PROV	09/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	59.330.022,50	63.273.656,64
25 BIS 2° PROV	10/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	59.580.698,00	63.573.865,05
26 BIS 2° PROV	11/2009	1.828.397,93	1,09234	2.189.679,20	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	2.489.887,61	61.659.766,43	66.063.752,65
27 BIS 2° PROV	12/2009	3.929.489,42	1,09234	3.628.109,50	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	3.928.317,91	64.939.931,34	69.992.070,57
28 TRIS 3° PRC	01/2010	4.730.593,66	1,10746	6.274.359,65	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	6.606.840,66	69.921.190,50	76.598.911,23
29 BIS 3° PROV	02/2010	3.620.276,52	1,10746	4.801.715,65	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	5.134.396,47	73.782.142,52	81.733.107,70
30 BIS 3° PROV	03/2010	3.528.980,93	1,10746	4.680.612,12	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	5.013.092,93	77.571.787,04	86.746.200,63
31 BIS 3° PROV	04/2010	3.130.176,83	1,10746	4.151.627,09	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	4.484.157,90	80.959.640,27	91.230.358,53
32 BIS 3° PROV	05/2010	188.400,75	1,10746	249.883,35	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	582.364,16	81.391.716,52	91.812.722,69
33 3° PROV.	06/2010	0,00	1,10746	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	332.480,81	81.642.392,02	92.145.203,50
34 3° PROV.	07/2010	0,00	1,10746	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	332.480,81	81.893.067,52	92.477.684,31
35 3° PROV.	08/2010	0,00	1,10746	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	332.480,81	82.143.743,02	92.810.165,12
36 BIS 4° PROV	09/2010	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	82.394.418,52	93.173.044,85
37 BIS 4° PROV	10/2010	115.357,21	1,09144	166.991,96	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	529.871,69	82.760.451,23	93.702.916,54
38 BIS 4° PROV	11/2010	115.357,20	1,09144	166.991,95	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	529.871,68	83.126.483,93	94.232.788,22
39 4° PROV.	12/2010	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	83.377.159,43	94.595.667,95
40 4° PROV.	01/2011	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	83.627.834,93	94.958.547,68
41 4° PROV.	02/2011	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	83.878.510,43	95.321.427,41
42 4° PROV.	03/2011	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	84.129.185,93	95.684.307,14
43 BIS 5° PROV	04/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	84.379.861,43	96.082.458,78
44 BIS 5° PROV	05/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	84.630.536,93	96.480.610,42
45 BIS 5° PROV	06/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	84.881.212,43	96.878.762,06
46 5° PROV.	07/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.131.887,93	97.276.913,70
47 5° PROV.	08/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.382.563,43	97.675.065,34
48 5° PROV.	09/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.633.238,93	98.073.216,98
49 5° PROV.	10/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.883.914,43	98.471.368,62
50 5° PROV.	11/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	86.134.589,93	98.869.520,26
51 5° PROV.	12/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	86.385.265,43	99.267.671,90
52 BIS 6° PROV	01/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	86.635.940,93	99.711.117,27
53 BIS 6° PROV	02/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	86.886.616,43	100.154.562,64
54 BIS 6° PROV	03/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.137.291,93	100.598.008,01
55 6° PROV.	04/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.387.967,43	101.041.453,38
56 6° PROV.	05/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.638.642,93	101.484.898,75

COPIA NO FEHACIENTE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Monjo
Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24° Distrito D.N.V.-T.D.F.

00510

ORIGINAL

113

FOLIO 3

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 24° DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
OBRAS DE CONTRATO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

Obra:	Malla N° 603	**Expediente Principal:**	0013023/2006
Provincia:	TIERRA DEL FUEGO	**Expediente Certificado:**	0020230/2012
Ruta:	RN. 0003	**Certificado N°:**	61 6° PROV.
		Decreto N°:	01295/2002

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Fecha de Licitación:	31 de enero de 2007	**Monto de Recuperación:**	$ 73.851.490,51
Fecha de Replanteo:	01 de noviembre de 2007	**Monto de Mantenimiento:**	$ 15.040.529,84
Fecha de Finalización de Recuperación:	01 de diciembre de 2010	**Monto del Contrato:**	$ 88.892.020,35
Fecha de Medición:	31 de octubre de 2012	**Avance Financiero a Origen:**	100,00 %
Plazo Vigente:	050 M 00 d		
Fecha de Finalización del Contrato:	01 de noviembre de 2012		

Certificado	Mes de Ejecuc.	PR2 Contrato	I. R.	PR2 Redeterm.	PR1 Contrato	Descuento PR1 a Contrato	PR1 Contrato c/Descuento	I. R.	PR1 Redeterm.	Monto Certificado	Monto Acumulado a Contrato	Monto Acumulado Redeterm.
57 6° PROV.	06/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.889.318,43	101.928.344,12
58 6° PROV.	07/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.139.993,93	102.371.789,49
59 6° PROV.	08/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.390.669,43	102.815.234,86
60 6° PROV.	09/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.641.344,93	103.258.680,23
61 6° PROV.	10/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.892.020,43	103.702.125,60
	11/2012	0,00			0,00							

COPIA NO NEGOCIABLE

Resumen Certificado

Monto Acumulado al presente Certificado:	$ 103.702.125,60
Monto Acumulado al Certificado Anterior:	$ 103.258.680,23
Monto Total Presente Certificado:	$ 443.445,37
A Deducir Certificado N°:	$ 0,00
Importe Presente Certificado 61 6° PROV.:	**$ 443.445,37**
A Deducir por Anticipo Financiero:	$ 0,00
A Deducir por Penalides:	$ 0,00
Descuento 5 % según condiciones de Contrato:	$ 22.172,27
Suma a Pagar por el presente Certificado:	**$ 421.273,10**

SON PESOS: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. Ing. Enrique Rey Morito Representante Técnico 05/11/12	Ing. Gustavo Cesar Conti Supervisor de Obra 24° Distrito D.N.V.-T.D.F.	Ing. Eleena Villegas Flores Jefe Int. División Obras 24° Dto. D.N.V. - T.D.F.
CONTRATISTA	INGENIERO	JEFE DIVISION OBRAS
Ing. Juan J. SOSA ZAMARBIDE Jefe 24° Distrito D.N.V. Tierra del Fuego		
JEFE DE DISTRITO	JEFE SEC. CERTIFICACIONES	JEFE DIV. MARCHA DE CONTRATOS

FECHA DE CONFORMIDAD: 05/11/2012

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000511

Dirección Nacional de Vialidad
Plan de Inversiones

Obra: Malla Nº 603 - Ruta RN. 0003

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Distrito Principal: TIERRA DEL FUEGO

Certificado Nº: 61 6º PROV.

Mes: octubre de 2012

Fecha de Replanteo: 01/11/2007

Plazo Original de Obra: 060 M 00 d

Monto Vigente: $ 103.702.569,30

Periodo	Previsto Mensual Pr2	Previsto Mensual Pr1	Previsto Mensual Total	Previsto Acumulado Total	Ejecutado Mensual Pr2	Ejecutado Mensual Pr1	Ejecutado Mensual Total	Ejecutado Acumulado Pr2	Ejecutado Acumulado Pr1	Ejecutado Acumulado Total	Adelanto o Atraso	
											En el Mes	Acumulado
oct 07	$ 1.477.029,81	$ 0,00	$ 1.477.029,81	$ 1.477.029,81	$ 1.477.029,81	$ 0,00	$ 1.477.029,81	$ 1.477.029,81	$ 0,00	$ 1.477.029,81	0,00 %	0,00 %
nov 07	$ 3.692.574,53	$ 250.675,50	$ 3.943.250,03	$ 5.420.279,84	$ 3.692.574,53	$ 250.675,50	$ 3.943.250,03	$ 5.169.604,34	$ 250.675,50	$ 5.420.279,84	0,00 %	0,00 %
dic 07	$ 1.063.461,46	$ 250.675,50	$ 1.314.136,96	$ 6.734.416,80	$ 1.063.461,46	$ 250.675,50	$ 1.314.136,96	$ 6.233.065,80	$ 501.351,00	$ 6.734.416,80	0,00 %	0,00 %
ene 08	$ 4.283.386,45	$ 250.675,50	$ 4.534.061,95	$ 11.268.478,75	$ 4.283.386,45	$ 250.675,50	$ 4.534.061,95	$ 10.516.452,25	$ 752.026,50	$ 11.268.478,75	0,00 %	0,00 %
feb 08	$ 5.021.901,35	$ 250.675,50	$ 5.272.576,85	$ 16.541.055,60	$ 5.021.901,35	$ 250.675,50	$ 5.272.576,85	$ 15.538.353,60	$ 1.002.702,00	$ 16.541.055,60	0,00 %	0,00 %
mar 08	$ 5.317.307,32	$ 250.675,50	$ 5.567.982,82	$ 22.109.038,42	$ 5.317.307,32	$ 250.675,50	$ 5.567.982,82	$ 20.855.660,92	$ 1.253.377,50	$ 22.109.038,42	0,00 %	0,00 %
abr 08	$ 5.935.103,61	$ 274.838,11	$ 6.209.941,72	$ 28.318.980,14	$ 5.935.157,75	$ 274.840,62	$ 6.209.998,37	$ 26.790.818,67	$ 1.528.218,12	$ 28.319.036,79	0,00 %	0,00 %
may 08	$ 3.886.561,71	$ 274.838,11	$ 4.161.399,82	$ 32.480.379,96	$ 3.886.597,16	$ 274.840,62	$ 4.161.437,78	$ 30.677.415,83	$ 1.803.058,74	$ 32.480.474,57	0,00 %	0,00 %
jun 08	$ 186.231,08	$ 274.838,11	$ 461.069,19	$ 32.941.449,15	$ 185.232,78	$ 274.840,62	$ 461.073,40	$ 30.863.648,61	$ 2.077.899,36	$ 32.941.547,97	0,00 %	0,00 %
jul 08	$ 0,00	$ 274.838,11	$ 274.838,11	$ 33.216.287,26	$ 0,00	$ 274.840,62	$ 274.840,62	$ 30.863.648,61	$ 2.352.739,98	$ 33.216.388,59	0,00 %	0,00 %
ago 08	$ 0,00	$ 274.838,11	$ 274.838,11	$ 33.491.125,37	$ 0,00	$ 274.840,62	$ 274.840,62	$ 30.863.648,61	$ 2.627.580,60	$ 33.491.229,21	0,00 %	0,00 %
sep 08	$ 0,00	$ 274.838,11	$ 274.838,11	$ 33.765.963,48	$ 0,00	$ 274.840,62	$ 274.840,62	$ 30.863.648,61	$ 2.902.421,22	$ 33.766.069,83	0,00 %	0,00 %
oct 08	$ 0,00	$ 274.838,11	$ 274.838,11	$ 34.040.801,59	$ 0,00	$ 274.840,62	$ 274.840,62	$ 30.863.648,61	$ 3.177.261,84	$ 34.040.910,45	0,00 %	0,00 %
nov 08	$ 2.129.511,94	$ 274.838,11	$ 2.404.350,05	$ 36.445.151,64	$ 2.129.531,36	$ 274.840,62	$ 2.404.371,98	$ 32.993.179,97	$ 3.452.102,46	$ 36.445.282,43	0,00 %	0,00 %
dic 08	$ 4.348.090,92	$ 274.838,11	$ 4.622.929,03	$ 41.068.080,67	$ 4.348.130,57	$ 274.840,62	$ 4.622.971,19	$ 37.341.310,54	$ 3.726.943,08	$ 41.068.253,62	0,00 %	0,00 %
ene 09	$ 4.671.971,06	$ 274.838,11	$ 4.946.809,17	$ 46.014.889,84	$ 4.672.013,67	$ 274.840,62	$ 4.946.854,29	$ 42.013.324,21	$ 4.001.783,70	$ 46.015.107,91	0,00 %	0,00 %
feb 09	$ 5.319.731,35	$ 274.838,11	$ 5.594.569,46	$ 51.609.459,30	$ 5.319.779,86	$ 274.840,62	$ 5.594.620,48	$ 47.333.104,07	$ 4.276.624,32	$ 51.609.728,39	0,00 %	0,00 %

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Morito
Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24º Distrito D.N.V.-T.D.F

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 24º DISTRITO

ORIGINAL

000512

114

Periodo	Previsto Mensual Pr2	Previsto Mensual Pr1	Previsto Mensual Total	Previsto Acumulado Total	Ejecutado Mensual Pr2	Ejecutado Mensual Pr1	Ejecutado Mensual Total	Ejecutado Acumulado Pr2	Ejecutado Acumulado Pr1	Ejecutado Acumulado Total	Adelan'	Atraso
											En el Mes	Acumulado
mar 09	$ 5.222.567,30	$ 274.838,11	$ 5.497.405,41	$ 57.106.864,71	$ 5.222.614,94	$ 274.840,62	$ 5.497.455,56	$ 52.555.719,01	$ 4.551.464,94	$ 57.107.183,95	0,00 %	0,00 %
abr 09	$ 1.684.176,74	$ 274.838,11	$ 1.959.014,85	$ 59.065.879,56	$ 1.684.192,10	$ 274.840,62	$ 1.959.032,72	$ 54.239.911,11	$ 4.826.305,56	$ 59.066.216,67	0,00 %	0,00 %
may 09	$ 1.618.576,60	$ 300.216,66	$ 1.918.793,26	$ 60.984.672,82	$ 1.618.532,09	$ 300.208,41	$ 1.918.740,50	$ 55.858.443,20	$ 5.126.513,97	$ 60.984.957,17	0,00 %	0,00 %
jun 09	$ 1.087.895,74	$ 300.216,66	$ 1.388.112,40	$ 62.372.785,22	$ 1.087.865,83	$ 300.208,41	$ 1.388.074,24	$ 56.946.309,03	$ 5.426.722,38	$ 62.373.031,41	0,00 %	0,00 %
jul 09	$ 0,00	$ 300.216,66	$ 300.216,66	$ 62.673.001,88	$ 0,00	$ 300.208,41	$ 300.208,41	$ 56.946.309,03	$ 5.726.930,79	$ 62.673.239,82	0,00 %	0,00 %
ago 09	$ 0,00	$ 300.216,66	$ 300.216,66	$ 62.973.218,54	$ 0,00	$ 300.208,41	$ 300.208,41	$ 56.946.309,03	$ 6.027.139,20	$ 62.973.448,23	0,00 %	0,00 %
sep 09	$ 0,00	$ 300.216,66	$ 300.216,66	$ 63.273.435,20	$ 0,00	$ 300.208,41	$ 300.208,41	$ 56.946.309,03	$ 6.327.347,61	$ 63.273.656,64	0,00 %	0,00 %
oct 09	$ 0,00	$ 300.216,66	$ 300.216,66	$ 63.573.651,86	$ 0,00	$ 300.208,41	$ 300.208,41	$ 56.946.309,03	$ 6.627.556,02	$ 63.573.865,05	0,00 %	0,00 %
nov 09	$ 2.189.739,42	$ 300.216,66	$ 2.489.956,08	$ 66.063.607,94	$ 2.189.679,20	$ 300.208,41	$ 2.489.887,61	$ 59.135.988,23	$ 6.927.764,43	$ 66.063.752,66	0,00 %	0,00 %
dic 09	$ 3.628.209,39	$ 300.216,66	$ 3.928.426,05	$ 69.992.033,99	$ 3.628.109,50	$ 300.208,41	$ 3.928.317,91	$ 62.764.097,73	$ 7.227.972,84	$ 69.992.070,57	0,00 %	0,00 %
ene 10	$ 6.274.305,77	$ 332.477,94	$ 6.606.783,71	$ 76.598.817,70	$ 6.274.359,85	$ 332.480,81	$ 6.606.840,66	$ 69.038.457,58	$ 7.560.453,65	$ 76.598.911,23	0,00 %	0,00 %
feb 10	$ 4.801.674,27	$ 332.477,94	$ 5.134.152,21	$ 81.732.969,91	$ 4.801.715,66	$ 332.480,81	$ 5.134.196,47	$ 73.840.173,24	$ 7.892.934,46	$ 81.733.107,70	0,00 %	0,00 %
mar 10	$ 4.680.571,78	$ 332.477,94	$ 5.013.049,72	$ 86.746.019,63	$ 4.680.612,12	$ 332.480,81	$ 5.013.092,93	$ 78.520.785,36	$ 8.225.415,27	$ 86.746.200,63	0,00 %	0,00 %
abr 10	$ 4.151.641,31	$ 332.477,95	$ 4.484.119,26	$ 91.230.138,89	$ 4.151.677,09	$ 332.480,81	$ 4.484.157,90	$ 82.672.462,45	$ 8.557.896,08	$ 91.230.358,53	0,00 %	0,00 %
may 10	$ 249.881,20	$ 332.477,95	$ 582.359,15	$ 91.812.498,04	$ 249.883,35	$ 332.480,81	$ 582.364,16	$ 82.922.345,80	$ 8.890.376,89	$ 91.812.722,69	0,00 %	0,00 %
jun 10	$ 0,00	$ 332.477,95	$ 332.477,95	$ 92.144.975,99	$ 0,00	$ 332.480,81	$ 332.480,81	$ 82.922.345,80	$ 9.222.857,70	$ 92.145.203,50	0,00 %	0,00 %
jul 10	$ 0,00	$ 332.477,95	$ 332.477,95	$ 92.477.453,94	$ 0,00	$ 332.480,81	$ 332.480,81	$ 82.922.345,80	$ 9.555.338,51	$ 92.477.684,31	0,00 %	0,00 %
ago 10	$ 0,00	$ 332.477,95	$ 332.477,95	$ 92.809.931,89	$ 0,00	$ 332.480,81	$ 332.480,81	$ 82.922.345,80	$ 9.887.819,32	$ 92.810.165,12	0,00 %	0,00 %
sep 10	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 93.172.811,62	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 82.922.345,80	$ 10.250.699,05	$ 93.173.044,85	0,00 %	0,00 %
oct 10	$ 166.991,96	$ 362.879,73	$ 529.871,69	$ 93.702.683,31	$ 166.991,96	$ 362.879,73	$ 529.871,69	$ 83.089.337,76	$ 10.613.578,78	$ 93.702.916,54	0,00 %	0,00 %
nov 10	$ 166.991,95	$ 362.879,73	$ 529.871,68	$ 94.232.554,99	$ 166.991,95	$ 362.879,73	$ 529.871,68	$ 83.256.329,71	$ 10.976.458,51	$ 94.232.788,22	0,00 %	0,00 %
dic 10	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 94.595.434,72	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 83.256.329,71	$ 11.339.338,24	$ 94.595.667,95	0,00 %	0,00 %
ene 11	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 94.958.314,45	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 83.256.329,71	$ 11.702.217,97	$ 94.958.547,68	0,00 %	0,00 %
feb 11	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 95.321.194,18	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 83.256.329,71	$ 12.065.097,70	$ 95.321.427,41	0,00 %	0,00 %
mar 11	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 95.684.073,91	$ 0,00	$ 362.879,73	$ 362.879,73	$ 83.256.329,71	$ 12.427.977,43	$ 95.684.307,14	0,00 %	0,00 %
abr 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 96.082.225,55	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 12.826.129,07	$ 96.082.458,78	0,00 %	0,00 %
may 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 96.480.377,19	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 13.224.280,71	$ 96.480.610,42	0,00 %	0,00 %

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Morito
Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24º Distrito D.N.V.-T.D.F.

ESCRIBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA

Hoja 2

ORIGINAL

00513

1/5

Período	Previsto Mensual Pr2	Previsto Mensual Pr1	Previsto Mensual Total	Previsto Acumulado Total	Ejecutado Mensual Pr2	Ejecutado Mensual Pr1	Ejecutado Mensual Total	Ejecutado Acumulado Pr2	Ejecutado Acumulado Pr1	Ejecutado Acumulado Total	Adelar / Atraso	
											En el Mes	Acumulado
jun 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 96.878.528,83	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 13.622.432,35	$ 96.878.762,06	0,00 %	0,00 %
jul 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 97.276.680,47	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 14.020.583,99	$ 97.276.913,70	0,00 %	0,00 %
ago 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 97.674.832,11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 14.418.735,63	$ 97.675.065,34	0,00 %	0,00 %
sep 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 98.072.983,75	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 14.816.887,27	$ 98.073.216,98	0,00 %	0,00 %
oct 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 98.471.135,39	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 15.215.038,91	$ 98.471.368,62	0,00 %	0,00 %
nov 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 98.869.287,03	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 15.613.190,55	$ 98.869.520,26	0,00 %	0,00 %
dic 11	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 99.267.438,67	$ 0,00	$ 398.151,64	$ 398.151,64	$ 83.256.329,71	$ 16.011.342,19	$ 99.267.671,90	0,00 %	0,00 %
ene 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 99.710.884,04	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 16.454.787,56	$ 99.711.117,27	0,00 %	0,00 %
feb 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 100.154.329,41	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 16.898.232,93	$ 100.154.562,64	0,00 %	0,00 %
mar 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 100.597.774,78	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 17.341.678,30	$ 100.598.008,01	0,00 %	0,00 %
abr 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 101.041.220,15	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 17.785.123,67	$ 101.041.453,38	0,00 %	0,00 %
may 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 101.484.665,52	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 18.228.569,04	$ 101.484.898,75	0,00 %	0,00 %
jun 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 101.928.110,89	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 18.672.014,41	$ 101.928.344,12	0,00 %	0,00 %
jul 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 102.371.556,26	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 19.115.459,78	$ 102.371.789,49	0,00 %	0,00 %
ago 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 102.815.001,63	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 19.558.905,15	$ 102.815.234,86	0,00 %	0,00 %
sep 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 103.258.447,00	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 20.002.350,52	$ 103.258.680,23	0,00 %	0,00 %
oct 12	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 103.701.892,37	$ 0,00	$ 443.445,37	$ 443.445,37	$ 83.256.329,71	$ 20.445.795,89	$ 103.702.125,60	0,00 %	0,00 %

ORIGINAL

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Morito
Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Dom
Supervisor de Obra
24º Distrito D.N.V.-T.D.F

DIRECCION NACIONAL DE VIVIENDA
24º DISTRITO
FOLIO

000514

116

Dirección Nacional de Vialidad
Curva de Avance a valores de contrato según Resol./Disp. 01933

Obra: Malla Nº 603 - RN. 0003

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Distrito Principal: TIERRA DEL FUEGO

Mes: octubre de 2012

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA

Fecha de Replanteo: 01/11/2007

Plazo de Obra: 060 M 00 d

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

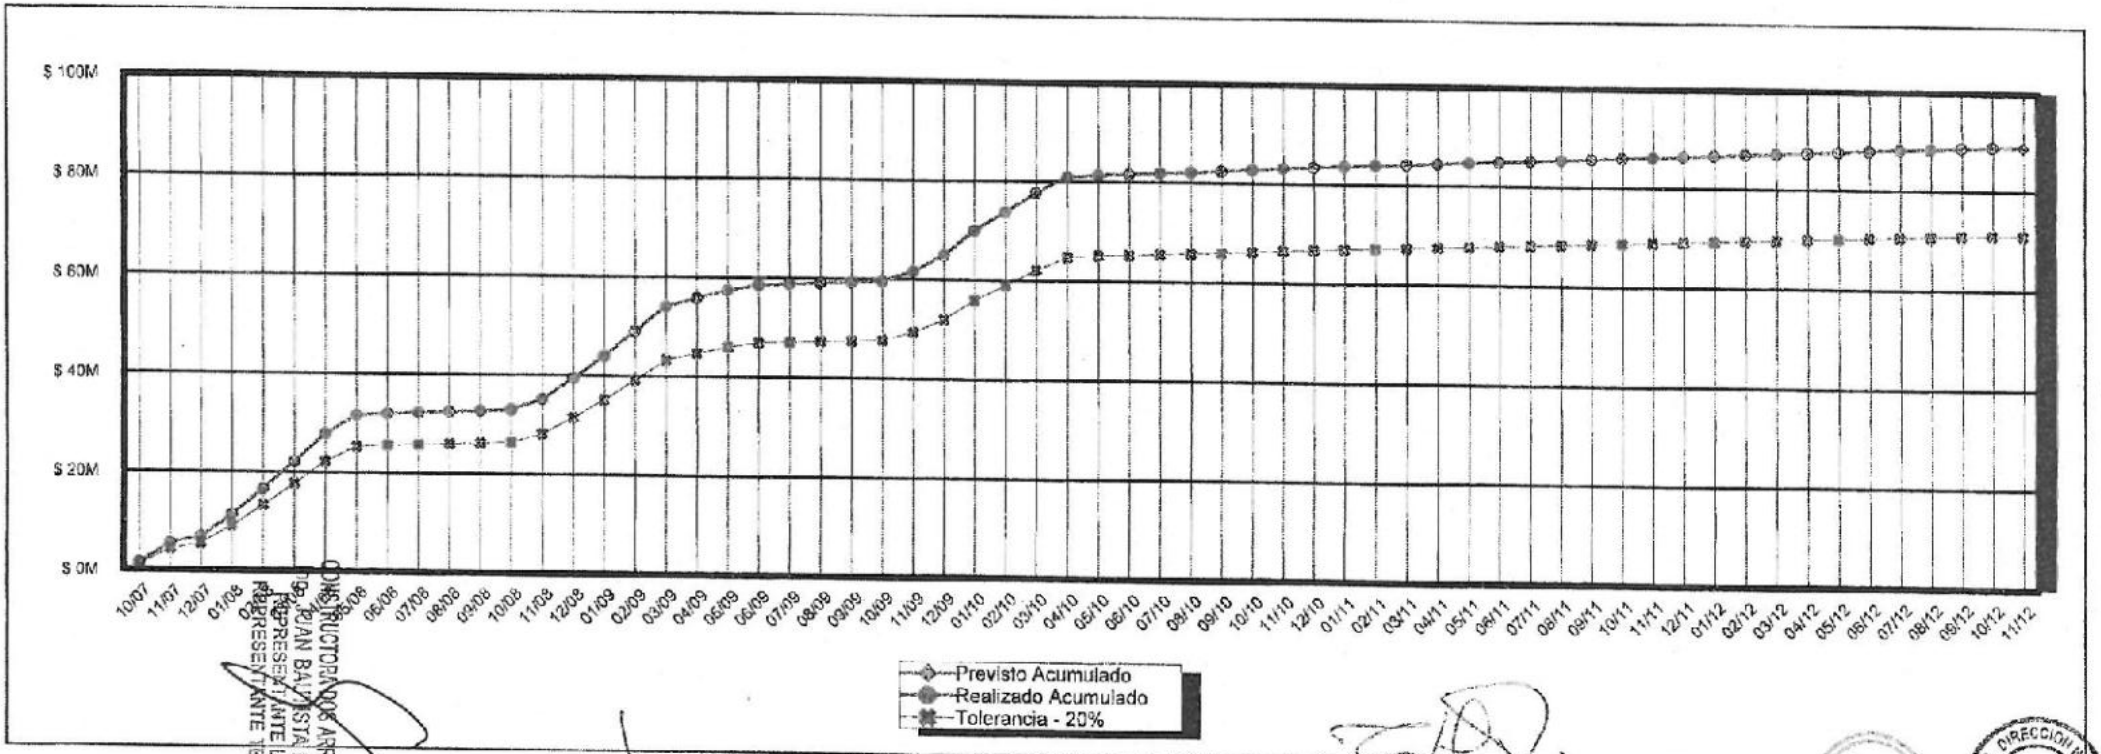

02 de noviembre de 2012

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Monto
Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24º Distrito D.N.V.-T.D.F.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
2º DISTRITO

ORIGINAL

080515

1/2

Dirección Nacional de Vialidad
Curva de Inversiones Previstas y Ejecutadas

Obra: Malla N° 603 - Ruta RN. 0003

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Distrito Principal: TIERRA DEL FUEGO

Certificado N°: 61 6° PROV.

Mes: octubre de 2012 .

Fecha de Replanteo: 01/11/2007

Plazo Original de Obra: 060 M 00 d

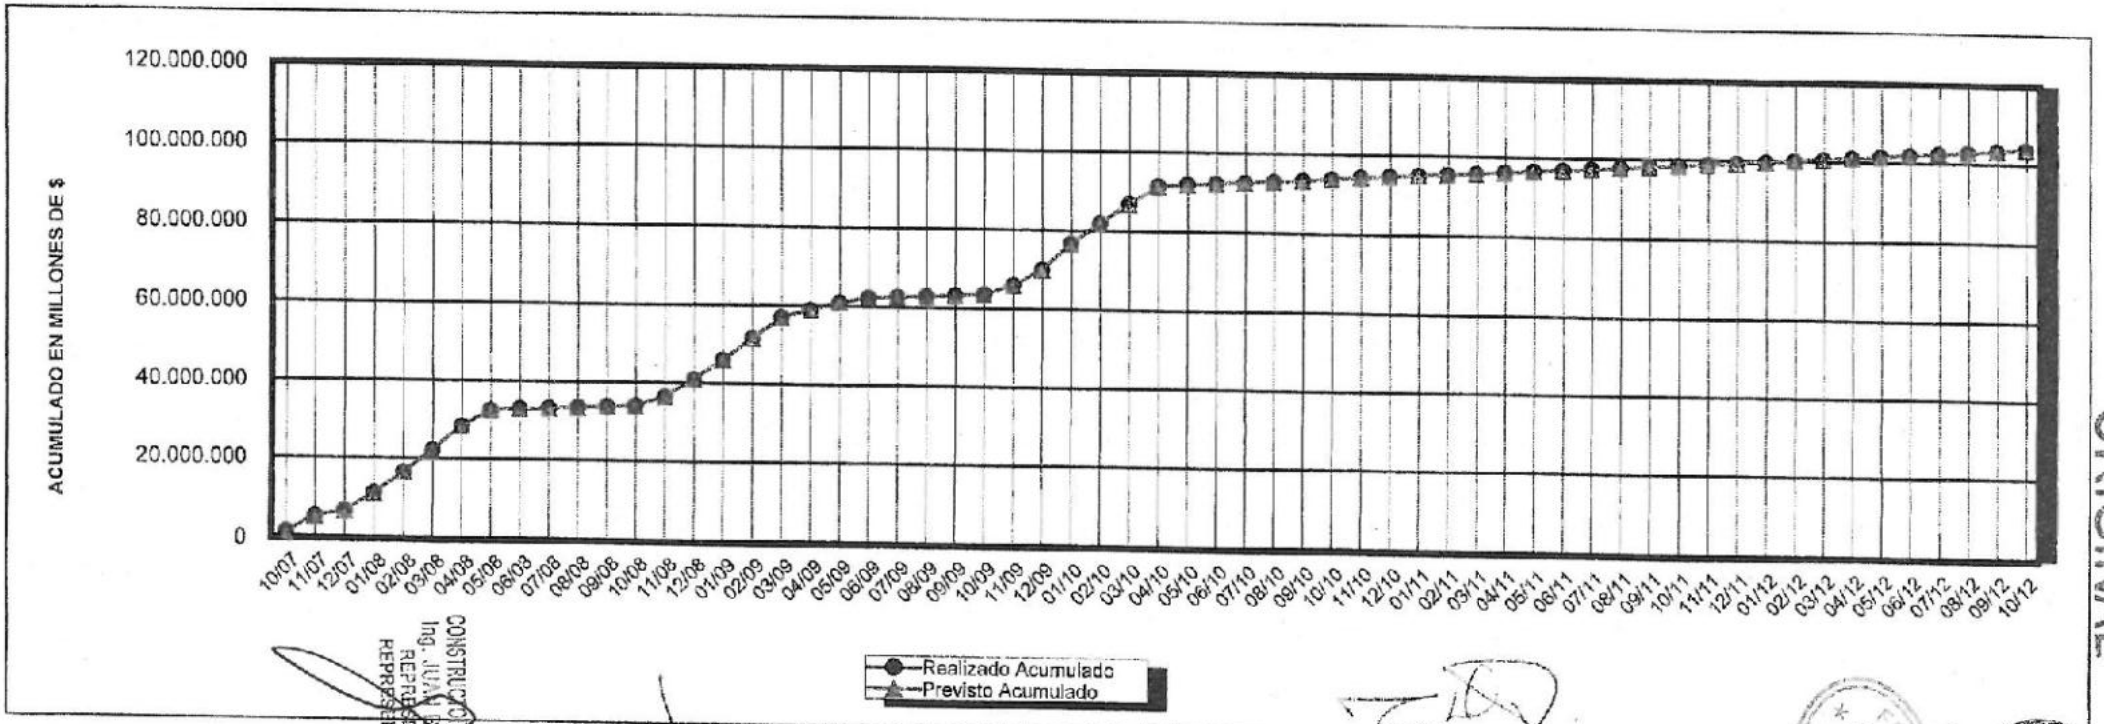

05 de noviembre de 2012

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Monto
Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24º Distrito D.N.V.-T.D.F.

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
DISTRITO
FOLIO

ORIGINAL

095516

1/2

ORIGINAL

119

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD FOLIO 10 24° DISTRITO

"2012-Año de Homenaje al Doctor D. MANUEL BELGRANO"

Vialidad Nacional

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO

OBRA: Sistema C.Re.Ma - MALLA N° 603
Provincia: Tierra del Fuego
Ruta Nacional N° 3
Tramo: San Sebastian - Tolhuin
Sección: Km. 2766,83 - Km. 2949,94
Sección 1 : Km 2766,83 - Km 2790,70
2: Km. 2790,70 - Km. 2829,83
3: Km. 2829,83 - Km. 2836,83
4: Km. 2836,83 - Km. 2849,95
5: Km. 2849,95 - Km. 2854,08
6: Km. 2854,08 - Km. 2881,67
7: Km. 2881,67 - Km. 2916,19
8: Km. 2916,19 - Km. 2949,94
Expediente Principal N° 13023 - L - 2006
Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.
Licitación Pública N° 140/06
Fecha de Licitación: 31/01/2007
Fecha de Firma de Contrato: 23/07/2007
Fecha de Replanteo: 01/11/2007
Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias: 37 Meses
Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2): 30/11/2010
Fecha de Terminación Efectiva de los Trabajos de Recuperación: 30/11/2010
Plazo Total del Contrato Incluido trabajos de Mantenimiento: 60 Meses
Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012
Monto de Contrato: $ 88.892.020,35 (PR 1: $ 15.040.529,84 PR 2: $ 73.851.490,51)
Monto 1° Adecuación Provisoria: $ 95.329.899,81 (PR 1: $ 16.369.611,33 PR 2: $ 78.960.288,48)
Monto 2° Adecuación Provisoria: $ 98.677.038,02 (PR 1: $ 17.435.058,71 PR 2: $ 81.241.979,31)
Monto 3° Adecuación Provisoria: $ 101.760.671,81 (PR 1: $ 18.532.320,26 PR 2: $ 83.228.351,55)
Monto 4° Adecuación Provisoria: $ 102.579.360,69 (PR 1: $ 19.322.761,99 PR 2: $ 83.256.598,70)
Monto 5° Adecuación Provisoria: $ 103.249.572,17 (PR 1: $ 19.992.923,64 PR 2: $ 83.256.648,53)
Monto 6° Adecuación Provisoria: $ 103.702.569,30 (PR 1: $ 20.445.920,77 PR 2: $ 83.256.648,53)

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012
Importe presente Certificado: $ 443.445,37

Monto Total del Contrato a Valores de 6° Adecuación	Total Certificación Acumulada a Valores 6° Adecuación	Certificación Acumulada a Valores 6° Adecuación
$ 103.702.569,30	$ 103.702.125,61	100,00%

A) OBRAS DE RECUPERACION E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS

PR 2 Total	Certificado Acumulado	Porcentaje
$ 83.256.648,53	$ 83.256.329,72	100,00%

B) MANTENIMIENTO DE RUTINA

PR 1	Certificado Acumulado	Porcentaje
$ 20.445.920,77	$ 20.445.795,89	100,00%

C) PLAZO DEL CONTRATO

Plazo Total del Contrato	Plazo Transcurrido	Porcentaje
60 Meses	60 Meses	100,00%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Morito
Representante Técnico
Contratista

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24° Distrito D.N.V.-T.D.F.
Ingeniero

Ing. Juan J. SOSA ZAMARBIDE
Jefe 24° Distrito D.N.V.
Tierra del Fuego
Jefe de Distrito

Jefe Div. Marcha de Contratos

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Sub Gerente Obras y Concesiones

Gerente de Obras y Servicios Viales

000517

ORIGINAL

1120

"2012-Año de Homenaje al Doctor D. MANUEL BELGRANO"

Vialidad Nacional

INFORME DEL INGENIERO

OBRA: Sistema C.Re.Ma - MALLA N° 603
Provincia: Tierra del Fuego
Ruta Nacional N° 3
Tramo: San Sebastian - Tolhuin
Sección: Km. 2786,83 - Km. 2949,94
Expediente Principal N° 13023 - L - 2006
Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.
Licitación Pública N° 140/06
Fecha de Licitación: 31/01/2007
Fecha de Firma de Contrato: 23/07/2007
Fecha de Replanteo: 01/11/2007
Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias: 37 Meses
Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2): 30/11/2010
Plazo Total del Contrato incluido trabajos de Mantenimiento: 60 Meses
Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012
Monto de Contrato: $ 88.892.020,35 (PR 1: $ 15.040.529,84 PR 2: $ 73.851.490,51)
Monto 1° Adecuación Provisoria: $ 95.329.899,81 (PR 1: $ 16.369.611,33 PR 2: $ 78.960.288,48)
Monto 2° Adecuación Provisoria: $ 96.677.038,02 (PR 1: $ 17.435.058,71 PR 2: $ 81.241.979,31)
Monto 3° Adecuación Provisoria: $ 101.760.671,81 (PR 1: $ 18.532.320,26 PR 2: $ 83.228.351,55)
Monto 4° Adecuación Provisoria: $ 102.579.360,89 (PR 1: $ 19.322.761,99 PR 2: $ 83.256.598,70)
Monto 5° Adecuación Provisoria: $ 103.249.572,17 (PR 1: $ 19.992.923,64 PR 2: $ 83.256.648,53)
Monto 6° Adecuación Provisoria: $ 103.702.569,30 (PR 1: $ 20.445.920,77 PR 2: $ 83.256.648,53)

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012
Importe presente Certificado: $ 443.445,37

Certificado correspondiente a: Obras de Mantenimiento de Rutina - Conservación: **OCTUBRE 2012**

ITEMS	*SECCION*	*PROGRESIVAS*
Bacheo superficial	S1; S2; S3; S6; S7 y S8.-	
Sellado de fisuras	S4; S5; S6; S7 y S8.-	
Reposición Señalamiento vertical	S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7 y S8.-	
Perfilado de banquinas	S2; S3; S4; S5; S6; S7 y S8.-	
Mantenimiento de desagües en general	S1; S2; S4; S5; S6; S7 y S8.-	

Se adjunta a la presente informes semanales, correspondientes a las tareas de Mantenimiento de Rutina.-

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24° Distrito D.N.V.-T.D.F.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000518

ORIGINAL

121

"2012 Año de Homenaje al Doctor D. MANUEL BELGRANO"

FOLIO

Vialidad Nacional

OBRA: Sistema C.Re.Mo - MALLA N° 503
Provincia: Tierra del Fuego
Ruta Nacional N° 3
Tramo: San Sebastián - Tolhuin
Sección: Km. 2768,83 - Km. 2890,94
Sección 1: Km 2768,83 - Km 2780,70
2: Km. 2780,70 - Km. 2829,83
3: Km. 2829,83 - Km. 2836,83
4: Km. 2836,83 - Km. 2848,36
5: Km. 2848,86 - Km. 2854,08
6: Km. 2854,08 - Km. 2881,67
7: Km. 2881,67 - Km. 2915,19
8: Km. 2915,19 - Km. 2949,94
Expediente Principal N° 13023 - L - 2006
Contratista: Construcciones Dos Arroyos S.A.
Licitación Pública N° 140/06
Fecha de Licitación: 31/01/2007
Fecha de Firma de Contrato: 23/07/2007
Fecha de Replanteo: 01/11/2007
Plazo de las Obras de Recuperación o Intervenciones Obligatorias: 37 Meses
Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación o Intervenciones Obligatorias (PR2): 30/11/2010
Fecha de Terminación Efectiva de los Trabajos de Recuperación: 30/11/2010
Plazo Total del Contrato Incluido Trabajos de Mantenimiento: 60 Meses
Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012
Monto de Contrato: $ 88.892.020,35 (PR 1: $ 15.040.529,84 PR 2: $ 73.851.490,51)
Monto 1° Adecuación Provisoria: $ 95.526.899,81 (PR 1: $ 16.369.811,33 PR 2: $ 79.980.186,48)
Monto 2° Adecuación Provisoria: $ 98.677.036,02 (PR 1: $ 17.435.056,21 PR 2: $ 81.241.979,81)
Monto 3° Adecuación Provisoria: $ 101.750.671,81 (PR 1: $ 18.522.320,26 PR 2: $ 83.228.351,55)
Monto 4° Adecuación Provisoria: $ 102.579.360,69 (PR 1: $ 19.322.761,99 PR 2: $ 83.256.595,70)
Monto 5° Adecuación Provisoria: $ 103.249.572,17 (PR 1: $ 19.992.923,64 PR 2: $ 83.256.648,53)
Monto 6° Adecuación Provisoria: $ 103.709.509,30 (PR 1: $ 20.445.920,77 PR 2: $ 83.263.648,53)

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012

PLANILLA DE CALCULO DE LA CUOTA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE RUTINA

	A VALORES BASICOS	A VALORES DE 1° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 2° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 3° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 4° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 5° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 6° ADECUACION PROVISORIA
MONTO DEL CONTRATO	$ 88.892.020,35	$ 95.526.899,81	$ 98.677.036,02	$ 101.750.671,81	$ 102.579.360,69	$ 103.249.572,17	$ 103.709.509,30
PRECIO CERTIFICABLE DE MANTENIMIENTO DE RUTINA (PR1)	$ 15.040.529,84	$ 16.369.811,33	$ 17.435.056,21	$ 18.522.320,26	$ 19.322.761,99	$ 19.992.923,64	$ 20.445.920,77
MONTO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL DE MANT. DE RUTINA	$ 250.875,50	$ 274.838,11	$ 300.216,66	$ 332.477,85	$ 353.879,73	$ 395.161,84	$ 443.445,37
LONGITUD DE LA MALLA (KM.)	176,88						

VALORES CONSTANTES					PRESENTE CERTIFICADO				
RUTA	SECCION	LONG.	PROPORCIONAL MENSUAL DE PR1 POR SECCION	IMPORTE SEMANAL PR1 POR SECCION	IMPORTES SEMANALES A CERTIFICAR				IMPORTE TOTAL POR SECCION
					SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
3	SECCION 1	23,87	$ 59.140,92	$ 14.785,23	$ 14.785,23	$ 14.785,23	$ 14.785,23	$ 14.785,23	$ 59.140,92
	SECCION 2	39,13	$ 96.949,46	$ 24.237,37	$ 24.237,37	$ 24.237,37	$ 24.237,37	$ 24.237,37	$ 96.949,46
	SECCION 3	7,00	$ 17.343,36	$ 4.335,84	$ 4.335,84	$ 4.335,84	$ 4.335,84	$ 4.335,84	$ 17.343,36
	SECCION 4	8,99	$ 22.273,85	$ 5.568,46	$ 5.568,46	$ 5.568,46	$ 5.568,46	$ 5.568,46	$ 22.273,85
	SECCION 5	4,13	$ 10.232,59	$ 2.558,15	$ 2.558,15	$ 2.558,15	$ 2.558,15	$ 2.558,15	$ 10.232,59
	SECCION 6	27,59	$ 68.357,68	$ 17.089,42	$ 17.089,42	$ 17.089,42	$ 17.089,42	$ 17.089,42	$ 68.357,68
	SECCION 7	34,52	$ 85.527,62	$ 21.381,91	$ 21.381,91	$ 21.381,91	$ 21.381,91	$ 21.381,91	$ 85.527,62
	SECCION 8	33,75	$ 83.619,85	$ 20.904,96	$ 20.904,96	$ 20.904,96	$ 20.904,96	$ 20.904,96	$ 83.619,85
					TOTAL A CERTIFICAR MANTENIMIENTO DE RUTINA, PRESENTE CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012				$ 443.445,37

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Monto
Representante Técnico
05/11/12

CONTRATISTA (FIRMA Y FECHA)

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obra
24° Distrito D.N.V.-T.D.F.

SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000519

ORIGINAL

CERTIFICADO DE OBRAS EJECUTADAS

El funcionario que suscribe Certifica que la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio en la calle 3 de Febrero 2750, Piso 4º, se encuentre ejecutando para esta Dirección Nacional de Vialidad la obra: Expediente 13023-L-2006. Obra: Sistema C.RE.MA: - Malla 603. Ruta Nacional Nº 3. Tramo: San Sebastián – Tolhuin. Sección: Km. 2.766,83 – Km. 2.949,94. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tipo de obra: Recuperación y Mantenimiento. Pavimentación en concreto asfáltico, alcantarillas y puentes con iluminación en zona de casilla de pesaje: longitud total: 178,98 km; Obras de recuperación: Sellado de fisuras tipo puente: 108.157,50 m; Bacheo con mezcla asfáltica: 2.672,15 m3; Base asfáltica en 0,10 m de esp. 80.089,74 m2; Carpeta asfáltica en 0,05 m de esp: 538.289,00; Carpeta asfáltica en 0,06 m de esp: 311.632,70; Riego de Imprimación: 81.943,38; Riego de liga: 928.592,20 m2; Excavación para zanjas de desagüe: 350,00 m3; Terraplenes con compactación especial: 86.400,00 m3; Terraplenes con compactación común: 300 m3; Construcción de subbase drenante: 35.466,29 m3; Construcción de base anticongelante: 17.156,34 m3. Provisión y colocación de baranda metálica de defensa: 20.550,00 m; Construcción de banquinas enripiadas: 89.142,48 m3; Construcción de alcantarillas de chapa D= 1,00 m: 150,00 m; Construcción de gaviones: 600,00 m3; Hormigón H-17: 98,50 m3; Hormigón H-21 incluido armadura: 200,00 m3; Construcción de alcantarillas laterales: 178,00 m3; Reacondicionamiento de obras de arte: 95 m3; Señalamiento horizontal: 49.400 m2; Reposición y mantenimiento de señales verticales: 140 m2. Construcción de dársena, balanza y oficina para puesto fijo de control de cargas. Reparaciones varias en Puentes. Obras de Mantenimiento: Sellado de fisuras tipo puente: 423.360 m; Bacheo con mezcla asfáltica: 2.556,00 m3.

Fecha de Inicio: 01/11/2007
Avance de obra: Recuperación 100% - Mantenimiento: 95,00%. Certificación: 99,44%.

Monto del Contrato: $ 73.855.112,16 (Recuperación) + $ 15.036908,19 (Mantenimiento). Total: $ 88.892.020,35 (Base Ene-2007)
Monto Total Certificado al 31/08/2012: $ 102.815.234,86 (S/6º Adecuación provisoria Abr-11)

Conceptos de la Empresa: muy bueno
Equipos y rodados: muy bueno.
Cumplimiento de plazo: en término
Capacidad Técnica: muy buena

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 10 días del mes de Octubre de 2012 se extiende el presente certificado a efectos de ser presentado ante quién corresponda.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. CIVIL RICARDO O. MARIONE
A/C SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

00520

ORIGINAL

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni "

DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS
TIMBRE DE LEY $ 108
COMITE CONVENCIONAL DE PAPEL SELLADO
SALTA, 13/12/2004
FIRMA: SILVIA T. DE SAGANIAS
SUPERV. TÉC. LIQUIDADOR
SUPERVISOR CAP. FED.
D.G.R. - SALTA

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04

---- Entre el señor ADMINISTRADOR GENERAL de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ing. Nelson Guillermo PERIOTTI, por una parte y la Firma: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., con domicilio legal en calle Amenabar 1247, 1° Piso, Buenos Aires, por la otra, a quien en adelante se designará con la palabra "Contratista" y representada en este Acto por el Ing. Juan Bautista PACELLA, en virtud del Poder General Amplio, conferido a su favor, pasado al folio 233 del Registro 1286 a cargo de la Escribana Silvia CASCO, se ha convenido celebrar el presente:----------

---------- C O N T R A T O ----------

ARTICULO 1°.- El Contratista se compromete a ejecutar las obras en dieciocho (18) meses, en un todo de acuerdo con las Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales, Addendas N° 1, N° 2 y N° 3, y demás Documentos de la Licitación, que ha estudiado y aceptado al presentar su Oferta a la Licitación Pública N° 75/04, Obra: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.) CORREDOR EJE CAPRICORNIO en la PROVINCIA DE SALTA – RUTA NACIONAL N° 81, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 – LIMITE CON FORMOSA, SECCION VI: LOS BLANCOS – LIMITE CON FORMOSA, efectuada el día 12 de Noviembre de 2004.----------

ARTICULO 2°.- Todos los documentos mencionados en el artículo 1° forman parte integrante del presente contrato, a cuyos efectos y en prueba de conformidad los firman ambas partes.----------

ARTICULO 3°.- Las obras objeto de este contrato, aplicando los precios unitarios cotizados en el Formulario de Presupuesto de la Oferta, importan la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 27.776.885,41), de acuerdo al siguiente detalle:----------

ITEM Nº	DESIGNACIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO ($)	PARCIAL ($)
	OBRAS A EJECUTAR					
1	Desbosque, destronque y limpieza del terreno	Ha	75,00	Dos mil seiscientos veintiocho pesos con ochenta y siete ctvos	2.628,87	197.165,25
2	Terraplenes				A fs. 2.....	197.165,25

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

00521

ORIGINAL

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

" 2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni "

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04
HOJA Nº2

ITEM Nº	DESIGNACION	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO ($)	PARCIAL ($)
					De fs. 1...	197.165,25
a)	Con compactación especial	m^3	462.625,00	Quince pesos con cincuenta ctvos.	15,50	7.170.687,50
b)	Sin compactación especial	m^3	1.549,00	Diez pesos con setenta y seis ctvos.	10,76	16.667,24
c)	Sin compactación especial para recubrimiento de taludes	m^3	22.568,00	Doce pesos con treinta ctvos	12,30	277.586,40
3	Recubrimiento con suelo seleccionado	m^3	51.851,18	Veintisiete pesos con cincuenta y tres ctvos.	27,53	1.427.462,99
4	Construcción de base granular	m^3	34.678,58	Doscientos nueve pesos con treinta y cinco ctvos.	209,35	7.259.960,72
5	Materiales bituminosos para riego					
a)	De imprimación con E.M-1	m^2	231.190,51	Dos pesos con setenta y nueve ctvos.	2,79	645.021,52
b)	De liga con E.R.-1	m^2	218.165,69	Un peso con veintinueve ctvos.	1,29	281.433,74
6	Ejecución de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05 m. de espesor	m^2	218.165,69	Treinta y un pesos con treinta y dos ctvos.	31,32	6.832.949,41
7	Excavación no clasificada para badenes	m^3	2.520,00	Trece pesos con sesenta y cuatro ctvos.	13,64	34.372,80
8	Excavación para fundaciones de alcantarillas	m^3	316,00	Treinta y cinco pesos con setenta y siete ctvos.	35,77	11.303,32
					A fs.3.....	24.154.610,89

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

00522

ORIGINAL

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

" 2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni "

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04
HOJA Nº3

ITEM Nº	DESIGNACION	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO ($)	PARCIAL ($)
					De fs. 2...	24.154.610,89
9	Hormigón de piedra armado, clase "H-21", excluida la armadura	m^3	127,90	Novecientos cincuenta y siete pesos con sesenta y dos ctvos.	957,62	122.479,60
10	Hormigón de piedra clase "H-13"	m^3	527,80	Quinientos diecinueve pesos con veintinueve ctvos.	519,29	274.081,26
11	Acero especial en barras ADN-420, colocado	Tn	6,10	Cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos con ochenta y seis ctvos	4.389,86	26.778,15
12	Acero laminado, colocado	Tn	4,90	Ocho mil setecientos ocho pesos con veintinueve ctvos.	8.708,29	42.670,62
13	Provisión y colocación de caños de chapa ondulada de hierro galvanizado, tipo helicoidal, según plano H-10209					
a)	De∅=1,00m.,e=1,6mm	m	144,00	Cuatrocientos nueve pesos	409,00	58.896,00
b)	De∅=0,90m.,e=1,6mm	m	128,00	Trescientos setenta y nueve pesos con cuarenta y cuatro ctvos.	379,44	48.568,32
c)	De∅=0,80m.,e=1,6mm	m	209,00	Trescientos veinte pesos con setenta y un ctvos.	320,71	67.028,39
					A fs. 4.....	24.795.113,23

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

00523

FELISCO TERAN
PERITO CALIGRAFO
MAT. Nº 4903
ORIGINAL

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

" 2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni "

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04
HOJA Nº4

ITEM Nº	DESIGNACION	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO ($)	PARCIAL ($)
					De fs. 3...	24.795.113,23
14	Baranda metálica cincada para defensa, según plano H-10237, tipo "A", con postes metálicos pesados conformados en frío y alas terminales comunes, colocada	m	1.935,48	Ciento sesenta pesos con cuarenta y dos ctvos.	160,42	310.489,70
15	Construcción de alambrados según plano H-2840-I tipo "D", incluido materiales, colocado	m	62.022,00	Quince pesos con veintiséis ctvos.	15,26	946.455,72
16	Tranqueras según plano J-5084, tipo "B", colocadas	Nº	7,00	Un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con setenta y ocho ctvos.	1.498,78	10.491,46
17	Retiro de alambrados	m	25.072,00	Tres pesos con cincuenta y dos ctvos.	3,52	88.253,44
18	Cordón de hormigón de piedra clase "H-13" de 0,15mx 0,30m para protección del borde del pavimento	m	368,00	Treinta y un pesos con cincuenta y nueve ctvos.	31,59	11.625,12
19	Movilidad para el personal de Supervisión					
a)	Cuota mensual	mes	36,00	Cinco mil doscientos setenta y siete pesos con treinta y ocho ctvos.	5.277,38	189.985,68
b)	Adicional por Km.	Km	108.000,00	Ochenta y tres ctvos.	0,83	89.640,00
					A fs. 5.....	26.442.054,35

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

Ing. NESTOR GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000524

Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

ORIGINAL

" 2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni "

EXPEDIENTE N° 1210-L-04
HOJA N°5

ITEM N°	DESIGNACION	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO ($)	PARCIAL ($)
					De fs. 4...	26.442.054,35
20	Provisión de vivienda para el personal de Supervisión	mes	18,00	Tres mil cuarenta y seis pesos con diecisiete ctvos.	3.046,17	54.831,06
21	Movilización de obra	Gl	1,00	Un millón doscientos ochenta mil pesos	1.280.000,00	1.280.000,00
					TOTAL:	**27.776.885,41**

ARTICULO 4°.- Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el Contratista ha entregado la Póliza de Seguro de Caución N° 18.708 otorgada por "FIANZAS Y CREDITO S.A.", por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 1.388.444,27), importe que cubre el cinco por ciento (5 %) del monto de este contrato.----------

ARTICULO 5°.- En prueba de conformidad con lo establecido en los artículos del presente contrato, ambas partes lo firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil cinco.----------

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000525

128

ORIGINAL

Vialidad Nacional

5° Distrito - Salta

LICITACION PUBLICA Nº 75/04
EXPEDIENTE Nº 1210-L-2004

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 81 - PROVINCIA DE SALTA
TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº 34 – LTE. C/FORMOSA
SECCION VI: LOS BLANCOS – LTE. C/FORMOSA S.A.

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

---------- En la sede del 5° Distrito, en la ciudad de Salta, a los Dos (2) días del mes de Junio del año Dos Mil Ocho (2008), reunidos el Ingeniero Elías Joaquín Cerezo, en su carácter de Jefe del 5° Distrito, el Jefe de La División Obras Ing. Humberto Edgar Morales y el Ing. Nolberto Lesser, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD; el Sr. Juan Bautista Pacella en representación de la Contratista DOS ARROYOS y habiéndose comprobado que los trabajos de la Obra indicada en el título han sido realizados en un todo de acuerdo a las condiciones del Contrato y Pliego que rige la obra, se procedió a efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de los mismos, Ad-Referendum del SR. ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, habiéndose cumplido con los siguientes recaudos:

1) El Representante Técnico presentó el Informe final de cumplimiento de Contrato, conforme al Artículo 50 del Pliego de Condiciones y Especificaciones, cuyo formato original forma parte de la presente Acta.

2) Se comprobó que los trabajos han sido ejecutados conforme al Contrato respectivo y a las órdenes impartidas por la Supervisión de Obras, habiendo finalizado en fecha Treinta de Setiembre del Dos Mil Siete (30/09/2007).

3) El Control de Calidad de los trabajos estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, habiéndose cumplido satisfactoriamente con lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Pliego General de Bases y Condiciones.

4) Habiendo solicitado la Contratista la "Recepción Provisional de la Obra" y no existiendo razones que objetar, en un todo de acuerdo a lo establecido en Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares de la obra, se establece que el plazo de garantía de Seis Meses corre a partir de la fecha de finalización de la obra.

---------- Para Constancia y Prueba de conformidad, los intervinientes firman un original y cuatro copias de la presente Acta, que pasará a formar parte de la documentación del Certificado Nº 28 R.P. de RECEPCION PROVISIONAL.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Contratista

Supervisión de Obra
NOLBERTO R. LESSER
JEFE SECCION PROYECTOS (INT.)
5to. DISTRITO SALTA

Jefe División Obras
Ing. HUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
5to. Distrito - Salta

Jefe de Distrito
Ing. ELIAS J. CEREZO
Jefe 5to Distrito - Salta (Int)

00526
