


ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

" 2007 - Año de la Seguridad Vial "

EXPEDIENTE N° 13.023-L-2006

---En Buenos Aires, a los VEINTITRÉS (23) días del mes de Julio del año dos mil siete, entre la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con domicilio en Av. Julio A. Roca N° 738, Capital Federal, representada en este acto por su Administrador General, Ingeniero Nelson G. PERIOTTI, en adelante VIALIDAD NACIONAL, también denominado EL CONTRATANTE en la documentación del llamado a Licitación y por la otra, la empresa CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. con domicilio en Amenabar 1247 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también lo constituye a todos los efectos del presente Contrato, representada por el Ingeniero Juan Bautista PACELLA quien acredita facultades suficientes mediante el Poder General Amplio pasada ante la Escribana Silvia CASCO al folio 233 del Registro 1286 a su cargo, en adelante EL CONTRATISTA, bajo las cláusulas que mas abajo se detallan, acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en adelante EL CONTRATO.-----

CLAUSULA PRIMERA: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de recuperación, las otras intervenciones obligatorias y el mantenimiento en la Malla 603 que comprende las siguientes rutas y tramos de la Provincia de Tierra del Fuego

Ruta Nacional N°	Tramo	Ubicación	Distancia al origen
3	San Sebastián - Tolhuin		
	Sección 1: San Sebastián- Estancia Sara	Km. 2741,07-Km.2765,85	Km. 2749,75- Km.2773,62
	Sección 2: Estancia Sara-Cabo Domingo	Km. 2765,85-Km.2805,44	Km. 2773,62-Km.2812,75
	Sección 3: Cabo Domingo- Empalme Variante RNN° 3 Paso p/Río Grande	Km. 2805,44-Km.2812,54	Km. 2812,75-Km.2819,75
	Sección 4: Variante Paso por la Ciudad de Río Grande	Km.2812,54-Km.2825,65	Km.2819,75-Km.2832,87
	Sección 5: Emp.fin Variante paso p/Río Grande -Pte. S/Río Grande	Km.2825,65- Km.2829,78	Km.2832,87-Km.2837,00
	Sección 6: Pte. S/Río Grande- Punta María	Km.2829,78-Km.2857,64	Km.2837,00-Km.2864,59
	Sección 7: Punta María-Puente Justicia (Río Ewan Sur)	Km.2857,64-Fin Km.2892,69	Km.2864,59-Fin Km.2899,11
	Sección 8: Puente Justicia (Río Ewan Sur)-Tolhuin	Km.2892,69-Km.2931,32	Km.2899,11-Km.2932,86

como un todo y de acuerdo con el PROYECTO BASICO DEFINITIVO, los planos, los pliegos de condiciones generales y particulares y demás documentos que forman parte de los términos del llamado a Licitación N° 140/06, todo lo cual ha tenido a la vista para formular su oferta.-----

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000509



Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

" 2007 - Año de la Seguridad Vial "

EXPEDIENTE N° 13.023-L-2006

HOJA N° 2

CLAUSULA SEGUNDA: Todos los documentos mencionados en la cláusula anterior, los Volantes Nros. 1, 2 y 3, y todos los detallados en la Subcláusula 2.3 de la Sección 3, "Condiciones del Contrato", forman parte de este Contrato.-----

CLAUSULA TERCERA: El precio total del Contrato, que se acuerda bajo el sistema de ajuste alzado absoluto, es de PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 88.892.020,35).- El precio convenido esta sujeto a redeterminación bajo las condiciones y con los alcances establecidos en el Pliego.-----

CLAUSULA CUARTA: El Porcentaje (1) aplicable para determinar la parte del precio correspondiente a mantenimiento Pr1 es: Dieciséis con noventa y dos por ciento (16,92%).-----

CLAUSULA QUINTA: Todos los conceptos se usan según la definición dada en el Pliego.-----
Déjase establecido que a los fines de la redeterminación de precio no se desagregan los gastos generales e indirectos y gastos financieros.-----

CLAUSULA SEXTA: EL CONTRATISTA ha constituido garantía de estricto cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales mediante la Póliza de Seguro de Caucción de AFIANZADORA S.A. N° 44.604, por un monto de PESOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE (\$ 26.667.607,00), a favor de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, importe que cubre el treinta por ciento (30 %) del precio total de este Contrato.-

CLAUSULA SÉPTIMA.- Sin perjuicio de las declaraciones exigidas en los términos del llamado a licitación , la firma de este Contrato por el Contratista implica, sin admitirse prueba en contrario, que EL CONTRATISTA acepta en toda su extensión la responsabilidad por la aptitud del PROYECTO BASICO DEFINITIVO para alcanzar y mantener los resultados establecidos en las bases del llamado a licitación y en las especificaciones que forman parte de EL CONTRATO.-----

CLAUSULA OCTAVA.- Las palabras y expresiones que se utilizan en EL CONTRATO tendrán el mismo significado que se les asigna en las Condiciones del Contrato a que se hace referencia en el presente instrumento, las cuales fueron leídas y forman parte de EL CONTRATO.-----

CLAUSULA NOVENA.- En consideración a los pagos que EL CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA, por el presente Contrato, EL CONTRATISTA conviene en ejecutar y terminar las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento subsanando cualquier defecto de unas y/u otro, en conformidad con todos los aspectos de las disposiciones de EL CONTRATO.-----

CLAUSULA DECIMA.- EL CONTRATANTE conviene en pagar a EL CONTRATISTA, en consideración por la ejecución y terminación de las Obras de Recuperación, las Otras Intervenciones Obligatorias y el Mantenimiento, el Precio de EL CONTRATO fijado en la CLAUSULA TERCERA a la suma que pueda resultar pagadera de conformidad con las disposiciones de EL CONTRATO, en el momento y de la manera estipulados en EL CONTRATO.-----

En prueba de conformidad con lo establecido en las cláusulas del presente Contrato, ambas partes lo firman en tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-----

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

ING. GUILLERMO PEROTTI
ADMINISTRATIVO GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000510



OBRA: SISTEMA C.RE.Ma. - MALLA 603
 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
 DEL ATLÁNTICO SUR.-
 RUTA NACIONAL N° 3
 TRAMO: SAN SEBASTIAN -TOLHUIN
 SECCIÓN: Km 2766,83 - Km 2949,94
 EXPEDIENTE PRINCIPAL: 13023 - L - 2006
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

En la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 19 (diecinueve) días del mes de Noviembre del 2012, se reúnen el Sr. Jefe del 24º Distrito D.N.V. Ing. Juan José SOSA ZAMARBIDE y el Supervisor de la Obra Ing. Gustavo CONTI, en representación de la Dirección Nacional de Vialidad, y el Ing. Enrique REY MORITO en representación de la Empresa Dos Arroyos S.A., CONTRATISTA de la Obra de Referencia, a los efectos de suscribir la presente ACTA DE CONSTATAción DE FINALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL de la obra de la referencia.-



ACTA DE CONSTATAción DE FINALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.

Art.1º : El día 31/10/2012, operó el vencimiento para la finalización del Contrato de la Obra de Referencia, constatándose a esa fecha la terminación de las tareas de Mantenimiento comprometidas en PR1. Dichos trabajos quedan sujetos a la aprobación definitiva del Control de Calidad.-

Art.2º : Se deja constancia que en el día de la fecha se recorrió la presente malla y todas las Secciones cumplen en su totalidad con las Condiciones exigibles, ajustándose a los requerimientos contractuales. No se detectaron vicios aparentes, ni se registraron trabajos pendientes de ejecución, ni observaciones en cuanto al estado de la zona de camino.-

Art. 3º : En prueba de conformidad, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-


 CONTRATISTA
 E. REY
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Rey Morito
 Representante Técnico

Por AUTORIZACIÓN del Sr. Jefe Del 24º Distrito

 C.P. Federico S. S. S.
 Jefe Int. Div. Administración
 24º Distrito D.N.V.
 D.N.V.
 D.N.V.
 Ing. Gustavo Cesar Conti
 J.C. Sección Inspección de Obras
 24º Distrito D.N.V.- T.D.F.

 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO



MEMORANDO

REF: OBRA SISTEMA C.RE.MA. - MALLA N°603
 Ruta Nacional N°3- Provincia de Tierra del Fuego
 Tramo: San Sebastián- Tolhuin
 Expediente Principal N° 13023-L-2006
 Expediente Prodef N° 11536-L-2007
 Licitación Pública N° 140/06
 Fecha de Licitación: 31/01/2007
 Fecha de firma de Contrato: 23/07/2007
 Fecha de Replanteo: 01/11/2007
 Plazo de Obra: 60 meses
 Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.
 Financiación: Fondos del Tesoro de la Nación
 Monto del Contrato: \$ 88.892.020,35
 Fecha Aprobación 1° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 43/08 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 11/09/2008
 Monto del Contrato a Precios 1° Adecuación Provisoria: \$ 95.329.899,81
 Fecha Aprobación 2° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 13/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 19/02/2010
 Monto del Contrato a Precios 2° Adecuación Provisoria: \$ 98.677.037,83
 Fecha Aprobación 3° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 71/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 09/06/2010
 Monto del Contrato a Precios 3° Adecuación Provisoria: \$ 101.760.671,81
 Fecha Aprobación 4° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 204/10 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 21/12/2010
 Monto del Contrato a Precios 4° Adecuación Provisoria: \$ 102.579.360,69
 Fecha Aprobación 5° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 91/11 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 01/07/2011
 Monto del Contrato a Precios 5° Adecuación Provisoria: \$ 103.249.572,17
 Fecha Aprobación 6° Adecuación Provisoria (S/Disp. N° 57/12 del Sr. Jefe del 24° Distrito): 04/04/2012
 Monto del Contrato a Precios 6° Adecuación Provisoria: \$ 103.702.569,30

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012
 Importe presente Certificado: \$ 443.445,37

La presente constituye la documentación del Certificado N° 61 6° PROV. y se corresponde con el pago de la última Cuota N° 60 de Mantenimiento de Rutina.-


Cabe mencionar que en el presente certificado surge una diferencia en el Plan de Inversiones entre el Monto vigente del Contrato y Monto ejecutado acumulado total, siendo la diferencia de \$ 443,70, que será subsanado al emitir los certificados definitivos.-

Los trabajos ejecutados por la Contratista durante el mes de **OCTUBRE** de **2012** se adecuan a las consideraciones contempladas en las Especificaciones Generales y Particulares requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Obra.-

Mediante Nota de Pedido N° 246 de fecha 02/11/2012 (cuya copia se adjunta) la Contratista solicita la emisión del presente certificado y adjunta copia del Certificado de Afiliación y Constancia de Contratación de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del Personal de la Empresa. Del mismo modo se adjunta Declaración Jurada de Calidad.-

Se adjunta a la presente copia de la 6° Adecuación Provisoria de Precios, aprobada mediante Disposición N° 57 del 04/04/12 del Señor Jefe del 24° Distrito, tal lo establecido en Resolución A.G. N° 501 de fecha 07/04/2008; y copia del Cuadro Anexo IV - C.Re.Ma. F.T.N. donde surge el mayor gasto a aprobar en concepto de 6° Adecuación Provisoria de Precios de \$ 452.997,13, resultando un nuevo Monto de Contrato de \$103.702.569,30.-

Cabe destacarse que la presente documentación ha sido elaborada en un todo de acuerdo con lo instruido en la NOTA CIRCULAR A.G. N° 01/03 de fecha 21/08/2003.-


 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO


 Ing. Gustavo Cesar Comit
 Supervisor
 240

000512



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 24° DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
OBRAS DE CONTRATO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

OP. 318AL



Obras: Malla N° 603
 Provincia: TIERRA DEL FUEGO
 Ruta: RN. 0003

Expediente Principal: 0013023/2006
 Expediente Certificado: 0020230/2012
 Certificado N°: 61 6° PROV.
 Decreto N°: 01295/2002

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA>; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO>; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE>; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.>; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE>; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA>; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (R.O EWAN SUR)>; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Fecha de Licitación: 31 de enero de 2007
 Fecha de Replanteo: 01 de noviembre de 2007
 Fecha de Finalización de Recuperación: 01 de diciembre de 2010
 Fecha de Medición: 31 de octubre de 2012
 Plazo Vigente: 060 M 00 d
 Fecha de Finalización del Contrato: 01 de noviembre de 2012

Monto de Recuperación: \$ 73.851.490,51
 Monto de Mantenimiento: \$ 15.040.529,84
 Monto del Contrato: \$ 88.892.020,35
 Avance Financiero a Origen: 100,00 %

Certificado	Mes de Ejecuc.	PR2 Contrato	I. R.	PR2 Redetern.	PR1 Contrato	Descuento PR1 a Contrato	PR1 Contrato c/Descuento	I. R.	PR1 Redetern.	Monto Certificado	Monto Acumulado a Contrato	Monto Acumulado Redetern.
1	10/2007	1.477.029,81	1,00000	1.477.029,81	0,00	0,00	0,00	1,00000	0,00	1.477.029,81	1.477.029,81	1.477.029,81
2	11/2007	3.692.574,53	1,00000	3.692.574,53	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	3.943.250,33	5.420.279,84	5.420.279,84
3	12/2007	1.063.461,46	1,00000	1.063.461,46	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	1.714.136,95	6.734.416,79	6.734.416,80
4	01/2008	4.283.386,45	1,00000	4.283.386,45	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	4.334.061,25	11.298.478,24	11.298.478,75
5	02/2008	5.021.901,35	1,00000	5.021.901,35	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	5.372.576,65	16.541.055,59	16.541.055,60
6	03/2008	5.317.307,32	1,00000	5.317.307,32	250.675,50	0,00	250.675,50	1,00000	250.675,50	5.967.982,82	22.106.038,41	22.106.038,42
07 BIS PROV.	04/2008	5.413.314,25	1,09539	5.935.157,75	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	6.499.998,37	27.773.028,15	28.319.036,79
08 BIS PROV.	05/2008	3.544.871,54	1,09539	3.856.397,16	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	4.161.437,78	31.568.575,19	32.480.474,57
09 BIS PROV.	06/2008	169.856,43	1,09539	186.322,78	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	461.073,40	31.969.109,12	32.941.547,97
10 BIS PROV.	07/2008	0,00	1,09539	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	274.840,62	32.239.754,69	33.215.308,59
11 BIS PROV.	08/2008	0,00	1,09539	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	274.840,62	32.490.460,11	33.491.229,21
12 1° PROV.	09/2008	0,00	1,09539	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	274.840,62	32.761.135,51	33.765.069,83
13 1° PROV.	10/2008	0,00	1,09539	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	274.840,62	32.991.631,11	34.040.910,45
14 1° PROV.	11/2008	1.942.794,20	1,09539	2.129.521,36	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	2.404.371,93	35.154.750,81	36.445.281,43
15 1° PROV.	12/2008	3.965.825,06	1,09539	4.348.120,57	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	4.622.971,19	39.401.261,34	41.068.251,62
16 1° PROV.	01/2009	4.261.231,00	1,09539	4.672.013,67	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	4.946.854,29	41.913.187,54	46.015.107,91
17 1° PROV.	02/2009	4.852.042,93	1,09539	5.319.719,95	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	5.296.570,48	49.015.905,27	51.609.728,39
18 1° PROV.	03/2009	4.763.421,14	1,09539	5.222.014,94	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	5.497.455,96	54.030.502,91	57.107.183,95
19 1° PROV.	04/2009	1.536.111,00	1,09539	1.684.192,10	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09539	274.840,62	1.959.032,72	55.816.789,10	59.066.216,67
20 BIS 2° PROV.	05/2009	1.351.482,78	1,09234	1.476.532,09	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	1.918.240,50	57.418.049,19	60.984.957,17
21 BIS 2° PROV.	06/2009	906.375,13	1,09234	1.087.055,83	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	1.386.074,24	58.577.998,01	62.373.031,41
22 BIS 2° PROV.	07/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	58.878.671,51	62.673.239,82
23 BIS 2° PROV.	08/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	59.079.347,00	62.973.448,23
24 BIS 2° PROV.	09/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	59.330.022,90	63.273.656,64
25 BIS 2° PROV.	10/2009	0,00	1,09234	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	300.208,41	59.580.698,20	63.573.865,05
26 BIS 2° PROV.	11/2009	1.828.392,93	1,09234	2.003.679,20	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	2.489.857,61	61.059.756,43	66.063.721,66
27 BIS 2° PROV.	12/2009	3.029.489,42	1,09234	3.323.109,50	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09234	300.208,41	3.528.317,91	64.939.931,34	69.592.010,57
28 TRIS 3° PROV.	01/2010	4.710.503,56	1,10746	5.214.259,85	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	6.060.840,66	69.921.360,50	76.569.511,23
29 BIS 3° PROV.	02/2010	3.620.276,52	1,10746	4.031.715,68	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	5.139.296,47	73.792.142,52	81.793.107,70
30 BIS 3° PROV.	03/2010	3.528.989,93	1,10746	3.900.612,12	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	5.013.392,93	77.571.287,94	86.748.200,63
31 BIS 3° PROV.	04/2010	3.139.175,83	1,10746	3.451.077,95	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	4.484.157,90	80.952.540,17	91.230.356,53
32 BIS 3° PROV.	05/2010	188.400,25	1,10746	209.883,25	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	582.364,16	81.391.716,08	91.612.722,69
33 3° PROV.	06/2010	0,00	1,10746	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	332.480,81	81.642.397,07	92.145.203,50
34 3° PROV.	07/2010	0,00	1,10746	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	332.480,81	81.880.057,52	92.477.684,31
35 3° PROV.	08/2010	0,00	1,10746	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,10746	332.480,81	332.480,81	82.143.743,02	92.910.165,12
36 BIS 4° PROV.	09/2010	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	82.706.418,52	93.173.044,85
37 BIS 4° PROV.	10/2010	1.15.357,21	1,09144	126.491,96	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	529.371,69	82.750.451,23	93.702.016,54
38 BIS 4° PROV.	11/2010	115.357,20	1,09144	126.491,95	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	529.371,68	83.275.489,93	94.212.788,12
39 4° PROV.	12/2010	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	83.327.149,43	94.586.667,95
40 4° PROV.	01/2011	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	83.627.834,93	94.958.347,68
41 4° PROV.	02/2011	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	83.879.510,43	95.321.427,41
42 4° PROV.	03/2011	0,00	1,09144	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09144	362.879,73	362.879,73	84.129.185,93	95.684.307,14
43 BIS 5° PROV.	04/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	84.377.661,43	96.082.458,78
44 BIS 5° PROV.	05/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	84.630.556,93	96.480.610,42
45 BIS 5° PROV.	06/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	84.881.212,43	96.878.762,06
46 5° PROV.	07/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.131.887,93	97.276.913,70
47 5° PROV.	08/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.380.263,43	97.675.065,34
48 5° PROV.	09/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.629.230,73	98.073.216,98
49 5° PROV.	10/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	85.881.914,43	98.471.368,62
50 5° PROV.	11/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	86.134.599,93	98.869.520,26
51 5° PROV.	12/2011	0,00	1,09720	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,09720	398.151,64	398.151,64	86.383.265,43	99.267.671,90
52 BIS 6° PROV.	01/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	86.535.040,93	99.711.117,27
53 BIS 6° PROV.	02/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	86.836.616,43	100.154.562,64
54 BIS 6° PROV.	03/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.127.321,93	100.598.008,01
55 6° PROV.	04/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.379.067,43	101.041.453,38
56 6° PROV.	05/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.530.042,91	101.484.898,75

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Rey Morán
 Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Casar Conti
 Supervisor de Obra
 24° Distrito D.N.V.-T.O.F.

000513



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - 24° DISTRITO TIERRA DEL FUEGO
OBRAS DE CONTRATO DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO

ORIGINAL

113



Obra: Malla Nº 603
 Provincia: TIERRA DEL FUEGO
 Ruta: RN. 0003

Expediente Principal: 0013023/2006
 Expediente Certificado: 0020230/2012
 Certificado Nº: 61 6° PROV.
 Decreto Nº: 01295/2002

Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>

Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLHUIN>

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Fecha de Licitación: 31 de enero de 2007 Monto de Recuperación: \$ 73.851.490,51
 Fecha de Replanteo: 01 de noviembre de 2007 Monto de Mantenimiento: \$ 15.040.529,84
 Fecha de Finalización de Recuperación: 01 de diciembre de 2010 Monto del Contrato: \$ 88.892.020,35
 Fecha de Medición: 31 de octubre de 2012 Avance Financiero a Origen: 100,00 %
 Plazo Vigente: 060 M 00 d
 Fecha de Finalización del Contrato: 01 de noviembre de 2012

Certificado	Mes de Ejecuc.	PR2 Contrato	I. R.	PR2 Redeterm.	PR1 Contrato	Descuento PR1 a Contrato	PR1 Contrato c/Descuento	I. R.	PR1 Redeterm.	Monto Certificado	Monto Acumulado a Contrato	Monto Acumulado Redeterm.
57 6° PROV.	06/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	87.889.318,43	101.928.144,12
58 6° PROV.	07/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.139.993,93	102.371.739,49
59 6° PROV.	08/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.390.669,43	102.815.234,86
60 6° PROV.	09/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.641.344,93	103.258.680,23
61 6° PROV.	10/2012	0,00	1,11376	0,00	250.675,50	0,00	250.675,50	1,11376	443.445,37	443.445,37	88.892.020,43	103.702.125,60
	11/2012	0,00			0,00							

COPIA NO NEGOCIABLE

Resumen Certificado

Monto Acumulado al presente Certificado: \$ 103.702.125,60
 Monto Acumulado al Certificado Anterior: \$ 103.258.680,23
 Monto Total Presente Certificado: \$ 443.445,37
 A Deducir Certificado Nº: \$ 0,00
 Importe Presente Certificado 61 6° PROV.: \$ 443.445,37
 A Deducir por Anticipo Financiero: \$ 0,00
 A Deducir por Penalidades: \$ 0,00
 Descuento 5 % según condiciones de Contrato: \$ 22.172,27
 Suma a Pagar por el presente Certificado: \$ 421.273,10

SON PESOS: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Ray Monto
 Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Conti
 Supervisor de Obra
 24° Distrito D.N.V.-T.D.F.

Ing. Aleana Villegas Florza
 Jefe Int. División Obras
 24° Dis. D.N.V.-T.D.F.

CONTRATISTA

INGENIERO

JEFE DIVISION OBRAS

Ing. Juan J. SOSA ZAMARUDE
 Jefe 24° Distrito D.N.V.
 Tierra del Fuego

JEFE DE DISTRITO

JEFE SEC. CERTIFICACIONES

JEFE DIV. MARCHA DE CONTRATOS

FECHA DE CONFORMIDAD: 05/11/2012

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALTIMISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

000514

ORIGINAL



Dirección Nacional de Vialidad
Plan de Inversiones

Obra: Malla N° 603 - Ruta RN. 0003
Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLUEN>
Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GRANDE> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GRANDE - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)>
Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

Distrito Principal: TIERRA DEL FUEGO
Certificado N°: 61 6° PROV.
Mes: octubre de 2012
Fecha de Replanteo: 01/11/2007
Plazo Original de Obra: 060 14 00 d
Monito Vigente: \$ 103.702.569,30

Periodo	Previsto Mensual Pr2	Previsto Mensual Pr1	Previsto Mensual Total	Previsto Acumulado Total	Ejecutado Mensual Pr2	Ejecutado Mensual Pr1	Ejecutado Mensual Total	Ejecutado Acumulado Pr2	Ejecutado Acumulado Pr1	Ejecutado Acumulado Total	Adelanto o Atraso Acumulado	
											En el Mes	Acumulado
oct 07	\$ 1.477.029,81	\$ 0,00	\$ 1.477.029,81	\$ 1.477.029,81	\$ 1.477.029,81	\$ 0,00	\$ 1.477.029,81	\$ 1.477.029,81	\$ 0,00	\$ 1.477.029,81	0,00 %	0,00 %
nov 07	\$ 3.692.574,53	\$ 250.675,50	\$ 3.943.250,03	\$ 5.420.279,84	\$ 3.692.574,53	\$ 250.675,50	\$ 3.943.250,03	\$ 5.169.604,34	\$ 250.675,50	\$ 5.420.279,84	0,00 %	0,00 %
dic 07	\$ 1.063.461,46	\$ 250.675,50	\$ 1.314.136,96	\$ 6.734.416,80	\$ 1.063.461,46	\$ 250.675,50	\$ 1.314.136,96	\$ 6.233.065,80	\$ 501.351,00	\$ 6.734.416,80	0,00 %	0,00 %
ene 08	\$ 4.283.366,45	\$ 250.675,50	\$ 4.534.061,95	\$ 11.268.478,75	\$ 4.283.366,45	\$ 250.675,50	\$ 4.534.061,95	\$ 10.516.452,25	\$ 752.026,50	\$ 11.268.478,75	0,00 %	0,00 %
feb 08	\$ 5.021.901,35	\$ 250.675,50	\$ 5.272.576,85	\$ 16.541.055,60	\$ 5.021.901,35	\$ 250.675,50	\$ 5.272.576,85	\$ 15.538.353,60	\$ 1.002.702,00	\$ 16.541.055,60	0,00 %	0,00 %
mar 08	\$ 5.317.307,32	\$ 250.675,50	\$ 5.567.982,82	\$ 22.109.038,42	\$ 5.317.307,32	\$ 250.675,50	\$ 5.567.982,82	\$ 20.855.660,92	\$ 1.253.377,50	\$ 22.109.038,42	0,00 %	0,00 %
abr 08	\$ 5.935.103,61	\$ 274.838,11	\$ 6.209.941,72	\$ 28.318.980,14	\$ 5.935.137,75	\$ 274.840,62	\$ 6.209.978,37	\$ 26.790.818,67	\$ 1.528.218,12	\$ 28.319.036,79	0,00 %	0,00 %
may 08	\$ 3.886.561,71	\$ 274.838,11	\$ 4.161.399,82	\$ 32.480.379,96	\$ 3.886.597,16	\$ 274.840,62	\$ 4.161.437,78	\$ 30.677.415,83	\$ 1.803.058,74	\$ 32.480.474,57	0,00 %	0,00 %
jun 08	\$ 186.231,08	\$ 274.838,11	\$ 461.069,19	\$ 32.941.449,15	\$ 186.232,78	\$ 274.840,62	\$ 461.073,40	\$ 30.863.648,61	\$ 2.077.899,36	\$ 32.941.547,97	0,00 %	0,00 %
jul 08	\$ 0,00	\$ 274.838,11	\$ 274.838,11	\$ 33.216.287,25	\$ 0,00	\$ 274.840,62	\$ 274.840,62	\$ 30.863.648,61	\$ 2.352.739,98	\$ 33.216.388,59	0,00 %	0,00 %
ago 08	\$ 0,00	\$ 274.838,11	\$ 274.838,11	\$ 33.491.125,37	\$ 0,00	\$ 274.840,62	\$ 274.840,62	\$ 30.863.648,61	\$ 2.627.580,60	\$ 33.491.729,21	0,00 %	0,00 %
sep 08	\$ 0,00	\$ 274.838,11	\$ 274.838,11	\$ 33.765.963,48	\$ 0,00	\$ 274.840,62	\$ 274.840,62	\$ 30.863.648,61	\$ 2.902.421,22	\$ 33.766.069,83	0,00 %	0,00 %
oct 08	\$ 0,00	\$ 274.838,11	\$ 274.838,11	\$ 34.040.801,59	\$ 0,00	\$ 274.840,62	\$ 274.840,62	\$ 30.863.648,61	\$ 3.177.261,84	\$ 34.040.910,45	0,00 %	0,00 %
nov 08	\$ 2.129.511,54	\$ 274.838,11	\$ 2.404.350,05	\$ 36.445.151,64	\$ 2.129.531,36	\$ 274.840,62	\$ 2.404.371,98	\$ 32.993.179,57	\$ 3.452.102,46	\$ 36.445.262,43	0,00 %	0,00 %
dic 08	\$ 4.348.090,92	\$ 274.838,11	\$ 4.622.929,03	\$ 41.068.080,67	\$ 4.348.130,57	\$ 274.840,62	\$ 4.622.971,19	\$ 37.341.310,54	\$ 3.726.943,08	\$ 41.068.253,62	0,00 %	0,00 %
ene 09	\$ 4.671.971,06	\$ 274.838,11	\$ 4.946.809,17	\$ 46.014.889,84	\$ 4.672.013,67	\$ 274.840,62	\$ 4.946.854,29	\$ 42.983.304,07	\$ 4.001.783,70	\$ 46.015.107,91	0,00 %	0,00 %
feb 09	\$ 5.319.731,35	\$ 274.838,11	\$ 5.594.569,46	\$ 51.609.459,30	\$ 5.319.779,85	\$ 274.840,62	\$ 5.594.620,46	\$ 47.983.304,07	\$ 4.276.624,32	\$ 51.609.728,39	0,00 %	0,00 %



CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Cesar Capelli
Supervisor de Obra
24º Distrito D.N.V.-T.L.F.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Ray Morillo
Representante Técnico

000515




Periodo	Previsto Mensual Pr2	Previsto Mensual Pr1	Previsto Mensual Total	Previsto Acumulado Total	Ejecutado Mensual Pr2	Ejecutado Mensual Pr1	Ejecutado Mensual Total	Ejecutado Acumulado Pr2	Ejecutado Acumulado Pr1	Ejecutado Acumulado Total	Adelantado En el Mes	Atraso Acumulado
mar 09	\$ 5.222.567,30	\$ 274.838,11	\$ 5.497.405,41	\$ 57.105.864,71	\$ 5.222.614,94	\$ 274.840,62	\$ 5.497.455,56	\$ 52.555.719,01	\$ 4.551.464,94	\$ 57.107.183,95	0,00 %	0,00 %
abr 09	\$ 1.684.176,74	\$ 274.838,11	\$ 1.959.014,85	\$ 59.065.879,56	\$ 1.684.102,10	\$ 274.840,62	\$ 1.959.032,72	\$ 54.239.911,11	\$ 4.826.305,56	\$ 59.066.216,67	0,00 %	0,00 %
may 09	\$ 1.618.576,60	\$ 300.216,66	\$ 1.918.793,26	\$ 60.984.672,82	\$ 1.618.532,09	\$ 300.203,41	\$ 1.918.740,50	\$ 55.858.443,20	\$ 5.126.513,07	\$ 60.984.957,17	0,00 %	0,00 %
jun 09	\$ 1.087.895,74	\$ 300.216,66	\$ 1.388.112,40	\$ 62.372.785,22	\$ 1.087.865,83	\$ 300.208,41	\$ 1.388.074,24	\$ 56.946.309,03	\$ 5.426.722,38	\$ 62.373.031,41	0,00 %	0,00 %
jul 09	\$ 0,00	\$ 300.216,66	\$ 300.216,66	\$ 62.673.001,88	\$ 0,00	\$ 300.208,41	\$ 300.208,41	\$ 56.946.309,03	\$ 5.726.930,79	\$ 62.673.239,82	0,00 %	0,00 %
ago 09	\$ 0,00	\$ 300.216,66	\$ 300.216,66	\$ 63.273.435,20	\$ 0,00	\$ 300.208,41	\$ 300.208,41	\$ 56.946.309,03	\$ 6.027.139,20	\$ 62.973.448,23	0,00 %	0,00 %
sep 09	\$ 0,00	\$ 300.216,66	\$ 300.216,66	\$ 63.573.651,86	\$ 0,00	\$ 300.208,41	\$ 300.208,41	\$ 56.946.309,03	\$ 6.327.347,61	\$ 63.273.656,64	0,00 %	0,00 %
oct 09	\$ 0,00	\$ 300.216,66	\$ 300.216,66	\$ 63.573.651,86	\$ 0,00	\$ 300.208,41	\$ 300.208,41	\$ 56.946.309,03	\$ 6.627.556,02	\$ 63.573.855,05	0,00 %	0,00 %
nov 09	\$ 2.189.739,42	\$ 300.216,66	\$ 2.489.956,08	\$ 66.063.607,94	\$ 2.189.679,20	\$ 300.208,41	\$ 2.489.887,61	\$ 59.135.988,23	\$ 6.927.764,43	\$ 66.063.752,66	0,00 %	0,00 %
dic 09	\$ 3.628.209,39	\$ 300.216,66	\$ 3.928.426,05	\$ 69.992.033,99	\$ 3.628.109,50	\$ 300.208,41	\$ 3.928.317,91	\$ 62.764.097,73	\$ 7.227.972,84	\$ 69.992.070,57	0,00 %	0,00 %
ene 10	\$ 5.274.305,77	\$ 332.477,95	\$ 5.606.783,71	\$ 76.598.817,70	\$ 6.274.359,85	\$ 332.480,81	\$ 6.606.840,66	\$ 69.038.457,58	\$ 7.560.453,65	\$ 76.598.911,23	0,00 %	0,00 %
feb 10	\$ 4.801.674,27	\$ 332.477,95	\$ 5.134.152,21	\$ 81.732.969,91	\$ 4.801.715,66	\$ 332.480,81	\$ 5.134.196,47	\$ 73.840.173,24	\$ 7.892.934,46	\$ 81.733.107,70	0,00 %	0,00 %
mar 10	\$ 4.680.571,78	\$ 332.477,95	\$ 5.013.049,72	\$ 86.746.019,63	\$ 4.680.612,12	\$ 332.480,81	\$ 5.013.092,93	\$ 78.520.785,36	\$ 8.225.415,27	\$ 86.746.200,63	0,00 %	0,00 %
abr 10	\$ 4.151.641,31	\$ 332.477,95	\$ 4.484.119,26	\$ 91.230.136,69	\$ 4.151.677,09	\$ 332.480,81	\$ 4.484.157,90	\$ 82.672.462,45	\$ 8.557.896,08	\$ 91.230.358,53	0,00 %	0,00 %
may 10	\$ 249.081,20	\$ 332.477,95	\$ 582.559,15	\$ 91.812.498,04	\$ 249.883,35	\$ 332.480,81	\$ 582.364,16	\$ 82.922.345,80	\$ 8.890.376,89	\$ 91.812.722,69	0,00 %	0,00 %
Jun 10	\$ 0,00	\$ 332.477,95	\$ 332.477,95	\$ 92.144.975,99	\$ 0,00	\$ 332.480,81	\$ 332.480,81	\$ 82.922.345,80	\$ 9.222.857,70	\$ 92.145.203,50	0,00 %	0,00 %
Jul 10	\$ 0,00	\$ 332.477,95	\$ 332.477,95	\$ 92.477.453,94	\$ 0,00	\$ 332.480,81	\$ 332.480,81	\$ 82.922.345,80	\$ 9.555.336,51	\$ 92.477.684,31	0,00 %	0,00 %
ago 10	\$ 0,00	\$ 332.477,95	\$ 332.477,95	\$ 92.809.931,89	\$ 0,00	\$ 332.480,81	\$ 332.480,81	\$ 82.922.345,80	\$ 9.887.819,32	\$ 92.810.165,12	0,00 %	0,00 %
sep 10	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 93.172.811,62	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 82.922.345,80	\$ 10.250.699,05	\$ 93.173.044,85	0,00 %	0,00 %
oct 10	\$ 166.991,96	\$ 362.879,73	\$ 529.871,69	\$ 93.702.683,31	\$ 166.991,96	\$ 362.879,73	\$ 529.871,69	\$ 83.089.337,76	\$ 10.613.578,78	\$ 93.702.916,54	0,00 %	0,00 %
nov 10	\$ 166.991,95	\$ 362.879,73	\$ 529.871,68	\$ 94.232.554,99	\$ 166.991,95	\$ 362.879,73	\$ 529.871,68	\$ 83.256.329,71	\$ 10.976.459,51	\$ 94.232.788,22	0,00 %	0,00 %
dic 10	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 94.595.434,72	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 83.256.329,71	\$ 11.339.338,24	\$ 94.595.667,95	0,00 %	0,00 %
ene 11	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 94.958.314,45	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 83.256.329,71	\$ 11.702.217,97	\$ 94.958.547,68	0,00 %	0,00 %
feb 11	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 95.321.194,18	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 83.256.329,71	\$ 12.065.097,70	\$ 95.321.427,41	0,00 %	0,00 %
mar 11	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 95.684.073,91	\$ 0,00	\$ 362.879,73	\$ 362.879,73	\$ 83.256.329,71	\$ 12.427.977,43	\$ 95.684.307,14	0,00 %	0,00 %
abr 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 96.082.225,55	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 12.826.129,07	\$ 96.082.458,78	0,00 %	0,00 %
may 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 96.480.377,19	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 13.224.280,71	\$ 96.480.619,42	0,00 %	0,00 %

CONSTRUCTORA LOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Gustavo Cesar Conti
 Supervisor de Obra
 24ª Distrito D.N.V.-T.B.F.

CONSTRUCCION LOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Rey Monto
 Representante Tecnico

ORIGINAL



Periodo	Previsto Mensual Pr-2	Previsto Mensual Pr-1	Previsto Mensual Total	Previsto Acumulado Total	Ejecutado Mensual Pr-2	Ejecutado Mensual Pr-1	Ejecutado Mensual Total	Ejecutado Acumulado Pr-2	Ejecutado Acumulado Pr-1	Ejecutado Acumulado Total	Adelantar En el Mes	Atraso Acumulado
jun 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 96.878.528,83	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 13.622.432,35	\$ 96.878.762,06	0,00 %	0,00 %
jul 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 97.276.680,47	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 14.020.383,99	\$ 97.276.913,70	0,00 %	0,00 %
ago 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 97.674.832,11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 14.418.735,63	\$ 97.675.065,34	0,00 %	0,00 %
sep 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 98.072.983,75	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 14.816.887,27	\$ 98.073.216,98	0,00 %	0,00 %
oct 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 98.471.135,39	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 15.215.038,91	\$ 98.471.368,62	0,00 %	0,00 %
nov 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 98.869.287,03	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 15.613.190,55	\$ 98.869.520,26	0,00 %	0,00 %
dic 11	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 99.267.438,67	\$ 0,00	\$ 398.151,64	\$ 398.151,64	\$ 83.256.329,71	\$ 16.011.342,19	\$ 99.267.671,90	0,00 %	0,00 %
ene 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 99.710.884,04	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 16.454.787,56	\$ 99.711.117,27	0,00 %	0,00 %
feb 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 100.154.329,41	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 16.898.232,93	\$ 100.154.562,64	0,00 %	0,00 %
mar 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 100.597.774,78	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 17.341.678,30	\$ 100.598.008,01	0,00 %	0,00 %
ab- 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 101.041.220,15	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 17.785.123,67	\$ 101.041.453,38	0,00 %	0,00 %
may 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 101.484.665,52	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 18.228.569,04	\$ 101.484.898,75	0,00 %	0,00 %
jun 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 101.928.110,89	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 18.672.014,41	\$ 101.928.344,12	0,00 %	0,00 %
jul 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 102.371.556,26	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 19.115.459,78	\$ 102.371.789,49	0,00 %	0,00 %
ago 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 102.815.001,63	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 19.558.905,15	\$ 102.815.234,66	0,00 %	0,00 %
sep 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 103.258.447,00	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 20.002.350,52	\$ 103.258.680,23	0,00 %	0,00 %
oct 12	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 103.701.892,37	\$ 0,00	\$ 443.445,37	\$ 443.445,37	\$ 83.256.329,71	\$ 20.445.795,89	\$ 103.702.125,60	0,00 %	0,00 %

[Handwritten signature]
 Ing. Gustavo Cesar Dohs
 Super-Miembro de Obra
 24º Distrito D.N.V.-T.D.F

[Handwritten signature]
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Ray Monto
 Representante Técnico


CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO



Dirección Nacional de Vialidad
Curva de Avance a valores de contrato según Resol./Disp. 01933



Obra: Malla Nº 603 - RN. 0003
Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLHUIN>
Distrito Principal: TIERRA DEL FUEGO
Mes: octubre de 2012
Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA
Fecha de Replanteo: 01/11/2007
Plazo de Obra: 060 M 00 d
Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

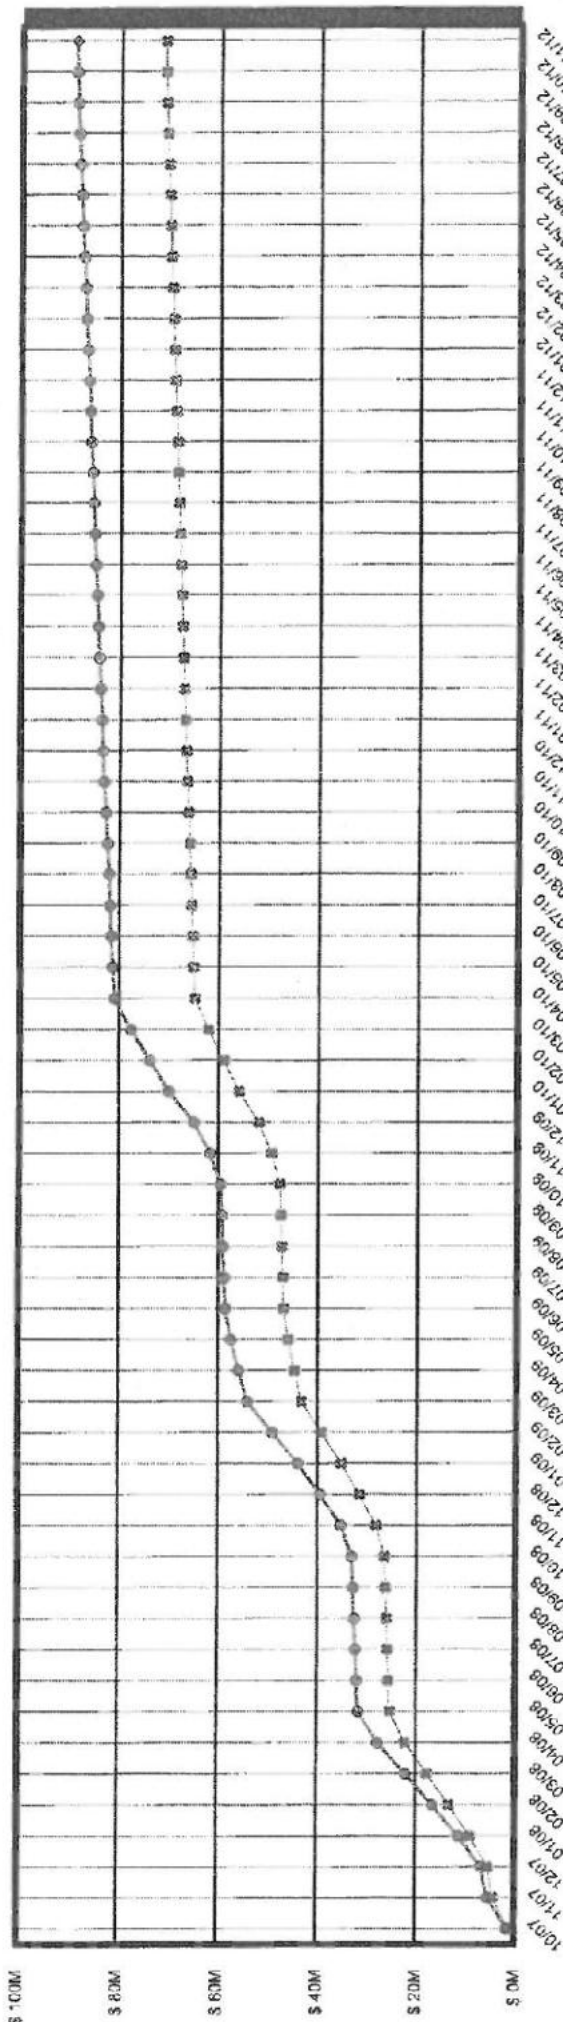

● Previsto Acumulado
 ○ Realizado Acumulado
 ■ Tolerancia - 20%

Ing. Gustavo Casar Conti
 Supervisor de Obra
 24º Distrito D.N.Y.-T.O.F.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Roy Meito
 Representante Técnico

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

02 de noviembre de 2012




Dirección Nacional de Vialidad

Curva de Inversiones Previstas y Ejecutadas

Obra: Mella N° 603 - Ruta RN. 0003
Tramo: <SAN SEBASTIAN-TOLUJIN>
Sección: <SAN SEBASTIAN - ESTANCIA SARA> ; <ESTANCIA SARA - CABO DOMINGO> ; <CABO DOMINGO - VARIANTE PASO POR RIO GRANDE> ; <VARIANTE PASO POR RIO GRANDE - EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE.> ; <EMPALME FIN VTE. PASO POR RIO GDE. - PUENTE SOBRE RIO GRANDE> ; <PUENTE SOBRE RIO GRANDE - PUNTA MARIA> ; <PUNTA MARIA - PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR)> ; <PUENTE JUSTICIA (RIO EWAN SUR) - TOLUJIN>

Districto Principal: TIERRA DEL FUEGO
Certificado N°: 61 6° PROV.
Mes: octubre de 2012
Fecha de Replanteo: 01/11/2007
Plazo Original de Obra: 060 M 00 d

Contratista: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.

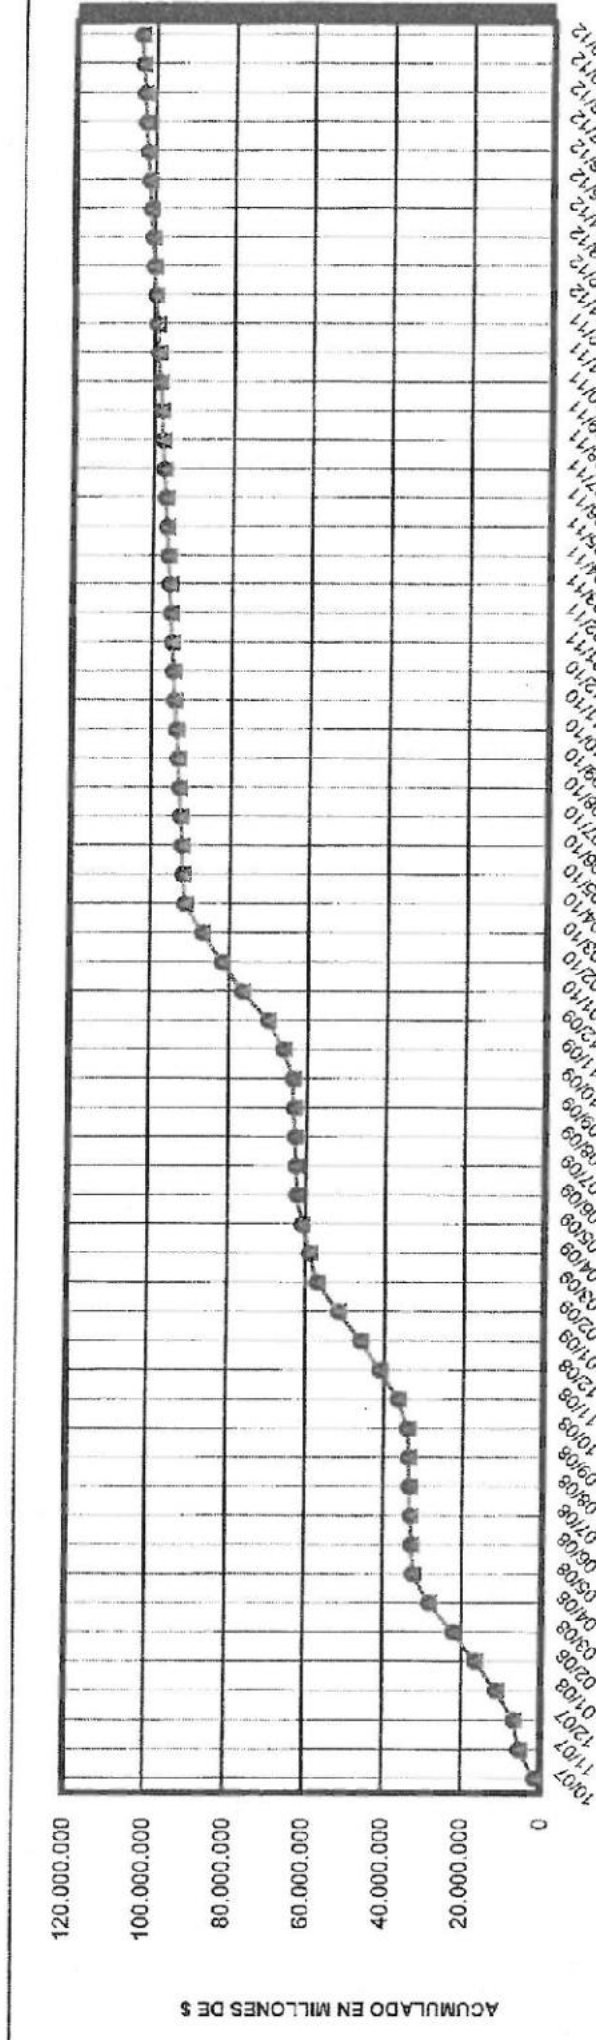

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BALBUENA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Rey Maglio
 Representante Técnico

Ing. Gustavo Cesar Bardi
 Supervisor de Obra
 24º Distrito D.N.V.-T.H.F.



ORIGINAL



INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO

OBRA: Sistema C.Re.Ma - MALLA N° 603

Provincia: Tierra del Fuego

Ruta Nacional N° 3

Tramo: San Sebastian - Tolhuin

Sección: Km. 2766,83 - Km. 2949,94

Sección 1: Km. 2766,83 - Km. 2790,70

2: Km. 2790,70 - Km. 2829,83

3: Km. 2829,83 - Km. 2836,83

4: Km. 2836,83 - Km. 2849,95

5: Km. 2849,95 - Km. 2854,08

6: Km. 2854,08 - Km. 2881,67

7: Km. 2881,67 - Km. 2916,19

8: Km. 2916,19 - Km. 2949,94

Expediente Principal N° 13023 - L - 2006

Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.

Licitación Pública N° 140/06

Fecha de Licitación: 31/01/2007

Fecha de Firma de Contrato: 23/07/2007

Fecha de Replanteo: 01/11/2007

Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias: 37 Meses

Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2): 30/11/2010

Fecha de Terminación Efectiva de los Trabajos de Recuperación: 30/11/2010

Plazo Total del Contrato Includo trabajos de Mantenimiento: 60 Meses

Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012

Monto de Contrato: \$ 88.892.020,35 (PR 1: \$ 16.040.529,84 PR 2: \$ 73.851.490,51)

Monto 1° Adecuación Provisoria: \$ 95.329.899,81 (PR 1: \$ 16.369.611,33 PR 2: \$ 78.960.288,48)

Monto 2° Adecuación Provisoria: \$ 98.677.038,02 (PR 1: \$ 17.435.058,71 PR 2: \$ 81.241.979,31)

Monto 3° Adecuación Provisoria: \$ 101.760.671,81 (PR 1: \$ 18.532.320,26 PR 2: \$ 83.228.351,55)

Monto 4° Adecuación Provisoria: \$ 102.579.350,69 (PR 1: \$ 19.322.761,99 PR 2: \$ 83.256.588,70)

Monto 5° Adecuación Provisoria: \$ 103.249.572,17 (PR 1: \$ 19.992.923,64 PR 2: \$ 83.256.648,53)

Monto 6° Adecuación Provisoria: \$ 103.702.569,30 (PR 1: \$ 20.445.920,77 PR 2: \$ 83.256.648,53)

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012

Importe presente Certificado: \$ 443.445,37

Monto Total del Contrato a Valores de 6° Adecuación	Total Certificación Acumulada a Valores 6° Adecuación	Certificación Acumulada a Valores 6° Adecuación
\$ 103.702.569,30	\$ 103.702.125,61	100,00%

A) OBRAS DE RECUPERACION E INTERVENCIONES OBLIGATORIAS

PR 2 Total	Certificado Acumulado	Porcentaje
\$ 83.256.648,53	\$ 83.256.329,72	100,00%

B) MANTENIMIENTO DE RUTINA

PR 1	Certificado Acumulado	Porcentaje
\$ 20.445.920,77	\$ 20.445.795,89	100,00%

C) PLAZO DEL CONTRATO

Plazo Total del Contrato	Plazo Transcurrido	Porcentaje
60 Meses	60 Meses	100,00%

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. Enrique Rey Mónico
Representante Técnico

Contratista

Ing. Juan J. SOSA ZAMARINO
Jefe 24° Distrito D.N.V.
Tierra del Fuego

Jefe de Distrito

Ing. Gustavo Cesar Conti
Supervisor de Obras
24° Distrito D.N.V.-T.D.F.


Ingeniero

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Jefe Div. Marcha de Contratos

Sub Gerente Obras y Concesiones

Gerente de Obras y Servicios Viales



INFORME DEL INGENIERO

OBRA: Sistema C.Re.Ma - MALLA N° 603

Provincia: Tierra del Fuego

Ruta Nacional N° 3

Tramo: San Sebastian - Tolhuin

Sección: Km. 2766,83 - Km. 2949,94

Expediente Principal N° 13023 - L - 2006

Contratista: Constructora Dos Arroyos S.A.

Licitación Pública N° 140/06

Fecha de Licitación: 31/01/2007

Fecha de Firma de Contrato: 23/07/2007

Fecha de Replanteo: 01/11/2007

Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias: 37 Meses

Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2): 30/11/2010

Plazo Total del Contrato incluido trabajos de Mantenimiento: 60 Meses

Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012

Monto de Contrato: \$ 88.892.020,35 (PR 1: \$ 15.040.529,84 PR 2: \$ 73.851.490,51)

Monto 1° Adecuación Provisoria: \$ 95.329.899,81 (PR 1: \$ 16.369.611,33 PR 2: \$ 78.960.288,48)

Monto 2° Adecuación Provisoria: \$ 98.677.038,02 (PR 1: \$ 17.435.058,71 PR 2: \$ 81.241.979,31)

Monto 3° Adecuación Provisoria: \$ 101.760.871,81 (PR 1: \$ 18.532.320,28 PR 2: \$ 83.228.351,55)

Monto 4° Adecuación Provisoria: \$ 102.579.360,89 (PR 1: \$ 19.322.781,99 PR 2: \$ 83.256.598,70)

Monto 5° Adecuación Provisoria: \$ 103.249.572,17 (PR 1: \$ 19.992.923,64 PR 2: \$ 83.256.648,53)

Monto 6° Adecuación Provisoria: \$ 103.702.569,30 (PR 1: \$ 20.445.920,77 PR 2: \$ 83.256.648,53)

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012

Importe presente Certificado: \$ 443.445,37

Certificado correspondiente a: Obras de Mantenimiento de Rutina - Conservación: **OCTUBRE 2012**

ITEMS	SECCION	PROGRESIVAS
Bacheo superficial	S1; S2; S3; S6; S7 y S8.-	
Sellado de fisuras	S4; S5; S6; S7 y S8.-	
Reposición Señalamiento vertical	S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7 y S8.-	
Perfilado de banquetas	S2; S3; S4; S5; S6; S7 y S8.-	
Mantenimiento de desagües en general	S1; S2; S4; S5; S6; S7 y S8.-	

Se adjunta a la presente informes semanales, correspondientes a las tareas de Mantenimiento de Rutina.-

[Signature]
 Ing. Gustavo Cesar Conti
 Supervisor de Obra
 24° Distrito D.N.V.-T.D.F.

[Signature]
 CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO



2012-Año de Homenaje al Doctor D. MANUEL BELGRANO



OBRA: Sistema C.R.Ma - MALLA N° 603
 Provincia: Tierra del Fuego
 Ruta Nacional N° 3
 Tramo: San Sebastián - Tolú
 Sección: Km. 2766,83 - Km. 2849,94
 Sección 1: Km 2766,83 - Km. 2790,70
 2: Km. 2790,70 - Km. 2829,83
 3: Km. 2829,83 - Km. 2836,83
 4: Km. 2836,83 - Km. 2849,94
 5: Km. 2849,96 - Km. 2854,08
 6: Km. 2854,05 - Km. 2831,07
 7: Km. 2851,07 - Km. 2816,15
 8: Km. 2816,15 - Km. 2849,94

Expediente Provincial N° 13024 - L - 2008
 Contratista: Constructor Dos Arroyos S.A.
 Licitación Pública N° 44008
 Fecha de Licitación: 31/01/2007
 Fecha de Firma de Contrato: 29/07/2007
 Fecha de Reparo: 01/11/2007
 Plazo de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias: 37 Meses
 Fecha Prevista de Terminación de las Obras de Recuperación e Intervenciones Obligatorias (PR2): 09/11/2010
 Fecha de Terminación Efectiva de los Trabajos de Recuperación: 09/11/2010
 Plazo Total del Contrato (incluido trabajos de Mantenimiento): 60 Meses
 Fecha de Finalización de Contrato: 01/10/2012
 Monto de Contrato: \$ 88.892.020,35 (PR 1: \$ 15.040.529,84 PR 2: \$ 73.851.490,51)
 Monto 1° Adecuación Provisoria: \$ 92.328.899,81 (PR 1: \$ 10.769.811,33 PR 2: \$ 73.850.208,18)
 Monto 2° Adecuación Provisoria: \$ 92.677.036,07 (PR 1: \$ 17.436.058,11 PR 2: \$ 81.241.978,81)
 Monto 3° Adecuación Provisoria: \$ 101.780.871,81 (PR 1: \$ 18.329.307,79 PR 2: \$ 85.229.051,05)
 Monto 4° Adecuación Provisoria: \$ 102.519.900,66 (PR 1: \$ 18.322.761,98 PR 2: \$ 83.758.598,70)
 Monto 5° Adecuación Provisoria: \$ 103.349.873,17 (PR 1: \$ 18.992.823,84 PR 2: \$ 83.256.348,33)
 Monto 6° Adecuación Provisoria: \$ 103.702.869,30 (PR 1: \$ 20.445.920,77 PR 2: \$ 83.256.948,53)

CERTIFICADO N° 61 6° PROV. - MES DE OCTUBRE DE 2012

PLANILLA DE CALCULO DE LA CUOTA MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE RUTINA

	A VALORES BAC-COS	A VALORES DE 1° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 2° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 3° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 4° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 5° ADECUACION PROVISORIA	A VALORES DE 6° ADECUACION PROVISORIA
MONTO DEL CONTRATO	\$ 88.892.020,35	\$ 92.328.899,81	\$ 92.677.037,07	\$ 101.780.871,81	\$ 102.672.360,66	\$ 103.243.572,17	\$ 103.702.869,30
PUBLICO CERTIFICABLE DE MANTENIMIENTO DE RUTINA (PR1)	\$ 15.040.529,84	\$ 16.597.811,33	\$ 17.436.058,61	\$ 18.322.920,26	\$ 19.722.761,89	\$ 19.982.920,84	\$ 20.445.920,77
MONTO DE CERTIFICACION MENSUAL DE MANT. DE RUTINA	\$ 240.876,90	\$ 274.838,11	\$ 300.316,68	\$ 332.477,88	\$ 368.879,72	\$ 398.151,58	\$ 445.545,57
LONGITUD DE LA MALLA (KM)	178,98						

VALORES CONSTANTES				PRESENTE CERTIFICADO				
KILÓMETRO	SECCIÓN	LONGITUD	PROPORCIONAL MENSUAL DE MANT. POR SECCION	APORTES SEMANALES A CERTIFICAR				IMPORTE TOTAL POR SECCION
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
3	SECCION 1	25,87	\$ 28.140,92	\$ 14.155,23	\$ 14.755,23	\$ 14.785,23	\$ 14.785,23	\$ 59.142,92
	SECCION 2	28,15	\$ 99.969,46	\$ 24.237,37	\$ 24.337,37	\$ 24.337,37	\$ 24.337,37	\$ 96.949,46
	SECCION 3	7,90	\$ 17.353,28	\$ 4.325,84	\$ 4.325,84	\$ 4.325,84	\$ 4.325,84	\$ 17.343,08
	SECCION 4	8,90	\$ 22.273,85	\$ 5.568,46	\$ 5.568,46	\$ 5.568,46	\$ 5.568,46	\$ 22.271,85
	SECCION 5	4,15	\$ 10.232,56	\$ 2.558,15	\$ 2.558,15	\$ 2.558,15	\$ 2.558,15	\$ 10.232,56
	SECCION 6	27,59	\$ 88.357,88	\$ 17.089,42	\$ 17.089,42	\$ 17.089,42	\$ 17.089,42	\$ 88.357,88
	SECCION 7	14,62	\$ 85.527,62	\$ 21.381,91	\$ 21.381,91	\$ 21.381,91	\$ 21.381,91	\$ 85.527,62
	SECCION 8	33,71	\$ 83.619,80	\$ 20.904,26	\$ 20.904,26	\$ 20.904,26	\$ 20.904,26	\$ 83.619,80
TOTAL A CERTIFICAR MANTENIMIENTO DE RUTINA, PRESENTE								\$ 445.545,57

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. Enrique Rey Monto
 Representante Técnico
 CONTRATISTA (FIRMA Y FECHA)

Ing. Gustavo Cesar Conti
 Supervisor de Obra
 24° Distrito D.N.V.-T.B.F.
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
 Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
 REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTANTE TECNICO



CERTIFICADO DE OBRAS EJECUTADAS

El funcionario que suscribe Certifica que la firma CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A. con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio en la calle 3 de Febrero 2750, Piso 4º, se encuentre ejecutando para esta Dirección Nacional de Vialidad la obra: Expediente 13023-L-2006. Obra: Sistema C.RE.MA: - Malla 603. Ruta Nacional N° 3. Tramo: San Sebastián – Tolhuin. Sección: Km. 2.766,83 – Km. 2.949,94. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tipo de obra: Recuperación y Mantenimiento. Pavimentación en concreto asfáltico, alcantarillas y puentes con iluminación en zona de casilla de pesaje: longitud total: 178,98 km; Obras de recuperación: Sellado de fisuras tipo puente: 108.157,50 m; Bacheo con mezcla asfáltica: 2.672,15 m3; Base asfáltica en 0,10 m de esp. 80.089,74 m2; Carpeta asfáltica en 0,05 m de esp: 538.289,00; Carpeta asfáltica en 0,06 m de esp: 311.632,70; Riego de Imprimación: 81.943,38; Riego de liga: 928.592,20 m2; Excavación para zanjas de desagüe: 350,00 m3; Terraplenes con compactación especial: 86.400,00 m3; Terraplenes con compactación común: 300 m3; Construcción de subbase drenante: 35.466,29 m3; Construcción de base anticongelante: 17.156,34 m3. Provisión y colocación de baranda metálica de defensa: 20.550,00 m; Construcción de banquetas enripiadas: 89.142,48 m3; Construcción de alcantarillas de chapa D= 1,00 m: 150,00 m; Construcción de gaviones: 600,00 m3; Hormigón H-17: 98,50 m3; Hormigón H-21 incluido armadura: 200,00 m3; Construcción de alcantarillas laterales: 178,00 m3; Reacondicionamiento de obras de arte: 95 m3; Señalamiento horizontal: 49.400 m2; Reposición y mantenimiento de señales verticales: 140 m2. Construcción de dársena, balanza y oficina para puesto fijo de control de cargas. Reparaciones varias en Puentes. Obras de Mantenimiento: Sellado de fisuras tipo puente: 423.360 m; Bacheo con mezcla asfáltica: 2.556,00 m3.

Fecha de Inicio: 01/11/2007

Avance de obra: Recuperación 100% - Mantenimiento: 95,00%. Certificación: 99,44%.

Monto del Contrato: \$ 73.855.112,16 (Recuperación) + \$ 15.036908,19 (Mantenimiento).

Total: \$ 88.892.020,35 (Base Ene-2007)

Monto Total Certificado al 31/08/2012: \$ 102.815.234,86 (S/6º Adecuación provisoria Abr-11)

Conceptos de la Empresa: muy bueno

Equipos y rodados: muy bueno.

Cumplimiento de plazo: en término

Capacidad Técnica: muy buena

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 10 días del mes de Octubre de 2012 se extiende el presente certificado a efectos de ser presentado ante quién corresponda.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

ING. CIVIL RICARDO GARRONE
AGENCIARIA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

000523



ORIGINAL

123



Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

IMPORTE: PESOS 2005

CONTE CON EL VALOR DE SELLOS

DE PRECATORIO DE PAGO MEDIANTE

DE PAGO DE OBLIGACION

SEGUN EXPEDIENTE 12-2326-06

SALTA, 19/10/2006

FIRMA: SILVIA T. DE SAGANIAS
SUPERV. TEC. LIQUIDADOR
SUBPROG. CAP. TPO.
D.G.R. - SALTA

Año de Homenaje a Antonio Berni

EXPEDIENTE N° 1210-L-04

Entre el señor ADMINISTRADOR GENERAL de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ing. Nelson Guillermo PERIOTTI, por una parte y la Firma: CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A., con domicilio legal en calle Amenabar 1247, 1° Piso, Buenos Aires, por la otra, a quien en adelante se designará con la palabra "Contratista" y representada en este Acto por el Ing. Juan Bautista PACHELLA, en virtud del Poder General Amplio, conferido a su favor, pasado al folio 233 del Registro 1286 a cargo de la Escribana Silvia CASCO, se ha convenido celebrar el presente:

CONTRATO

ARTICULO 1°.- El Contratista se compromete a ejecutar las obras en dieciocho (18) meses, en un todo de acuerdo con las Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales, Addendas N° 1, N° 2 y N° 3, y demás Documentos de la Licitación, que ha estudiado y aceptado al presentar su Oferta a la Licitación Pública N° 75/04, Obra: CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (C.A.F.) CORREDOR EJE CAPRICORNIO en la PROVINCIA DE SALTA - RUTA NACIONAL N° 81, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 - LIMITE CON FORMOSA, SECCION VI: LOS BLANCOS - LIMITE CON FORMOSA, efectuada el día 12 de Noviembre de 2004.

ARTICULO 2°.- Todos los documentos mencionados en el artículo 1° forman parte integrante del presente contrato, a cuyos efectos y en prueba de conformidad los firman ambas partes.

ARTICULO 3°.- Las obras objeto de este contrato, aplicando los precios unitarios cotizados en el Formulario de Presupuesto de la Oferta, importan la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 27.776.885,41), de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM N°	DESIGNACIÓN	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
---------	-------------	---------	-----------	------------------	---------------	--------------

OBRAS A EJECUTAR

1	Desbosque, destronque y limpieza del terreno	Ha	75,00	Dos mil seiscientos veintiocho pesos con ochenta y siete ctvos	2.628,87	197.165,25
2	Terraplenes					
					A fs. 2....	197.165,25

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERIOTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000524



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

ORIGINAL

124



2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04
HOJA Nº 2

ITEM Nº	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
					De fs. 1...	197.165,25
a)	Con compactación especial	m ³	462.625,00	Quince pesos con cincuenta ctvos.	15,50	7.170.687,50
b)	Sin compactación especial	m ³	1.549,00	Diez pesos con setenta y seis ctvos.	10,76	16.667,24
c)	Sin compactación especial para recubrimiento de taludes	m ³	22.568,00	Doce pesos con treinta ctvos	12,30	277.586,40
3	Recubrimiento con suelo seleccionado	m ³	51.851,18	Veintisiete pesos con cincuenta y tres ctvos.	27,53	1.427.462,99
4	Construcción de base granular	m ³	34.678,58	Doscientos nueve pesos con treinta y cinco ctvos.	209,35	7.259.960,72
5	Materiales bituminosos para riego					
a)	De imprimación con E.M-1	m ²	231.190,51	Dos pesos con setenta y nueve ctvos.	2,79	645.021,52
b)	De liga con E.R.-1	m ²	218.165,69	Un peso con veintinueve ctvos.	1,29	281.433,74
6	Ejecución de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en 0,05 m. de espesor	m ²	218.165,69	Treinta y un pesos con treinta y dos ctvos.	31,32	6.832.949,41
7	Excavación no clasificada para badenes	m ³	2.520,00	Trece pesos con sesenta y cuatro ctvos.	13,64	34.372,80
8	Excavación para fundaciones de alcantarillas	m ³	316,00	Treinta y cinco pesos con setenta y siete ctvos.	35,77	11.303,32
					A fs.3.....	24.154.610,89

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

Ing. NELSON GUILLERMO PERICCHI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000525



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

ORIGINAL



"2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni"

EXPEDIENTE Nº 1210-L-04
HOJA Nº3

ITEM Nº	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
					De fs. 2...	24.154.610,89
9	Hormigón de piedra armado, clase "H-21", excluida la armadura	m ³	127,90	Novecientos cincuenta y siete pesos con sesenta y dos ctvos.	957,62	122.479,60
10	Hormigón de piedra clase "H-13"	m ³	527,80	Quinientos diecinueve pesos con veintinueve ctvos.	519,29	274.081,26
11	Acero especial en barras ADN-420, colocado	Tn	6,10	Cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos con ochenta y seis ctvos	4.389,86	26.778,15
12	Acero laminado, colocado	Tn	4,90	Ocho mil setecientos ocho pesos con veintinueve ctvos.	8.708,29	42.670,62
13	Provisión y colocación de caños de chapa ondulada de hierro galvanizado, tipo helicoidal, según plano H-10209					
a)	DeØ=1,00m.,e=1,6mm	m	144,00	Cuatrocientos nueve pesos	409,00	58.896,00
b)	DeØ=0,90m.,e=1,6mm	m	128,00	Trescientos setenta y nueve pesos con cuarenta y cuatro ctvos.	379,44	48.568,32
c)	DeØ=0,80m.,e=1,6mm	m	209,00	Trescientos veinte pesos con setenta y un ctvos.	320,71	67.028,39

A fs. 4..... 24.795.113,23

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
PRESIDENTE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. NELSON GUTIERMO PEROTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000526



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

ORIGINAL

126



"2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni"

EXPEDIENTE N° 1210-L-04
HOJA N°4

ITEM N°	DESIGNACION	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
					De fs. 3...	24.795.113,23
14	Baranda metálica cincada para defensa, según plano H-10237, tipo "A", con postes metálicos pesados conformados en frío y alas terminales comunes, colocada	m	1.935,48	Ciento sesenta pesos con cuarenta y dos ctvos.	160,42	310.489,70
15	Construcción de alambrados según plano H-2840-I tipo "D", incluido materiales, colocado	m	62.022,00	Quince pesos con veintiséis ctvos.	15,26	946.455,72
16	Tranqueras según plano J-5084, tipo "B", colocadas	N°	7,00	Un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con setenta y ocho ctvos.	1.498,78	10.491,46
17	Retiro de alambrados	m	25.072,00	Tres pesos con cincuenta y dos ctvos.	3,52	88.253,44
18	Cordón de hormigón de piedra clase "H-13" de 0,15mx 0,30m para protección del borde del pavimento	m	368,00	Treinta y un pesos con cincuenta y nueve ctvos.	31,59	11.625,12
19	Movilidad para el personal de Supervisión					
a)	Cuota mensual	mes	36,00	Cinco mil doscientos setenta y siete pesos con treinta y ocho ctvos.	5.277,38	189.985,68
b)	Adicional por Km.	Km	108.000,00	Ochenta y tres ctvos.	0,83	89.640,00
					A fs. 5.....	26.442.054,35

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
PRESIDENTE

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAPTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. GUILLERMO PEROTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

000527



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas
Dirección Nacional de Vialidad

ORIGINAL



"2005 - Año de Homenaje a Antonio Berni"


EXPEDIENTE N° 1210-L-04
HOJA N°5


ITEM N°	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO EN LETRAS	UNITARIO (\$)	PARCIAL (\$)
					De fs. 4...	26.442.054,35
20	Provisión de vivienda para el personal de Supervisión	mes	18,00	Tres mil cuarenta y seis pesos con diecisiete ctvos.	3.046,17	54.831,06
21	Movilización de obra	Gl	1,00	Un millón doscientos ochenta mil pesos	1.280.000,00	1.280.000,00
TOTAL:						27.776.885,41

ARTICULO 4º.- Como fianza del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el Contratista ha entregado la Póliza de Seguro de Caucción N° 18.708 otorgada por "FIANZAS Y CREDITO S.A.", por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 1.388.444,27), importe que cubre el cinco por ciento (5 %) del monto de este contrato.-----

ARTICULO 5º.- En prueba de conformidad con lo establecido en los artículos del presente contrato, ambas partes lo firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires, a los *veintinueve (29)* días del mes de *Junio* de dos mil cinco.-----


CONSTRUCTORA DOS AGROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
PRESIDENTE


Ing. NELSON GUILLERMO PEROTTI
ADMINISTRADOR GENERAL
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD


CONSTRUCTORA DOS AGROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACHELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000528

5° Distrito - Salta

LICITACION PUBLICA N° 75/04
EXPEDIENTE N° 1210-L-2004

OBRA: RUTA NACIONAL N° 81 - PROVINCIA DE SALTA
TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL N° 34 - LTE. C/FORMOSA
SECCION VI: LOS BLANCOS - LTE. C/FORMOSA S.A.

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

----- En la sede del 5° Distrito, en la ciudad de Salta, a los Dos (2) días del mes de Junio del año Dos Mil Ocho (2008), reunidos el Ingeniero Elias Joaquín Cerezo, en su carácter de Jefe del 5° Distrito, el Jefe de La División Obras Ing. Humberto Edgar Morales y el Ing. Nolberto Lesser, en representación de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD; el Sr. Juan Bautista Pacella en representación de la Contratista DOS ARROYOS y habiéndose comprobado que los trabajos de la Obra indicada en el título han sido realizados en un todo de acuerdo a las condiciones del Contrato y Pliego que rige la obra, se procedió a efectuar la RECEPCION PROVISIONAL de los mismos, Ad-Referendum del SR. ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, habiéndose cumplido con los siguientes recaudos:

- 1) El Representante Técnico presentó el Informe final de cumplimiento de Contrato, conforme al Artículo 50 del Pliego de Condiciones y Especificaciones, cuyo formato original forma parte de la presente Acta.
- 2) Se comprobó que los trabajos han sido ejecutados conforme al Contrato respectivo y a las órdenes impartidas por la Supervisión de Obras, habiendo finalizado en fecha Treinta de Setiembre del Dos Mil Siete (30/09/2007).
- 3) El Control de Calidad de los trabajos estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, habiéndose cumplido satisfactoriamente con lo indicado en las Especificaciones Técnicas del Pliego General de Bases y Condiciones.
- 4) Habiendo solicitado la Contratista la "Recepción Provisional de la Obra" y no existiendo razones que objetar, en un todo de acuerdo a lo establecido en Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares de la obra, se establece que el plazo de garantía de Seis Meses corre a partir de la fecha de finalización de la obra.

----- Para Constancia y Prueba de conformidad, los intervinientes firman un original y cuatro copias de la presente Acta, que pasará a formar parte de la documentación del Certificado N° 28 R.P. de RECEPCION PROVISIONAL.

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL

Contratista

Jefe División Obras
Ing. HUMBERTO E. MORALES
Jefe División Obras (Int.)
5to. Distrito - Salta

Supervisor
Ing. ALBERTO N. LESSER
JEFE SECCION PROYECTOS (INT.)
5to. DISTRITO SALTA

Jefe de Distrito

Ing. ELIAS J. CEREZO
Jefe 5to Distrito - Salta (Int.)

CONSTRUCTORA DOS ARROYOS S.A.
Ing. JUAN BAUTISTA PACELLA
REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE TECNICO

000529
