



Mendoza, 06/12/16

Sr. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO
S / D

Ref.: Formulario de propuesta.


Ezequiel Gregorio Cejas Bestard, Representante legal y Pablo Javier Ramasco, Representante técnico, abajo firmantes con domicilio legal constituido en la calle Tiburcio Benegas N°708 de la ciudad de capital Gran Mendoza, con domicilio social en la calle Rivadavia N°86, piso 3 depto. 9 de la localidad de Neuquén, después de estudiar detenidamente los documentos de la licitación, las bases de contratación, documentación especial, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, cómputo y demás antecedentes de los pliegos y luego de recoger en el lugar de emplazamiento de las obras, todos los elementos de juicio y la información necesaria para la elaboración del plan de trabajo y la determinación de los precios, no quedando duda alguna acerca de la interpretación de los documentos de la licitación y demás elementos de juicio, propone ejecutar todas las obras y trabajos que en ellos se especifiquen, aún en el caso que el mis se mencione en uno de ellos y no en los restantes: proveer todos los materiales para la ejecución d los trabajos a contratar, calquiera sea la naturaleza de ellos, suministrando todos los elementos de acuerdo con el verdadero objetivo y significado de la licitación y documentación entregada y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas y mantenerlas en buen estado de conservación y funcionamiento hasta la fecha de recepción definitiva.

Dejo constancia que al formular la siguiente oferta he respetado las estipulaciones de la documentación de la licitación y que cuando se ha considerado conveniente y justificable para los intereses de ambas partes, se han considerado variantes alternativas para el caso, destacándolas con suficientes aclaraciones para no inducir a error al respecto, sabiendo perfectamente que en estas circunstancias es privativo del juicio definitivo relativo a la adjudicación de la licitación.

Acepto ejecutar estos trabajos dentro del sistema de contratación (ver título III, Especificaciones Particulares de carácter legal Art. 6) por un precio total invariable, no habiéndose contemplado ningún tipo de reconocimiento adicional o de variaciones de precios.

ARCO S.R.L.
CUIT: 30-65724976-5
EZEQUIEL CEJAS BESTARD
APODERADO

Ing. PABLO RAMASCO
Mét. INC 1623
REP. TÉCNICO
ARCO S.R.L.



Original



El importe total de esta propuesta es de PESOS **veinticuatro millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos, (\$ 24.753.900,00)**, que resulta de aplicar a las cantidades de la obras previstas en la planilla de cotización de precios que se acompaña, por los precios unitarios básicos analizados de los rubros correspondientes establecidos en la documentación de la licitación.

En estas condiciones se compromete a realizar todos los trabajos en un plazo de seis meses (6 meses).

Se acompaña en concepto de Garantía de esta propuesta a la orden de Municipalidad de Lujan de Cuyo, una póliza de seguro de caución.

Declaro haber recibido y tenido en cuenta al formular esta propuesta, las siguientes circulares y/o documentación adjuntando fotocopia de las mismas, debidamente firmadas.

CIRCULARES	REFERENCIA O TEMA	FECHA
N°1	Pliego y planilla de cotización corregidos	25/11/16
N°2	Planilla de cotización corregida y planos	30/11/16
N°3	Visita de obra	01/12/16
N°4	Planilla de cotización corregida	02/12/16

ARCO S.R.L.
CUIT: 30-65724976-5
EZEQUIEL CEJAS DESTARD
APODERADO

Ing. PABLO RAMASCO
Mat. INC 1623
REP. TÉCNICO
ARCO S.R.L.

Firma y aclaración
Del proponente

Firma y aclaración
Representante Técnico



Original

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO



OBRA: "RESTAURACION DE ACCESO OESTE Y PARQUE LINEAL VISTALBA", Etapa 1° CALLE SAENZ PEÑA
LICITACION PÚBLICA N° 1178 /16 Municipal

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL(\$)	INCIDENCIA %
1	LIMPIEZA, DESMALEZADO. PODA	GL	1	\$ 22.773,59	\$ 22.773,59	0,092%
2	ERRADICACION DE FORESTALES	un	10	\$ 3.193,25	\$ 31.932,53	0,129%
3	PARQUIZACION	m2	850	\$ 113,87	\$ 96.787,75	0,391%
4	TRASLADOS DE SERVICIOS ELECTRICOS	un	10	\$ 8.540,10	\$ 85.400,96	0,345%
5	DEMOLICION Y TRANSPORTE				\$ 1.087.191,29	4,392%
5.1	Puentes vehiculares	un	64	\$ 8.091,43	\$ 517.851,59	2,092%
5.2	Cordon, cuneta, banquina	m	50	\$ 341,60	\$ 17.080,19	0,069%
5.3	Alcantarillas existentes	m	50	\$ 455,47	\$ 22.773,59	0,092%
5.4	Pavimento asfaltico	m2	1.200	\$ 89,53	\$ 107.431,93	0,434%
5.5	Ciclovia Existente	m2	1.600	\$ 209,94	\$ 335.910,42	1,357%
5.6	Traslado de señalización vial	GL	1	\$ 37.625,93	\$ 37.625,93	0,152%
5.7	Extracción de elementos varios	GL	1	\$ 48.517,64	\$ 48.517,64	0,196%
6	EXCAVACION				\$ 164.118,36	0,663%
6.1	Excavacion de zona a ampliar	m3	960	\$ 170,96	\$ 164.118,36	0,663%
7	INTERVENCION SOBRE RIEGO AGRICOLA / ALUVIONAL				\$ 3.289.793,31	13,290%
7.1	Cordon, cuneta, banquina cuenta desague, margen sur	m	950	\$ 1.821,37	\$ 1.730.297,61	6,990%
7.2	Cordon, cuneta, banquina cuenta desague, margen norte	m	700	\$ 1.821,18	\$ 1.274.825,85	5,150%
7.3	Alcantarilla Cuneta Desague, margen sur	m	50	\$ 2.846,70	\$ 142.334,93	0,575%
7.4	Alcantarilla Cuneta Desague, margen norte	m	50	\$ 2.846,70	\$ 142.334,93	0,575%
8	SERVICIOS SANITARIOS				\$ 4.112.117,87	16,612%
8.1	Red agua potable, conexiones domiciliarias (ambas margenes) + extensión cloaca c/BR	m	1.275	\$ 3.225,19	\$ 4.112.117,87	16,612%
9	BASE GRANULAR , e =15cm				\$ 614.886,88	2,484%
9.1	Base granular bajo sendero peatonal y ciclovia	m3	720	\$ 512,27	\$ 368.833,11	1,490%
9.2	Base granular bajo calzada	m3	480	\$ 512,61	\$ 246.053,77	0,994%
10	IMPRIMACION ASFALTICA				\$ 109.412,24	0,442%
10.1	Imprimación asfaltica calle Saenz Peña	m2	3.200	\$ 34,19	\$ 109.412,24	0,442%
11	BACHEO ESPECIAL				\$ 922.082,78	3,725%
11.1	Bacheo especial	m2	1.350	\$ 683,02	\$ 922.082,78	3,725%
12	CARPETA ASFALTICA c/ riego de liga, e =0,005m				\$ 3.927.206,24	15,865%
12.1	Carpeta asfaltica calle Saenz Peña (reencarpetado)	m2	9.600	\$ 284,59	\$ 2.732.087,94	11,037%
12.2	Carpeta asfaltica calle Saenz Peña (ensanche)	m2	3.200	\$ 284,52	\$ 910.448,44	3,678%
12.3	Carpeta asfaltica calle Saenz Peña (bocacalles)	m2	1.000	\$ 284,67	\$ 284.669,85	1,150%
13	ADECUACION PUENTE SOBRE CANAL CACIQUE GUAYMALLEN				\$ 2.276.616,18	9,197%
13.1	Ampliación puente	un	1	\$ 2.276.616,18	\$ 2.276.616,18	9,197%
14	CONTRAPISO DE HORMIGÓN PARA CICLOVIA, e 10=cm, a=2.0m				\$ 1.092.884,69	4,415%
14.1	Ciclovia H°	m2	1.600	\$ 683,05	\$ 1.092.884,69	4,415%
15	CORDON CANTERO CENTRAL				\$ 794.600,19	3,210%
15.1	Cordon de hormigon cantero central 40x60cm	m	1.400	\$ 567,57	\$ 794.600,19	3,210%
16	SENDEROS PEATONALES H°A° e=10cm, a=2m				\$ 1.530.038,56	6,181%
16.1	Sendero peatonal margen sur	m2	1.120	\$ 683,16	\$ 765.143,05	3,091%
16.2	Sendero peatonal margen norte	m2	1.120	\$ 682,94	\$ 764.895,51	3,090%
17	PUENTES PEATONALES H°A° e=15cm, a=2m				\$ 68.320,76	0,276%
17.1	Puente peatonal margen sur	un	10	\$ 3.416,04	\$ 34.160,38	0,138%
17.2	Puente peatonal margen norte	un	10	\$ 3.416,04	\$ 34.160,38	0,138%
18	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES, e=20cm				\$ 728.754,82	2,944%
18.1	Puentes vehiculares margen sur	un	37	\$ 11.386,79	\$ 421.311,38	1,702%
18.2	Puentes vehiculares margen norte	un	27	\$ 11.386,79	\$ 307.443,44	1,242%
19	ILUMINACION				\$ 2.003.580,67	8,094%
19.1	Mano de obra	GL	1	\$ 1.935.259,90	\$ 1.935.259,90	7,818%
19.2	Materiales	GL	1	\$ 68.320,76	\$ 68.320,76	0,276%
20	DARSENAS PARA COLECTIVOS	un	6	\$ 99.634,45	\$ 597.806,69	2,415%
21	APEADEROS	un	6	\$ 28.466,99	\$ 173.029,76	0,699%
22	DEMARCACIÓN HORIZONTAL				\$ 924.310,63	3,734%
22.1	Extrusión (3mm) sendas peatonales	m2	600	\$ 682,38	\$ 409.429,51	1,654%
22.2	Extrusión (3mm) sendas ciclovia	m2	300	\$ 683,21	\$ 204.962,29	0,828%
22.3	Termoplastica caliente ciclovia	m2	170	\$ 455,76	\$ 77.479,71	0,313%
22.4	Termoplastica caliente (borde calzada)	m2	510	\$ 455,76	\$ 232.439,12	0,939%
23	SEÑALIZACIÓN VERTICAL				\$ 102.481,15	0,414%
23.1	Cartelena normalizada DPV	un	20	\$ 1.708,02	\$ 34.160,38	0,138%
23.2	Cartleria municipal	un	40	\$ 1.708,02	\$ 68.320,76	0,276%
TOTAL DE LA OBRA REMODELACION CALLE SAENZ PEÑA					\$ 24.753.900,00	100%
TORAL EN LETRAS: veinticuatro millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos						

ARCO S.R.L.
CUIT: 30-65724976-5
EZEQUIEL CUBAR ALSTAD
APODERADO

Ing. PABLO RAMASCO
Mat INC 1623
REF. TÉCNICO
ARCO S.R.L.



Original



ARCO S.R.L.
C.U.I.T. 20.111.653.41 - 976-5
EZEQUIEL CARRASCO
APODERADO

Ing. PABLO RAMASCO
Mat. INC 1623
REP. TÉCNICO
ARCO S.R.L.

Plan de trabajos

LIQUIDACIÓN PÚBLICA Nº 1178 /16 MUNICIPAL
OBRA: "RESTAURACIÓN DE ACCESO OESTE Y PARQUE LINEAL VISTALBA", Etapa 1ª CALLE SAENZ PEÑA
Contratista: Arco S.R.L.
Plazo de obra: 180 días

Nº	Denominación	Total	% incidencia	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
1	LIMPIEZA, DESMALARZADO, PODA	\$ 22.773,59	0,092%	100%					
2	REARBOZADO DE FORESTALES	\$ 31.932,53	0,129%	100%					
3	PARGUIZACIÓN	\$ 96.787,75	0,391%		100%				100%
4	TRASLADOS DE SERVICIOS ELÉCTRICOS	\$ 85.400,96	0,345%						
5	DEMODIFICACIÓN Y TRANSPORTE	\$ 1.087.191,29	4,324%						
5.1	Puentes vehiculares	\$ 517.851,59	2,022%	100%					
5.2	Cordon, cuneta, banquetina	\$ 17.080,19	0,088%	100%					
5.3	Alcantarillas existentes	\$ 22.773,59	0,092%	100%					
5.4	Pavimento asfáltico	\$ 107.451,53	0,434%	100%					
5.5	Ciclovia Existente	\$ 335.910,42	1,357%	100%					
5.6	Traslado de señalización vial	\$ 37.625,93	0,157%	100%					
5.7	Extracción de elementos varios	\$ 48.517,64	0,196%	100%					
6	EXCAVACION	\$ 164.118,36	0,663%		100%				
6.1	Excavacion de zona a ampliar	\$ 164.118,36	0,663%		100%				
7	INTERVENCIÓN SOBRE RIEGO AGRÍCOLA / ALUVIONAL	\$ 3.289.793,31	13,290%			70%			
7.1	Cordon, cuneta, banquetina cuenta desagüe, margen sur	\$ 1.730.297,61	6,990%			70%			
7.2	Cordon, cuneta, banquetina cuenta desagüe, margen norte	\$ 1.274.825,85	5,100%			70%			
7.3	Alcantarilla Cuneta Desague, margen sur	\$ 142.334,93	0,575%			70%			
7.4	Alcantarilla Cuneta Desague, margen norte	\$ 142.334,93	0,575%			70%			
8	SERVICIOS SANITARIOS	\$ 4.112.117,87	16,612%			70%			
8.1	Red agua potable, conexiones domiciliarias (ombas margenes) + extensión obra c/BR	\$ 4.112.117,87	16,612%			70%			
9	BASE GRANULAR, e = 15cm	\$ 614.886,88	2,484%		100%				
9.1	Base granular bajo sendero peatonal y ciclovia	\$ 368.893,11	1,480%		100%				
9.2	Base granular bajo calzada	\$ 246.093,77	0,994%		70%				
10	IMPRIMACION ASFALTICA	\$ 109.412,24	0,442%				100%		
10.1	Impresión asfáltica calle Saenz Peña	\$ 92.082,78	3,725%				100%		
11	BACHEO ESPECIAL	\$ 92.082,78	3,725%				80%		20%
11.1	Bacheo especial	\$ 92.082,78	3,725%				80%		20%
12	CARPETA ASFALTICA / RIEGO DE LIGA, e = 0,005m	\$ 3.927.206,24	15,865%					50%	10%
12.1	Carpetas asfálticas calle Saenz Peña (reencarpetao)	\$ 2.732.087,94	11,037%					50%	10%
12.2	Carpetas asfálticas calle Saenz Peña (ensanche)	\$ 910.448,44	3,678%					50%	10%
12.3	Carpetas asfálticas calle Saenz Peña (bocacalles)	\$ 284.669,85	1,150%					50%	10%
13	ADCUACION PUENTE SOBRE CANAL CACIQUE GUAYMALLEN	\$ 2.276.616,18	9,197%					100%	
13.1	Ampliación puente	\$ 2.276.616,18	9,197%					100%	
14	CONTRAPISO DE HORMIGÓN PARA CICLOVIA, e = 10cm, a=2,0m	\$ 1.092.884,69	4,415%					100%	
14.1	Ciclovia H"	\$ 794.600,19	3,210%					100%	
15	CORDON CANTERO CENTRAL	\$ 1.580.038,56	6,181%					100%	
15.1	Cordon de hormigon cantero central 40x60cm	\$ 1.580.038,56	6,181%					100%	
16	SENDENOS PEATONALES H"A, e = 10cm, a=2m	\$ 765.143,05	3,091%					100%	
16.1	Sendero peatonal margen sur	\$ 765.143,05	3,091%					100%	
16.2	Sendero peatonal margen norte	\$ 68.320,78	0,278%					70%	30%
17	PUENTES PEATONALES H"A, e = 15cm, a = 2m	\$ 34.160,38	0,138%					70%	30%
17.1	Puente peatonal margen sur	\$ 34.160,38	0,138%					70%	30%
17.2	Puente peatonal margen norte	\$ 728.754,82	2,949%					50%	50%
18	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES, e = 20cm	\$ 421.311,38	1,702%					50%	50%
18.1	Puentes vehiculares margen sur	\$ 307.443,44	1,242%					50%	50%
18.2	Puentes vehiculares margen norte	\$ 2.003.580,67	8,094%					50%	50%
19	ILUMINACION	\$ 1.955.359,90	7,818%					50%	50%
19.1	Mano de obra	\$ 1.955.359,90	7,818%					50%	50%
19.2	Materiales	\$ 597.806,69	2,415%					50%	50%
20	DARSENAS PARA COLECTIVOS	\$ 170.801,91	0,690%					40%	60%
21	APARADEROS	\$ 924.310,63	3,744%					50%	50%
22	DEMARACION HORIZONTAL	\$ 409.429,51	1,654%					50%	50%
22.1	Extrusion 15mm) sendas peatonales	\$ 204.829,29	0,828%					50%	50%
22.2	Extrusion 15mm) sendas ciclovia	\$ 77.029,71	0,313%					50%	50%
22.3	Termoplástica caliente ciclovia	\$ 232.199,12	0,939%					50%	50%
22.4	Termoplástica caliente (bordo calzada)	\$ 102.481,15	0,414%					60%	40%
23	SEÑALIZACION VERTICAL	\$ 34.160,38	0,138%					60%	40%
23.1	Cartelería normalizada DPV	\$ 68.320,76	0,276%					60%	40%
23.2	Cartelería municipal	\$ 24.753.900,00	100%						
	% avance mensual		4,61%	4,61%	12,16%	35,68%	41,02%	5,71%	0,81%
	% avance acumulado		4,61%	16,78%	32,46%	52,46%	91,48%	99,20%	100,00%
	inversion mensual	\$ 1.141.897,41	\$ 3.011.163,41	\$ 8.832.463,81	\$ 10.155.136,95	\$ 1.413.967,52	\$ 24.554.631,11	\$ 24.753.900,00	\$ 24.753.900,00
	inversion Acumulada	\$ 1.141.897,41	\$ 4.153.060,82	\$ 12.985.524,63	\$ 23.140.663,58	\$ 24.554.631,11	\$ 24.753.900,00	\$ 24.753.900,00	\$ 24.753.900,00


84
FOLIO NO

Original


MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE 6970
P 2773
Expte 11963

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
C	-4,61%	16,78%	52,46%	93,48%	99,20%	100,00%
D						

Curva de Inversiones

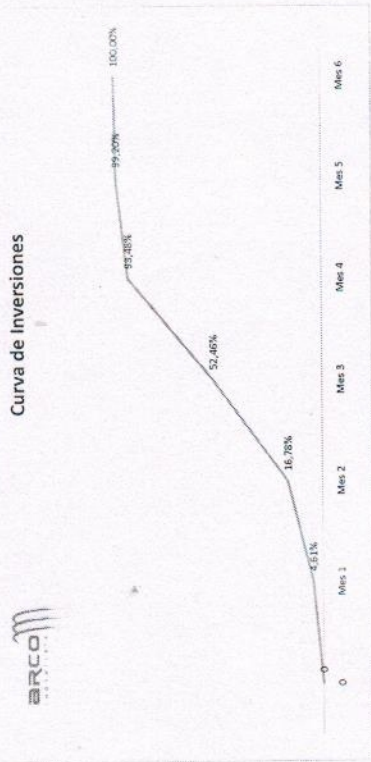

Curva de Certificaciones

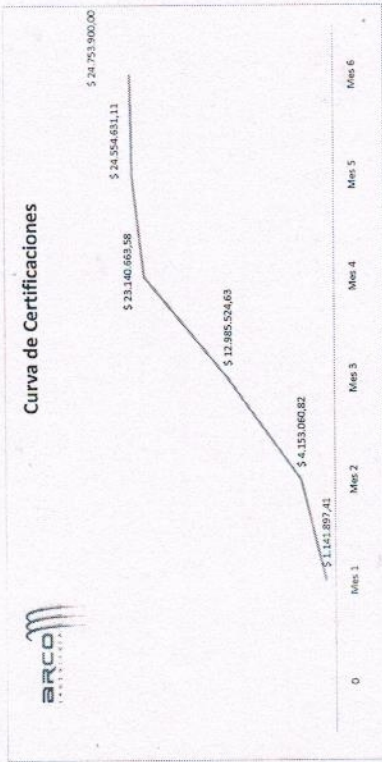

Ing. PABLO RAMASCO
Mat. INC 1623
REP. TÉCNICO
ARCO S.R.L.

ARCO S.R.L.
CUIT: 30-6572-976-5
GERARDO CIVIL COSTARD
APODERADO
